标识号	0	任务名称	工期	工时	计划开始时间	计划完成时间	前置任务
1		赛事运营支持系统	151 个工作日?	365.5 个工作日	2022年12月1日	2023年6月29日	
2		项目立项	4 个工作日	15.25 个工作日	2022年12月1日	2022年12月6日	
3	00	了解项目情况,获得初步需求	3 个工作日	12 个工作日	2022年12月1日	2022年12月5日	
4	2	项目初步估算	0.25 个工作日	1 个工作日	2022年12月6日	2022年12月6日	3
5	₹	项目组织架构,章程制定、 资源、职责,干系人RACI整	0.25 个工作日	0.25 个工作日	2022年12月6日	2022年12月6日	4
6	₹	召开项目立项会议	0.25 个工作日	1.5 个工作日	2022年12月6日	2022年12月6日	5
7	2	编写《项目立项报告》	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2022年12月6日	2022年12月6日	5
8							
9		项目计划	17.5 个工作日	45.25 个工作日	2022年12月7日	2022年12月30日	
10		项目估算	4 个工作日	12.5 个工作日	2022年12月7日	2022年12月12日	
11	2	确定软件生存周期,初步制 定QA, CM计划	1 个工作日	5 个工作日	2022年12月7日	2022年12月7日	7
12		EPG指导项目经理编写《项目定义过程》	0.5 个工作日	1 个工作日	2022年12月8日	2022年12月8日	11
13		根据初步,进行WBS分解	1 个工作日	3 个工作日	2022年12月8日	2022年12月9日	12
14		估算项目的规模,工作量, 成本,形成进度计划<项目 估算>和项目预算	1 个工作日	3 个工作日	2022年12月9日	2022年12月12日	13
15		依据<风险检查表>进行风 险识别,初步形成计划	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2022年12月12日	2022年12月12日	14
16		项目计划	11 个工作日	27 个工作日	2022年12月13日	2022年12月27日	
17		项目经理制定项目计划	7 个工作日	7 个工作日	2022年12月13日	2022年12月21日	
18		完善项目进度计划	1 个工作日	1 个工作日	2022年12月13日	2022年12月13日	
19		编写《项目计划书》	5 个工作日	5 个工作日	2022年12月14日	2022年12月20日	18
20		编写〈度量计划〉	1 个工作日	1 个工作日	2022年12月21日	2022年12月21日	19
21		制定从属计划	1 个工作日	5 个工作日	2022年12月13日	2022年12月13日	
22		编写需求调研计划	1 个工作日	1 个工作日	2022年12月13日	2022年12月13日	
23		完善质量保证计划(QA)	1 个工作日	1 个工作日	2022年12月13日	2022年12月13日	
24		完善配置管理计划(CM)	1 个工作日	1 个工作日	2022年12月13日	2022年12月13日	
25		编写测试计划	1 个工作日	1 个工作日	2022年12月13日	2022年12月13日	
26		编写〈培训计划〉	1 个工作日	1 个工作日	2022年12月13日	2022年12月13日	
27		项目计划书,从属计划及项 目定义过程进行评审	1 个工作日	6 个工作日	2022年12月22日	2022年12月22日	21, 17

标识号	任务名称	工期	工时	计划开始时间	计划完成时间	前置任务
28	评审中发现的缺陷进行修正	1 个工作日	7 个工作日	2022年12月23日	2022年12月23日	27
29	项目计划书的评审与发布	1 个工作日	1 个工作日	2022年12月26日	2022年12月26日	28
30	调研计划发给客户	1 个工作日	1 个工作日	2022年12月27日	2022年12月27日	29
31	建立计划基线	2 个工作日	2.5 个工作日	2022年12月28日	2022年12月29日	21
32	计划基线建立申请,填写 《基线建立申请》	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2022年12月28日	2022年12月28日	30
33	QA和CM对配置库进行功能 审计和物理审计	0.5 个工作日	1 个工作日	2022年12月28日	2022年12月28日	32
34	配置管理在配置库中建立 计划基线	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2022年12月29日	2022年12月29日	33
35	填写计划基线《发布报告》	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2022年12月29日	2022年12月29日	34
36	召开项目培训	1.5 个工作日	1.5 个工作日	2022年12月14日	2022年12月15日	
37	依据《项目培训计划》组 织培训	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2022年12月14日	2022年12月14日	
38	编写培训反馈记录	1 个工作日	1 个工作日	2022年12月14日	2022年12月15日	37
39	项目计划里程碑	0.5 个工作日	1.75 个工作日	2022年12月30日	2022年12月30日	
40	开策划里程碑会议,填写 《策划里程碑状态报告》	0.25 个工作日	1.5 个工作日	2022年12月30日	2022年12月30日	31
41	项目经理根据里程碑数据 进行阶段性调整	0.25 个工作日	0.25 个工作日	2022年12月30日	2022年12月30日	40
42						
43	需求开发	22 个工作日	48.25 个工作日	2022年12月30日	2023年1月31日	
44	需求调研	2.5 个工作日	2.5 个工作日	2022年12月30日	2023年1月3日	
45	按照《需求调研计划》进 行调研,形成调研记录	2 个工作日	2 个工作日	2022年12月30日	2023年1月3日	
46	编写《需求跟踪矩阵》填 写原始需求	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年1月3日	2023年1月3日	
47	需求分析	18 个工作日	42 个工作日	2023年1月4日	2023年1月27日	44
48	分析需求,编写《用户需求说明书》	5 个工作日	5 个工作日	2023年1月4日	2023年1月10日	
49	评审〈用户需求说明书〉,记录并修改缺陷	0.5 个工作日	3 个工作日	2023年1月11日	2023年1月11日	
50	QA检查<用户需求说明书 >并记录不符合项并修改	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年1月11日	2023年1月11日	
51	〈用户需求说明书〉提交客 户确认	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年1月12日	2023年1月12日	50


标识号	<b>6</b>	壬务名称		工期	工时	计划开始时间	计戈	完成时间	前置任务
52		编写《产品需求说明	明书》	6 个工作日	6 个工作日	2023年1月12	2日	2023年1月20日	51
53		评审〈产品需求说明 录并修改缺陷	书>,记	0.5 个工作日	3 个工作日	2023年1月20	日	2023年1月20日	52
54	&	完善〈项目估算〉和 跟踪矩阵》	《需求	1 个工作日	3 个工作日	2023年1月23	3日	2023年1月23日	53
55	2	完善编写《测试计划	訓》	2 个工作日	2 个工作日	2023年1月24	日	2023年1月25日	54
56	2	评审《测试计划》并		1 个工作日	2 个工作日	2023年1月26		2023年1月26日	
57		完善<项目进度计划 善<项目计划书>	>,完	1 个工作日	1 个工作日	2023年1月27	7日	2023年1月27日	56
58	&	依据《产品需求说明 编写《系统测试用例	月书》 列》	2 个工作日	6 个工作日	2023年1月23	3日	2023年1月24日	53
59	2	QA检查《产品需求证书》和《系统测试》	兑明 目例》	1 个工作日	3 个工作日	2023年1月25	5日	2023年1月25日	58
60	&	评审<系统测试用例 并修改缺陷	>记录	1 个工作日	6 个工作日	2023年1月26	8日	2023年1月26日	59
61		建立需求基线		2 个工作日	2.5 个工作日	2023年1月27	'日	2023年1月30日	60
62		需求基线建立申请, 《基线建立申请》	填写	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年1月27	7日	2023年1月27日	
63		QA和CM对配置库进行 和物理审计	<b> </b>	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年1月27	7日	2023年1月27日	62
64		配置管理在配置库 <sup>口</sup> 需求基线	中建立	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年1月30	日	2023年1月30日	63
65		填写需求基线《发布	<b></b>	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年1月30	日	2023年1月30日	64
66		需求里程碑		0.5 个工作日	1.25 个工作日	2023年1月31	.日	2023年1月31日	
67		需求里程碑会议,填 求里程碑状态报告》	>	0.25 个工作日	1 个工作日	2023年1月31	. 日	2023年1月31日	65
68		项目经理对项目计划 阶段性调整,完善 跟踪矩阵》	划进行 ( 《需求	0.25 个工作日	0.25 个工作日	2023年1月31	. 日	2023年1月31日	67
69									
70		系统设计		25 个工作日?	44 个工作日	2023年1月31		2023年3月7日	43
71		<b>决策分析</b>	kt vo vit	2 个工作日	5 个工作日	2023年1月31		2023年2月2日	25
72		完善技术方案,必要 行决策分析形成《	夬策分	1 个工作日	4 个工作日	2023年1月31		2023年2月1日	
73		技术解决方案制定, 复用分析	购买	1 个工作日	1 个工作日	2023年2月1	. 日	2023年2月2日	
74		系统概要设计		7 个工作日	10 个工作日	2023年2月2	2日	2023年2月13日	71
		1	任务		总成型里程碑	$\Diamond$	非活动里程碑		□ 仅开如
			关键任务		总成型进度		非活动摘要		11 仅完成
项目:	PI P		里程碑	•	拆分		手动任务	$\Diamond$	外部信
		左10日00日	商要		→ 外部任务		仅工期		/ 1 - <del> </del>
		] 1	向女 总成型任务	▼	→ 万丽任労		手动摘要总成	<b>♦</b>	进度
			总成型关键任务	子	分组标题		手动摘要	•	
		-				第 3 页			

际识号	0	任务名称	工期	工时	计划开始时间	计划完成时间	前置任务
75		进行总体设计,编写《概要设计书》	5 个工作日	5 个工作日	2023年2月3日	2023年2月10日	73
76	<b>&amp;</b>	评审〈概要设计〉, 记录缺陷 并修正	1 个工作日	4 个工作日	2023年2月10日	2023年2月13日	75
77		数据库初步设计	1 个工作日	1 个工作日	2023年2月2日	2023年2月3日	
78		系统详细设计	10.5 个工作日?	17 个工作日	2023年2月13日	2023年2月27日	76
79		依据《概要设计说明书》 编写《详细设计说明书》	5 个工作日	5 个工作日	2023年2月13日	2023年2月20日	
80		评审<详细设计>,记录缺陷 并修正	1 个工作日	5 个工作日	2023年2月20日	2023年2月21日	79
81		QA检查<详细设计>记录不符合项并修正	1 个工作日	2 个工作日	2023年2月21日	2023年2月22日	80
82	2	完善《需求跟踪矩阵》	1 个工作日?	1 个工作日	2023年2月13日	2023年2月14日	
83		依据《详细设计说明书》 编制《单元测试计划》	1 个工作日	2 个工作日	2023年2月27日	2023年2月27日	
84	<b>&amp;</b>	依据《详细设计说明书》 《单元测试计划》编制 《单元测试用例》	1 个工作日	2 个工作日	2023年2月13日	2023年2月14日	
85		编写〈交付件一览表〉初稿	1 个工作日	1 个工作日	2023年2月28日	2023年2月28日	78
86	&	编写<用户操作手册>初稿	2 个工作日	2 个工作日	2023年3月1日	2023年3月2日	
87		编写〈接口列表〉	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年3月3日	2023年3月3日	
88		编写〈接口定义书〉	1 个工作日	2 个工作日	2023年3月3日	2023年3月6日	
89		编写〈产品集成计划〉	1 个工作日	2 个工作日	2023年3月6日	2023年3月7日	88
90		建立设计基线	2 个工作日	2.5 个工作日	2023年2月28日	2023年3月1日	
91		设计基线建立申请,填写 《基线建立申请》	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年2月28日	2023年2月28日	78
92		QA和CM对配置库进行功能审	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年2月28日	2023年2月28日	91
93		配置管理在配置库中建立 设计基线	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年3月1日	2023年3月1日	92
94		填写设计基线《发布报告》	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年3月1日	2023年3月1日	93
95		设计里程碑	0.5 个工作日	2 个工作日	2023年3月2日	2023年3月2日	
96	<b>&amp;</b>	召开设计里程碑评审会议, 填写《设计里程碑状态报	0.25 个工作日	1.75 个工作日	2023年3月2日	2023年3月2日	94
97		项目经理对项目计划进行 阶段性调整,完善《需求 跟踪矩阵》	0.25 个工作日	0.25 个工作日	2023年3月2日	2023年3月2日	96

示识号	0	任务名称	工期	工时	计划开始时间	计划完成时间	前置任金
98							
99		系统编码实现	37.5 个工作日	115.75 个工作日	2023年3月7日	2023年4月27日	70
100		编码	25 个工作日	83 个工作日	2023年3月7日	2023年4月11日	
101	<u></u>	运营管理系统升级	14 个工作日	28 个工作日	2023年3月7日	2023年3月27日	81
102	<u></u>	业务协作门户升级	11 个工作日	22 个工作日	2023年3月7日	2023年3月22日	81
103		移动端监控应用系统建设	11 个工作日	33 个工作日	2023年3月27日	2023年4月11日	101
104		代码审查(编码期间完善, 日期为截止日期)	2 个工作日	3.5 个工作日	2023年4月11日	2023年4月13日	
105	2	完善〈产品集成计划〉(编 码期间完善)	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年4月11日	2023年4月11日	103
106	2	完善〈单元测试计划〉(编 码期间完善)	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年4月12日	2023年4月12日	105
107	2	核心代码交叉走查(编码 期间完善)	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年4月12日	2023年4月12日	106
108	<u></u>	完善单元测试用例(编码 期间完善)	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年4月13日	2023年4月13日	107
109		编写单元测试用例(编码期 间完善,日期为截止日期)	1 个工作日	2 个工作日	2023年4月13日	2023年4月14日	
110	<b>&amp;</b>	评审<单元测试用例>, 记录缺陷并修正	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年4月13日	2023年4月13日	108
111	<b>&amp;</b>	QA检查<单元测试用例 >记录不符合项并修正	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年4月14日	2023年4月14日	110
112		执行单元测试	7.5 个工作日	15 个工作日	2023年4月11日	2023年4月20日	
113	<b>&amp;</b>	依据《单元测试用例》执 行单元测试	5 个工作日	10 个工作日	2023年4月11日	2023年4月18日	100
114	<b>&amp;</b>	单元测试执行过程中发现 的缺陷记录《单元测试	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年4月18日	2023年4月18日	113
115	&	编写《单元测试报告》	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年4月19日	2023年4月19日	
116	<b>&amp;</b>	QA检查《单元测试报告》 和《单元测试BUG记录》	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年4月19日	2023年4月19日	
117		完善〈接口定义书〉	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年4月20日	2023年4月20日	
118		接口进行评审	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年4月20日	2023年4月20日	87, 117
119		产品集成	3 个工作日	6 个工作日	2023年4月21日	2023年4月25日	
120	2	搭建集成环境	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年4月21日	2023年4月21日	
121	<b>&amp;</b>	依据〈产品集成检查列表 〉,〈接口列表〉进行检查	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年4月21日	2023年4月21日	120


示识号	0	任务名称	工期	工时	计划开始时间	计划完成时间	前置任务
122	<u>&amp;</u>	进行产品集成,模块集成过程中编写〈产品集成模块核	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年4月24日	2023年4月24日	121
123	å	准备完毕进行产品集成, 进行集成测试	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年4月24日	2023年4月24日	122
124	<u>&amp;</u>	问题修复处理	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年4月25日	2023年4月25日	123
	<u>&amp;</u>	编写《产品集成阶段报告》	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年4月25日	2023年4月25日	124
126		建立开发基线	1.75 个工作日	3.25 个工作日	2023年4月25日	2023年4月27日	
127		开发基线建立申请,填写 《基线建立申请》	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年4月25日	2023年4月25日	
128	<u>&amp;</u>	QA和CM对配置库进行功能 审计和物理审计	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年4月26日	2023年4月26日	127
129	å	配置管理在配置库中建立 开发基线	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年4月26日	2023年4月26日	
130		填写开发基线《发布报告》	0.25 个工作日	0.25 个工作日	2023年4月27日	2023年4月27日	129
131		实现阶段里程碑	0.75 个工作日	3 个工作日	2023年4月27日	2023年4月27日	
132		召开实现里程碑评审会议, 填写《编码里程碑状态报	0.5 个工作日	2 个工作日	2023年4月27日	2023年4月27日	
133		项目经理对项目计划进行 阶段性调整,完善《需求 跟踪矩阵》	0.25 个工作日	1 个工作日	2023年4月27日	2023年4月27日	132
134							
135		系统测试	18 个工作日	34 个工作日	2023年4月21日	2023年5月17日	
136		系统测试	15.5 个工作日	22 个工作日	2023年4月21日	2023年5月12日	
	&	测试前进行测试用例自评	1 个工作日	2 个工作日	2023年4月21日	2023年4月24日	
138	&	搭建系统测试环境	1 个工作日	2 个工作日	2023年4月24日	2023年4月25日	
139	&	执行系统测试	10 个工作日	10 个工作日	2023年4月25日	2023年5月9日	
140	<u>&amp;</u>	执行回归测试	2 个工作日	4 个工作日	2023年5月9日	2023年5月11日	139
141		记录测试中发现的BUG并进 行修改	1 个工作日	2 个工作日	2023年5月11日	2023年5月12日	140
142	å	统计分析测试数据编写<系 统测试报告>	0.5 个工作日	2 个工作日	2023年5月12日	2023年5月12日	141
143		建立测试基线	2 个工作日	8 个工作日	2023年5月15日	2023年5月16日	
144	å	测试基线建立申请,填写《基线建立申请》	0.5 个工作日	2 个工作日	2023年5月15日	2023年5月15日	
145	å	QA和CM对配置库进行功能 审计和物理审计	0.5 个工作日	2 个工作日	2023年5月15日	2023年5月15日	144

示识号	0	任务名称	工期	工时	计划开始时间	计划完成时间	前置任务
146	2	配置管理在配置库中建立 测试基线	0.5 个工作日	2 个工作日	2023年5月16日	2023年5月16日	145
147	2	填写测试基线《发布报告》	0.5 个工作日	2 个工作日	2023年5月16日	2023年5月16日	146
148		测试阶段里程碑	0.5 个工作日	4 个工作日	2023年5月17日	2023年5月17日	
149	&	召开测试里程碑评审会议, 填写《编码里程碑状态报	0.25 个工作日	2 个工作日	2023年5月17日	2023年5月17日	147
150	<u></u>	项目经理对项目计划进行 阶段性调整	0.25 个工作日	2 个工作日	2023年5月17日	2023年5月17日	149
151							
152		上线及验收 (产品交付)	29.5 个工作日	42.5 个工作日	2023年5月17日	2023年6月27日	135
153		试运行	3.5 个工作日	7.5 个工作日	2023年5月17日	2023年5月22日	
154	2	制定《系统上线验收计划》提交客户确认	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年5月17日	2023年5月17日	142
155	2	更新完善《产品交接验收单	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年5月18日	2023年5月18日	154
156		更新完善〈用户手册〉	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年5月18日	2023年5月18日	155
157		QA检查〈用户手册〉记录不符合项进行修正	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年5月19日	2023年5月19日	156
158		产品进行打包,编写《产 品打包清单》	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年5月19日	2023年5月19日	157
159		配置管理员根据《产品交 接验收单》将产品基线中 的配置项放入产品库	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年5月22日	2023年5月22日	158
160	2	系统安装部署,用户确认	0.5 个工作日	1.5 个工作日	2023年5月22日	2023年5月22日	159
161		验收	27 个工作日	29 个工作日	2023年5月17日	2023年6月23日	
162	2	项目经理向客户提出验收 申请,编写《验收计划》	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年5月17日	2023年5月17日	142
163	<u></u>	测试人员与客户共同编写 《验收测试用例》	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年5月18日	2023年5月18日	162
164	2	执行验收测试	25 个工作日	25 个工作日	2023年5月18日	2023年6月22日	163
165		记录验收测试BUG,并进行 修正至关闭	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年6月22日	2023年6月22日	164
166		编写《验收报告》,客户确一	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年6月23日	2023年6月23日	165
167		建立产品基线	2 个工作日	4 个工作日	2023年6月23日	2023年6月27日	
168		产品基线建立申请,填写 《基线建立申请》	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年6月23日	2023年6月23日	166



示识号	0	任务名称	工期	工时	计划开始时间	计划完成时间	前置任务
169	2	QA和CM对配置库进行功能 审计和物理审计	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年6月26日	2023年6月26日	168
170	<b>&amp;</b>	配置管理在配置库中建立 产品基线	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年6月26日	2023年6月26日	169
171	2	填写产品基线《发布报告》	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年6月27日	2023年6月27日	170
172		验收里程碑	0.5 个工作日	2 个工作日	2023年6月27日	2023年6月27日	
173		召开验收里程碑评审会 议,填写《验收里程碑状	0.25 个工作日	1.5 个工作日	2023年6月27日	2023年6月27日	
174		必要时对相关计划进行相 应调整	0.25 个工作日	0.5 个工作日	2023年6月27日	2023年6月27日	173
175							
176		项目总结	2 个工作日	5.5 个工作日	2023年6月28日	2023年6月29日	172
177		编写《项目总结报告》, 收集 相关经验	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年6月28日	2023年6月28日	
178		项目总结大会(总结度量、 经验以及教训)	0.5 个工作日	4 个工作日	2023年6月28日	2023年6月28日	
179		更新《项目总结报告》	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年6月29日	2023年6月29日	178
180		EPG将度量数据、优秀案例、 经验教训等纳入组织财富库	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年6月29日	2023年6月29日	179
181							
	€	配置管理	145.5 个工作日	3.5 个工作日	2022年12月6日	2023年6月27日	
183		搭建配置库	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2022年12月6日	2022年12月6日	3
184		配置管理 1	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2022年12月30日	2022年12月30日	
185	00	配置管理 2	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年1月31日	2023年1月31日	
186	00	配置管理 3	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年3月7日	2023年3月7日	
187	: ::	配置管理 4	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年4月27日	2023年4月27日	
188	00	配置管理 5	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年5月17日	2023年5月17日	
189		配置管理 6	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年6月27日	2023年6月27日	
190	_						
191		需求管理	65.75 个工作日	1 个工作日	2023年1月11日	2023年4月13日	
192		需求跟踪矩阵的维护-需求	0.25 个工作日	0.25 个工作日	2023年1月11日	2023年1月11日	49
193		需求跟踪矩阵的维护-设计	0.25 个工作日	0.25 个工作日	2023年3月7日	2023年3月7日	
194		需求跟踪矩阵的维护-编码	0.25 个工作日	0.25 个工作日	2023年4月13日	2023年4月13日	
195		需求跟踪矩阵的维护-测试	0.25 个工作日	0.25 个工作日	2023年1月27日	2023年1月27日	60
196	€	周期性质量保证活动	127.5 个工作日	3 个工作日	2022年12月30日	2023年6月27日	

标识号	0	任务名称	工期	工时	计划开始时间	计划完成时间	前置任务
197	•	周期性质量保证活动 1	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2022年12月30日	2022年12月30日	
198		周期性质量保证活动 2	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年1月31日	2023年1月31日	
199	00	周期性质量保证活动 3	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年3月7日	2023年3月7日	
200	oii .	周期性质量保证活动 4	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年4月27日	2023年4月27日	
201		周期性质量保证活动 5	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年5月17日	2023年5月17日	
	oii .	周期性质量保证活动 6	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年6月27日	2023年6月27日	
	€	项目周例会跟踪风险和度量	140.5 个工作日	7.5 个工作日	2022年12月5日	2023年6月19日	
204	o ii	项目周例会跟踪风险和度量 1	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2022年12月5日	2022年12月5日	
205	o ii	项目周例会跟踪风险和度量 2	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2022年12月19日	2022年12月19日	
206	oii .	项目周例会跟踪风险和度量 3	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年1月2日	2023年1月2日	
207		项目周例会跟踪风险和度量 4	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年1月16日	2023年1月16日	
208		项目周例会跟踪风险和度量 5	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年1月30日	2023年1月30日	
209	00	项目周例会跟踪风险和度量 6	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年2月13日	2023年2月13日	
210	00	项目周例会跟踪风险和度量 7	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年2月27日	2023年2月27日	
211	00	项目周例会跟踪风险和度量 8	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年3月13日	2023年3月13日	
	oii .	项目周例会跟踪风险和度量 9	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年3月27日	2023年3月27日	
	oii _	项目周例会跟踪风险和度量 1	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年4月10日	2023年4月10日	
	00	项目周例会跟踪风险和度量 1	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年4月24日	2023年4月24日	
	00	项目周例会跟踪风险和度量 1	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年5月8日	2023年5月8日	
	00	项目周例会跟踪风险和度量 1	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年5月22日	2023年5月22日	
	00	项目周例会跟踪风险和度量 1	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年6月5日	2023年6月5日	
218	00	项目周例会跟踪风险和度量 1	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年6月19日	2023年6月19日	



资源名称		2019 六月		20	19 六月 30	201	19 七月 28	20	019 八月 25		1 .
		日	六 五	四   三		日   六   五	四 三	_   -	日   六	五	[
项目经理, 高级设计, 测试, 高级约	扁码										
页目经理,高级编码,高级测试,高											
页目经理											
页目经理, 设计, 需求, 测试, 配置 扁码	管理,高级										
扁码 页目经理											
VHYT											
项目经理,配置管理,质量保证											
页目经理, EPG											
页目经理, 高级编码, 设计											
项目经理, 高级编码, 设计											
<b>页目经理</b>											
项目经理											
页目经理 页目经理											
需求											
质量保证主管 配置管理											
高级测试											
音训 配置管理,测试,项目经理,需求, <sub>扁</sub> 码	设计,高级										
	任务			总成型里程碑	<b>◇</b>	非活动里程碑		仅开始时间			•
	关键任务			总成型进度		- 非活动摘要		仅完成时间	<b>—</b>	_	•
项目: PI Plan V1.1	里程碑	•		拆分		手动任务	$\Diamond$	外部任务	$\Diamond$		
日期: 2023年10月30日	摘要			外部任务		■ 仅工期		外部里程碑			
	总成型任务			项目摘要		▶ 手动摘要总成	<b>•</b>	进度			_
	总成型关键	任务		分组标题	<b>—</b>	▼ 手动摘要	•				
					第 10 页						

				-   -	<u> </u>	m   —	- <u> </u>		T	m
ī	1 六	五.			一 六 五	四   三	_   -	日六	五.	<u> </u>
_										
-										
-										
_										
				$\Diamond$	非活动里程碑		仅开始时间			
			总成型进度		非活动摘要				Ţ	
	<b>•</b>					$\Diamond$		$\Diamond$		
						•	进度			_
或型关键任务 ————			分组标题	<b>—</b>	手动摘要	•				
	条 建任	<b>今</b> 建任务 呈碑 ◆	S 建任务 建研 ◆ E 型	A 总成型里程碑 建任务 总成型进度 理碑 ◆ 拆分 要	A	A	A		B	A

资源名称	20	019 六				20	19 六月	30				七月 28	3			2019 八			
需求		日	六	五	四	三		_	<u> </u>	六	<u>Ti.</u>	四	三			日	六	五.	
而水 页目经理, 需求, 设计, 测试, 配置管理, 高级 扁码																			
高级编码,设计,项目经理																			
则试																			
则试, 项目经理																			
项目经理																			
项目经理, 需求, 测试																			
需求,测试,质量保证																			
项目经理,需求,设计,测试,配置管理,高级 扁码																			
配置管理																			
配置管理,质量保证																			
配置管理																			
配置管理																			
项目经理, 需求, 测试, 配置管理																			
项目经理																			
设计, 项目经理, 需求, 高级编码																			
架构师																			
任务					总成型	型里程碑	<b>\langle</b>			非活动里程码	碑			] 仅升	———— 开始时间				_
	任务				总成型	型进度				非活动摘要				. 仅5	完成时间				
项目: PI Plan V1.1 里稻		•			拆分					手动任务		$\Diamond$			邻任务	<b>♦</b>			
日期: 2023年10月30日 摘要		_			外部包	E务				仅工期									
	型任务				项目指					ハー// 手动摘要总/		<b>♦</b>		进月					_
	型关键任	务 🌉			分组 材		_			手动摘要		<b>•</b>		د/ت	- <del>-</del>				
							第 12 ]	 页											

资源名称		2019 六月	2 六   五	四   三	19 六月 30   二   一   日	201   六   五	9 七月 28	<u> </u>	)19 八月 25 日 六	五.
架构师	_		<u>Л   Д.</u>	<u>                                      </u>		<u> </u>	<u>                                      </u>	_   _	ПЛ	П.
项目经理,需求,设计,架构师										
架构师										
架构师										
项目经理,设计,需求,编码,架构	ज्यक्ति									
	7) hili									
设计,编码										
设计										
设计,编码										
编码,设计										
设计										
设计										
设计										
项目经理,设计										
项目经理,设计										
配置管理										
配置管理,质量保证										
配置管理										
配置管理										
项目经理,设计,需求,测试,高级 管理,质量保证	及编码,配置									
项目经理										
	任务			◎ 总成型里程碑	$\Diamond$	非活动里程碑		仅开始时间		
	关键任务			◎ 总成型进度		非活动摘要		仅完成时间		
项目: PI Plan V1.1	里程碑	•		拆分			$\Diamond$	外部任务	<b>♦</b>	
日期: 2023年10月30日	摘要			▶ 外部任务		仅工期				
	总成型任务			■ 项目摘要		手动摘要总成	•	进度		
	总成型关键化	壬务 🚃		■ 分组标题	-	手动摘要	•			
					第 13 页					


资源名称		2019 六	月 2	五.	四   三	019 六月 30   二   一		019 七月 ī.   【	] 28 ]   三	- <u> </u>	2019 八月	25	fi.   <u>p</u>
		日	六	<u> </u>	<u> </u>			ī.   <u> </u>	4	_   _	日	六 3	<u> </u>
高级编码, 架构师 高级编码, 编码													
编码,设计,架构师													
高级编码													
高级编码													
高级编码													
高级编码													
高级编码													
高级编码													
高级编码													
高级编码													
高级编码 高级编码, 质量保证													
项目经理,设计													
项目经理,设计													
高级编码 高级编码													
	任务 关键任务				总成型里程碑 总成型进度	<b>₽</b> ♦	非活动里程碑 非活动摘要			仅开始时间 仅完成时间			
项目: PI Plan V1.1	里程碑	•			总成型进度 拆分					仅元成时间 外部任务	<b>\rightarrow</b>		_
日期: 2023年10月30日	摘要	_			外部任务		<b>工工</b> 仅工期						
	总成型任务				项目摘要		手动摘要总成			进度			
	总成型关键	任务 🌉			分组标题		■ 手动摘要	<b>♦</b>					
						第 14 页							


资源名称	_	2019 テ 日	月 2	五	四	<u> </u>  20	019 六月   二	30	日	六	2019 五.	七月:	28   三	=	<u> </u>	2	019 <i>八</i> 日	月 25   六	<del>I</del>	;	四四
高级编码		Щ	<u>  //</u>	11.	14				_ Н			<u> </u>			-		н			L	
高级编码																					
高级编码																					
高级编码																					
配置管理																					
配置管理,质量保证																					
配置管理																					
配置管理																					
项目经理,设计,编码,测试																					
项目经理																					
测试																					
测试																					
测试 测试																					
编码																					
测试																					
配置管理																					
配置管理,质量保证																					
	任务				■ 总成	型里程碑	<u> </u>		:	非活动里程	碑				仅开始	时间					
	关键任务					型进度				非活动摘要							•			_	
项目: PI Plan V1.1	里程碑	•			拆分					手动任务		$\Diamond$			外部任	. 务	<b>\rightarrow</b>	>			
日期: 2023年10月30日	摘要	-				任务				仅工期											
	总成型任务					摘要				手动摘要总	成	<b>♦</b>			进度		_				
	总成型关键	壬务 🏻			■ 分组	标题				手动摘要		<b>•</b>									
	1						第 15	 页													


资源名称		2019 六月	月 2 六	五.	四   三	19 六月 30	20  日   六   五	19 七月 28   四   三	<u> </u>	019 八月 25 日   六		<u> </u>
配置管理		Н			<u> </u>		1 // 11	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
配置管理												
项目经理,配置管理主管,质量保试	R证主管,测											
试 项目经理												
项目经理												
项目经理												
设计 设计,质量保证												
项目经理, 需求												
配置管理												
HUEL E /S												
项目经理,设计,测试												
项目经理												
项目经理												
测试,编码												
项目经理												
配置管理												
	任务				 总成型里程碑	<b>◇</b>	非活动里程碑					
	关键任务				总成型进度		- 非活动摘要			▼		
项目: PI Plan V1.1 日期: 2023年10月30日	里程碑	<b>*</b>			拆分			$\Diamond$	外部任务	<b>♦</b>		
H /91. 2020-10/100H	摘要 总成型任务				外部任务 项目摘要		<ul><li> 仅工期</li><li> 手动摘要总成</li></ul>	<b>•</b>	外部里程碑 进度			
	总成型关键				分组标题	<u> </u>	<ul><li>▼ 手动摘要</li></ul>	•	KL/X			
						第 16 页						


<b>资源名称</b>	20	19 方 日	月 2   六	五.	四	三   三	19 六月 3   二	0   F	日 六	2019 五.	七月 四	28 三	=	_	2019 八 日	月 25   六	五.	   <u>四</u>
记置管理, 质量保证			<u>  /\</u>	<u> </u>	<u>                                       </u>			<u> </u>	1 // /		29				Н		11.	<u>                                    </u>
記置管理																		
記置管理																		
项目经理,需求,测试,设计,质量保证主管, 高级编码																		
页目经理	-																	
页目经理	-																	
PG, 编码, 测试, 配置管理, 设计, 项目经理, 需求, 质量保证 页目经理																		
PPG																		
記置管理																		
記置管理																		
记置管理 记置管理																		
記置管理	-																	
記置管理																		
記置管理																		
<b>需求</b>																		
<b>设</b> 计																		
扁码																		
<b>则试</b>	-																	
任务	 소				总成绩	型里程碑	$\Diamond$		非活动里和	呈碑			1	仅开始时间				_
	建任务				总成绩	型进度			■ 非活动摘要	更			1	仅完成时间				•
项目: PI Plan V1.1 里和	呈碑	•			拆分				手动任务		$\Diamond$		,	外部任务	$\Diamond$			
日期: 2023年10月30日 摘要		-			外部位	王务			1 仅工期					外部里程碑				
	· 戈型任务				<b>◎</b> 项目				<b>手</b> 动摘要点	点成	<b>•</b>			进度				_
	之工 [27] 戈型关键任:	务			3 分组		<u> </u>		手动摘要		•		,					
							第 17 页											


		19 六月 2	-   m   -	2019 六月 30	201	9 七月 28	_   2	019 八月 25	
<b>里</b> 伯汀		日 六	五一四一三	二   一   日	六 五	四   三   1	_   -	日六	五.
量保证									
量保证									
量保证									
量保证									
量保证									
量保证									
有目组成员									
<b>頁</b> 目组成员									
<b>頁目组成员</b>									
[目组成员									
<b>万</b> 目组成员									
[目组成员									
页目组成员									
· 自组成员									
<b>万</b> 目组成员									
· 自组成员									
· 目组成员									
<b>恒</b> 目组成员									
· 自组成员									
页目组成员									
<b>近目组成员</b>									
	任务		总成型里程	碑 ◇	非活动里程碑		仅开始时间		
	任务		总成型里程		非活动里程碑非活动摘要		仅开始时间仅完成时间	<u></u>	
[目组成员	关键任务	•	总成型进度		非活动摘要		仅完成时间	•	
頁目: PI Plan V1.1	关键任务 里程碑	•	总成型进度 拆分		非活动摘要 手动任务	$\Diamond$	仅完成时间 外部任务	<b>→</b>	
[目组成员	关键任务 里程碑 摘要	<ul> <li>*</li> </ul>	总成型进度 拆分 小部任务		非活动摘要 手动任务 仅工期	<b>♦</b>	仅完成时间 外部任务 外部里程碑	<ul><li>*</li></ul>	
頁目: PI Plan V1.1	关键任务 里程碑	<ul> <li>*</li> </ul>	总成型进度 拆分		非活动摘要 手动任务	<b>♦</b>	仅完成时间 外部任务	<ul> <li>*</li> </ul>	
目组成员 ff: PI Plan V1.1	关键任务 里程碑 摘要	<b>◆</b>	总成型进度 拆分 小部任务		非活动摘要 手动任务 仅工期	<b>♦</b>	仅完成时间 外部任务 外部里程碑	•	

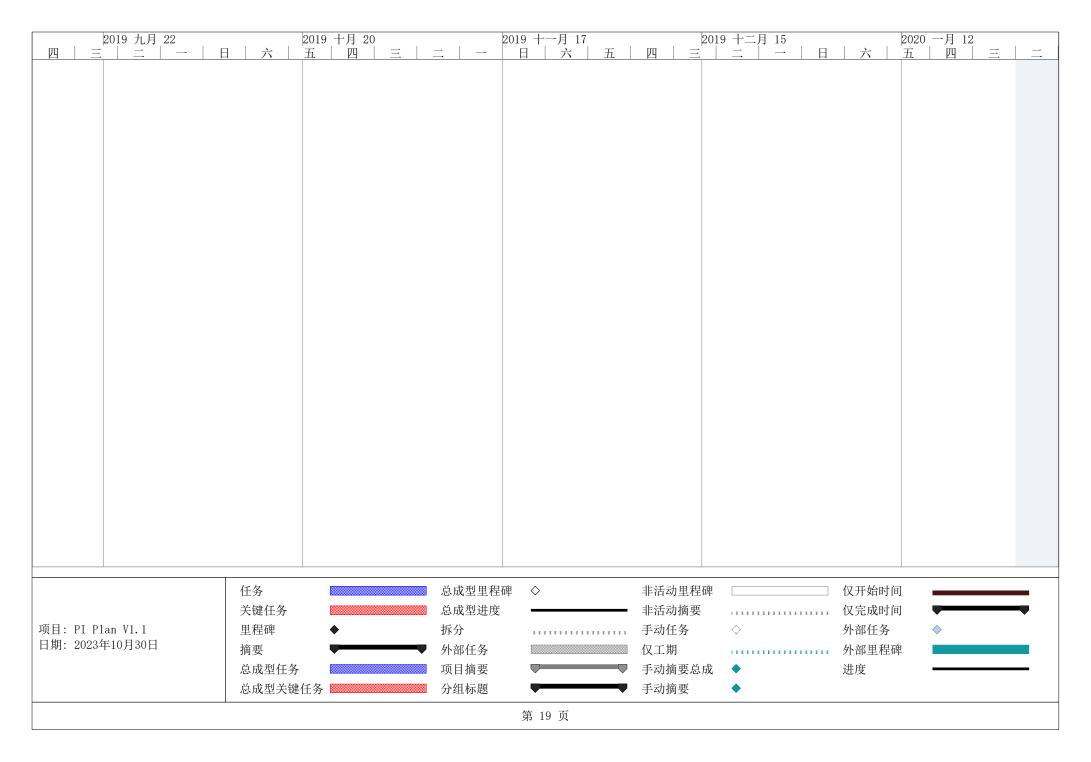


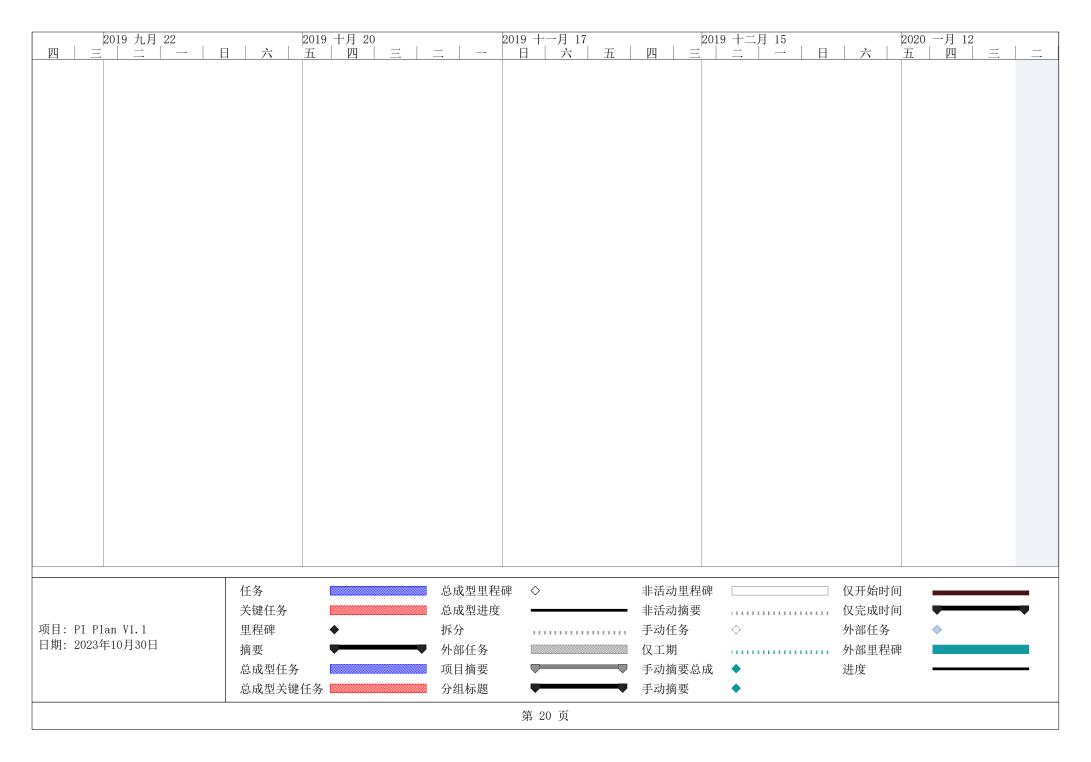


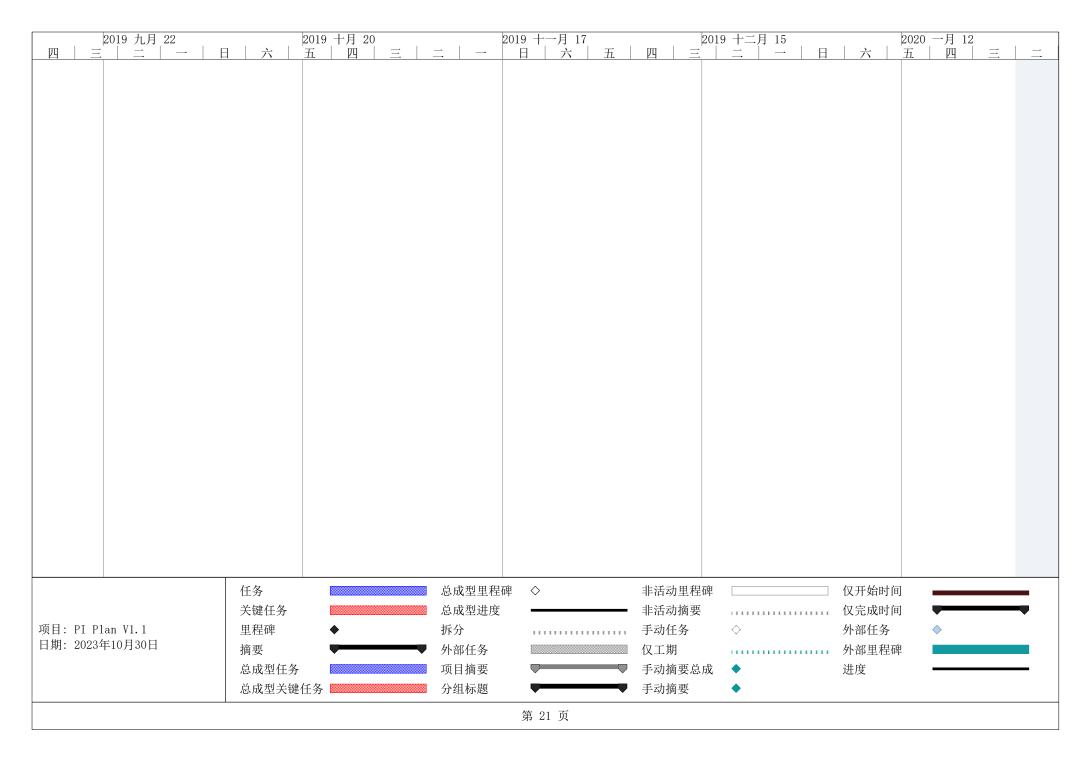


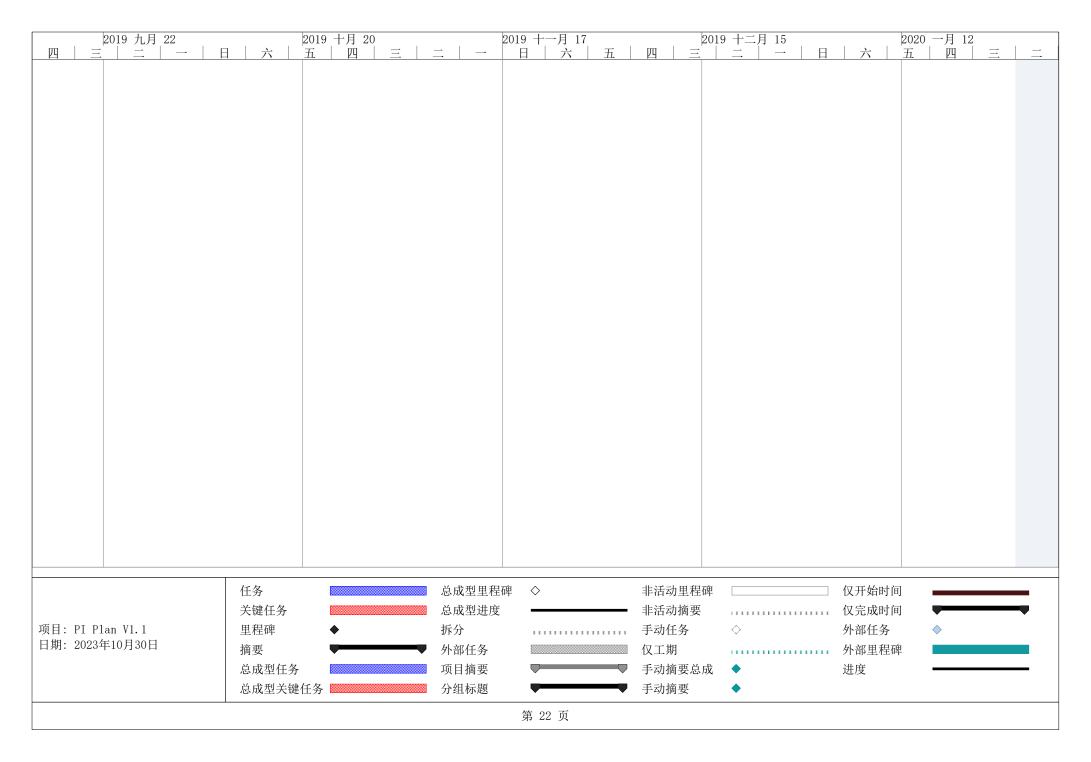


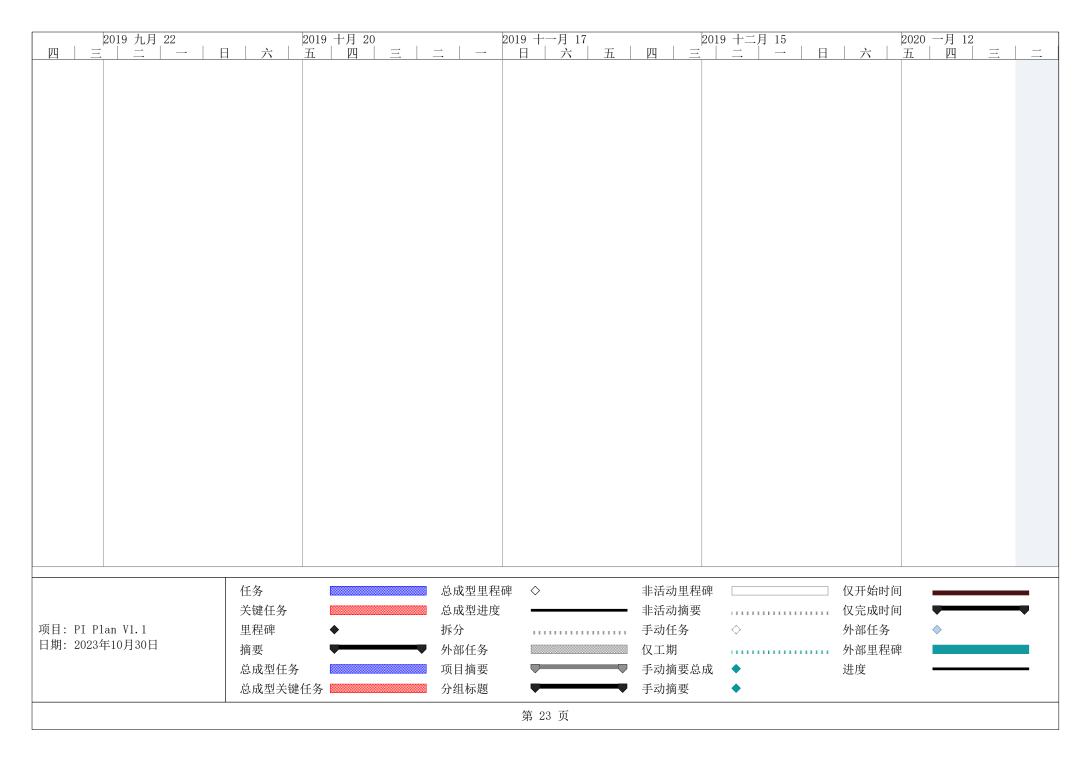


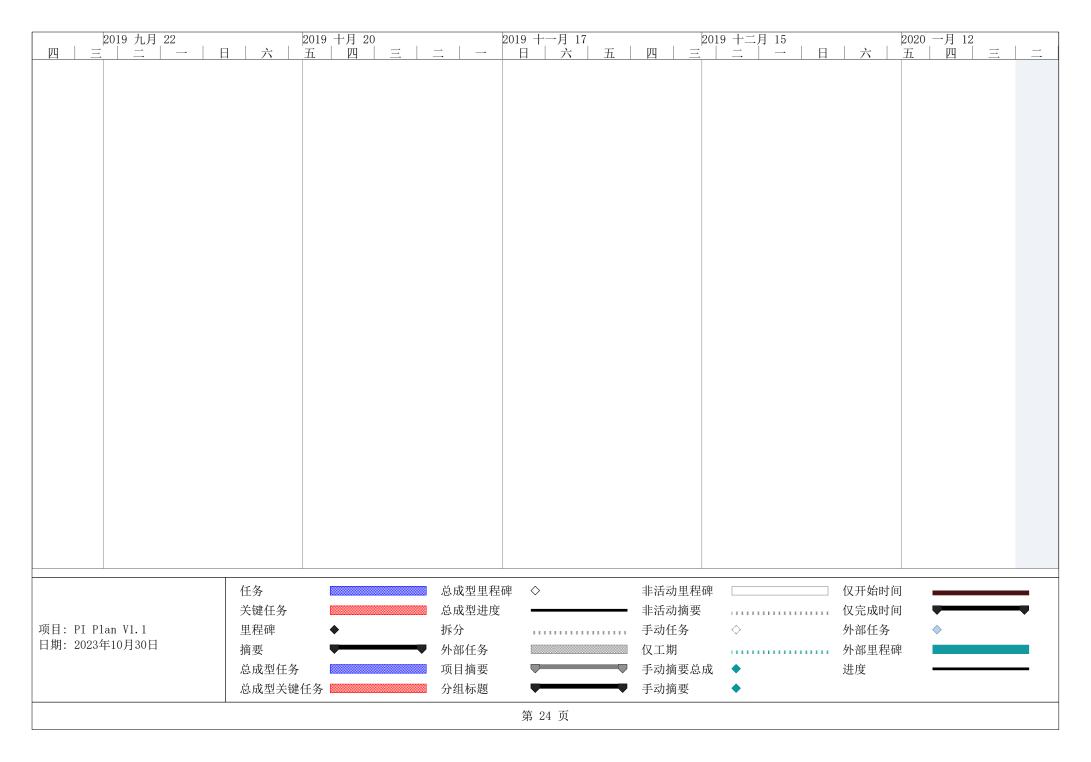


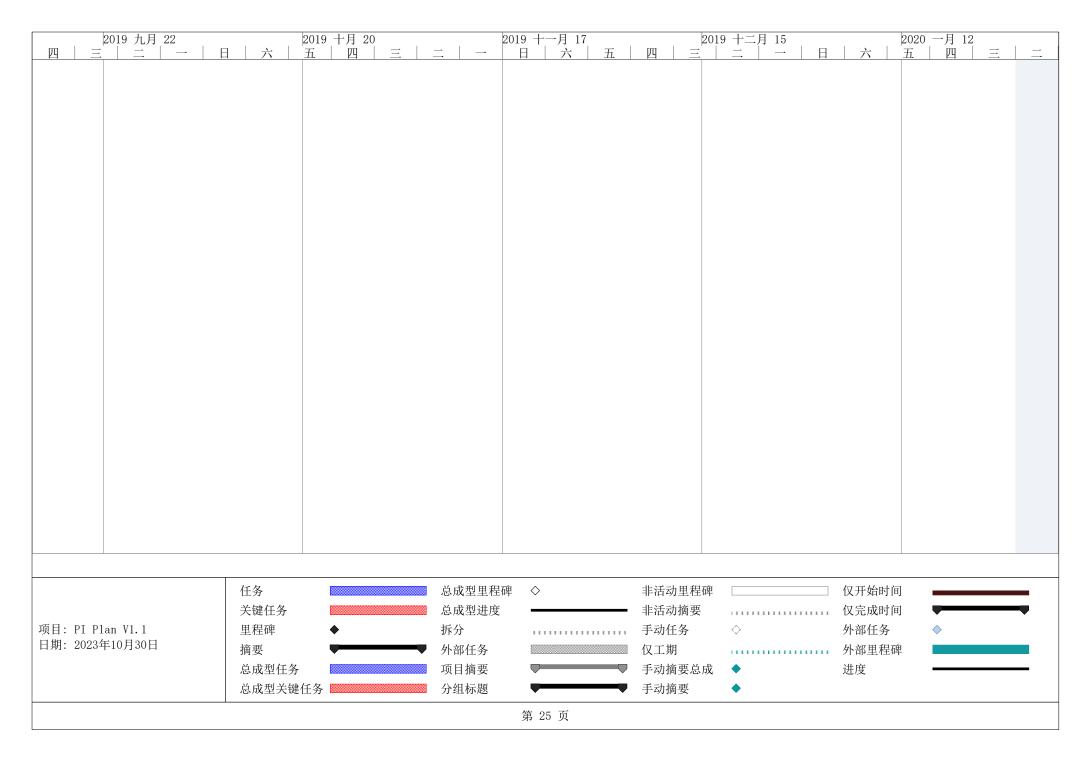


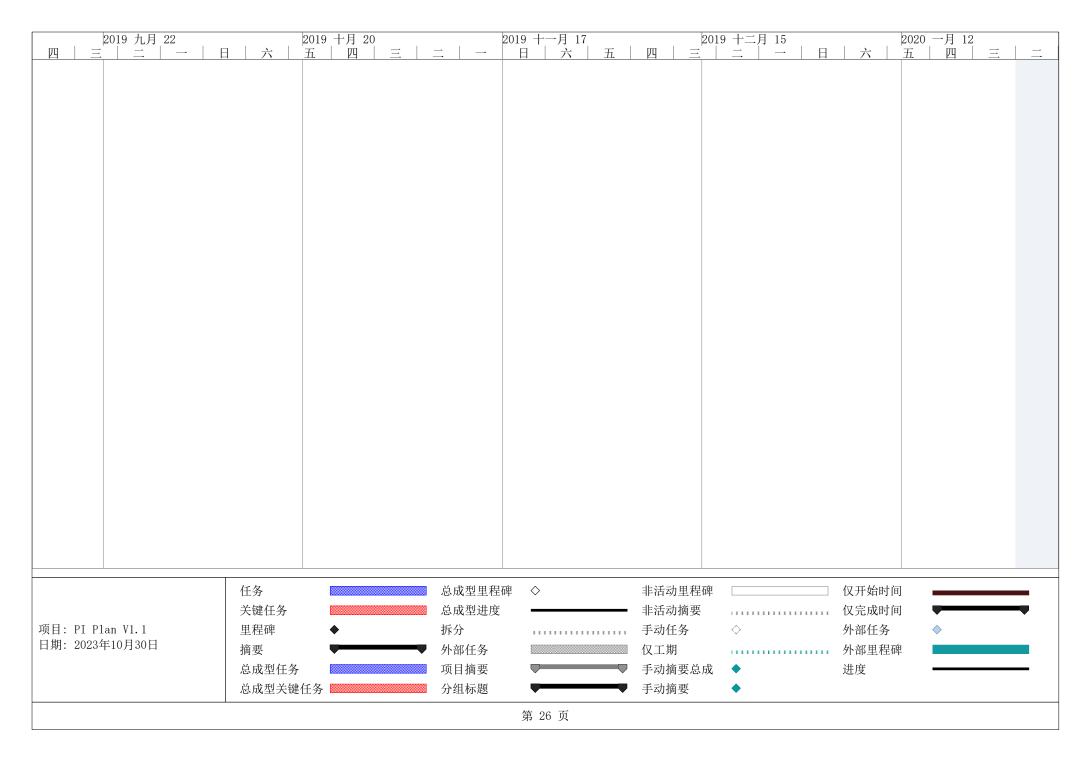


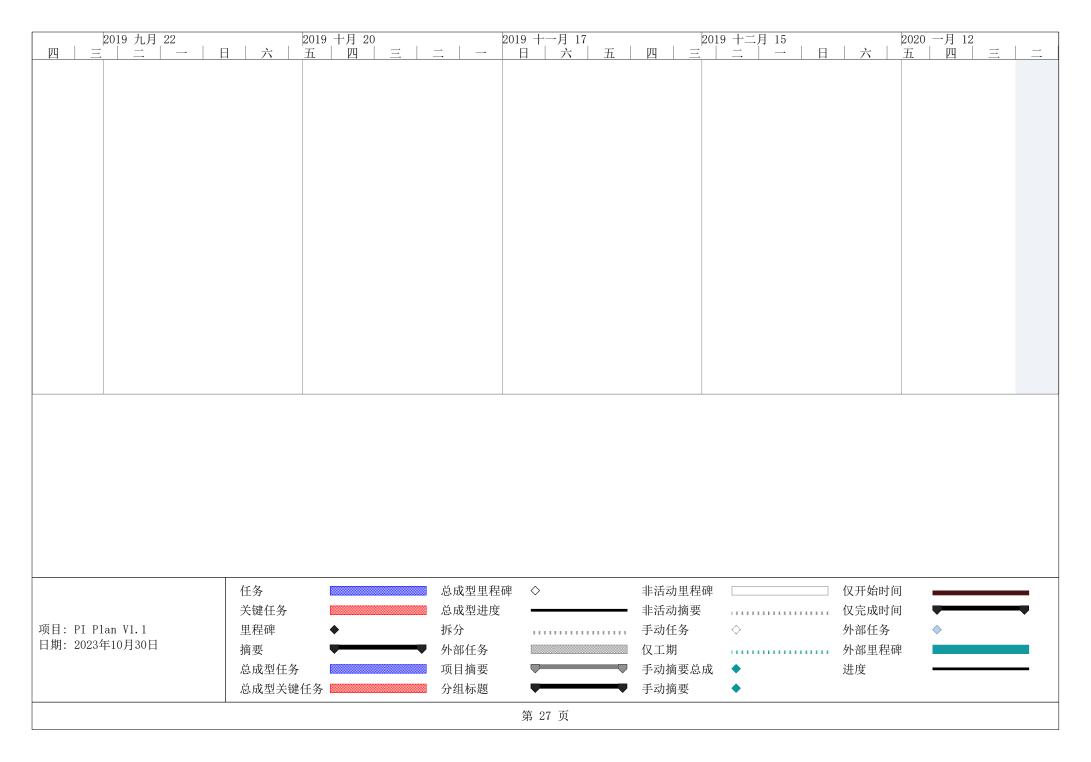


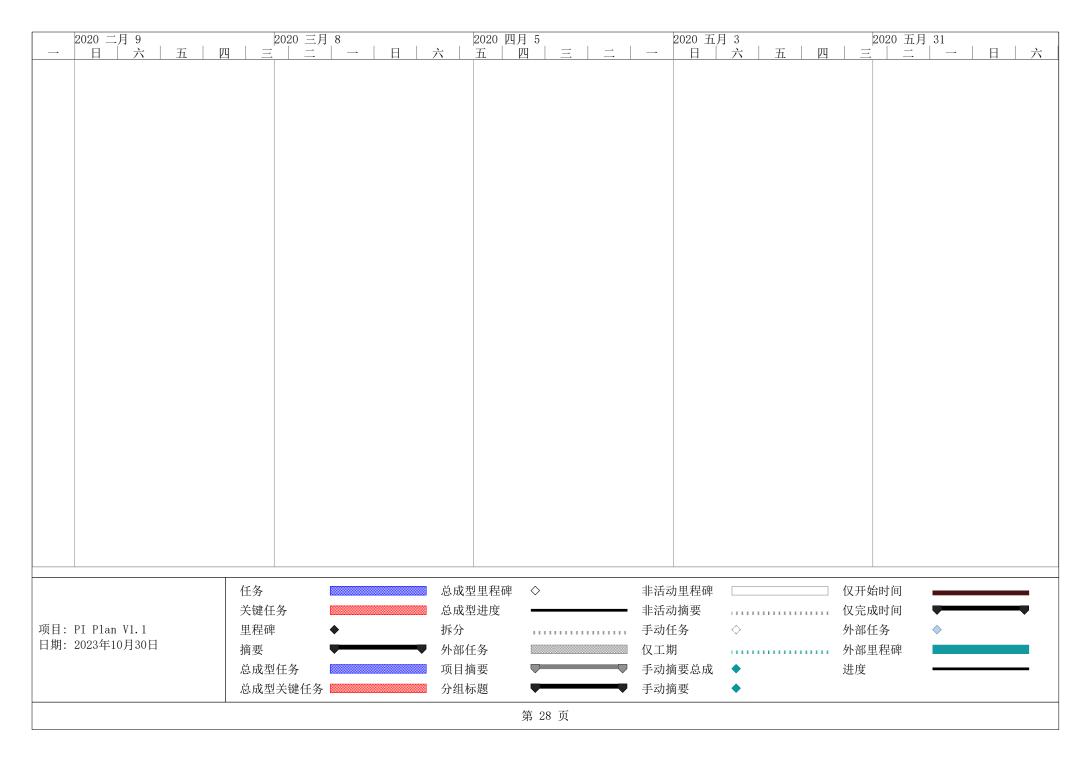


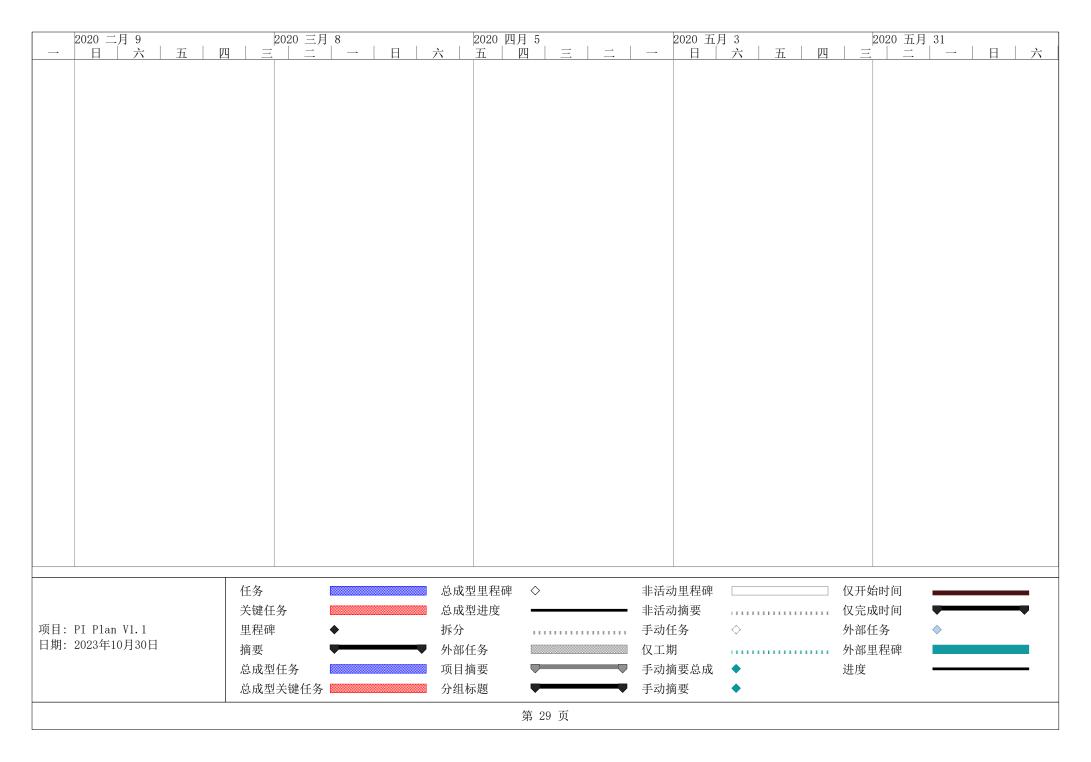


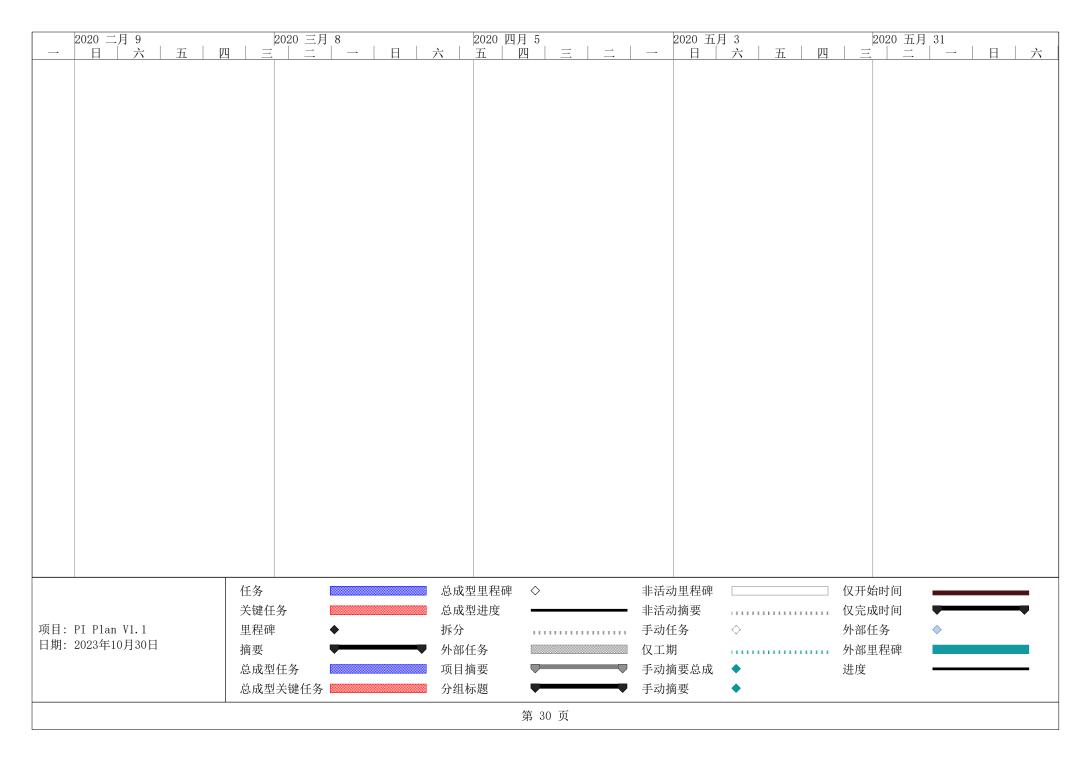


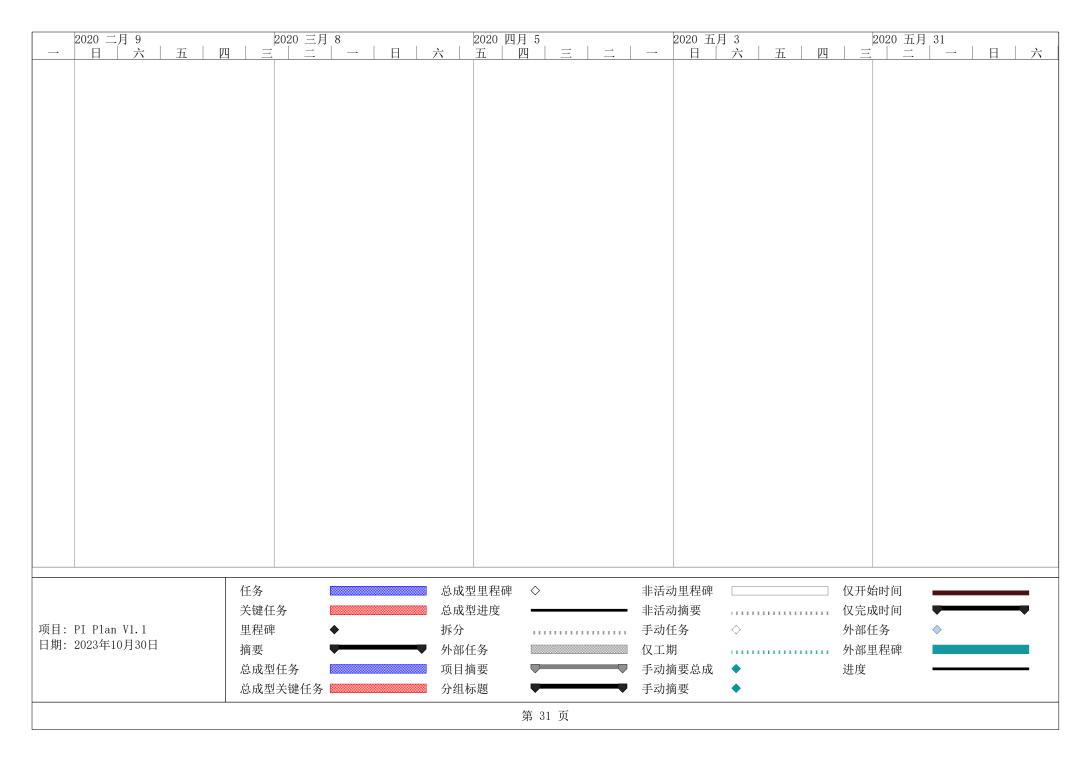

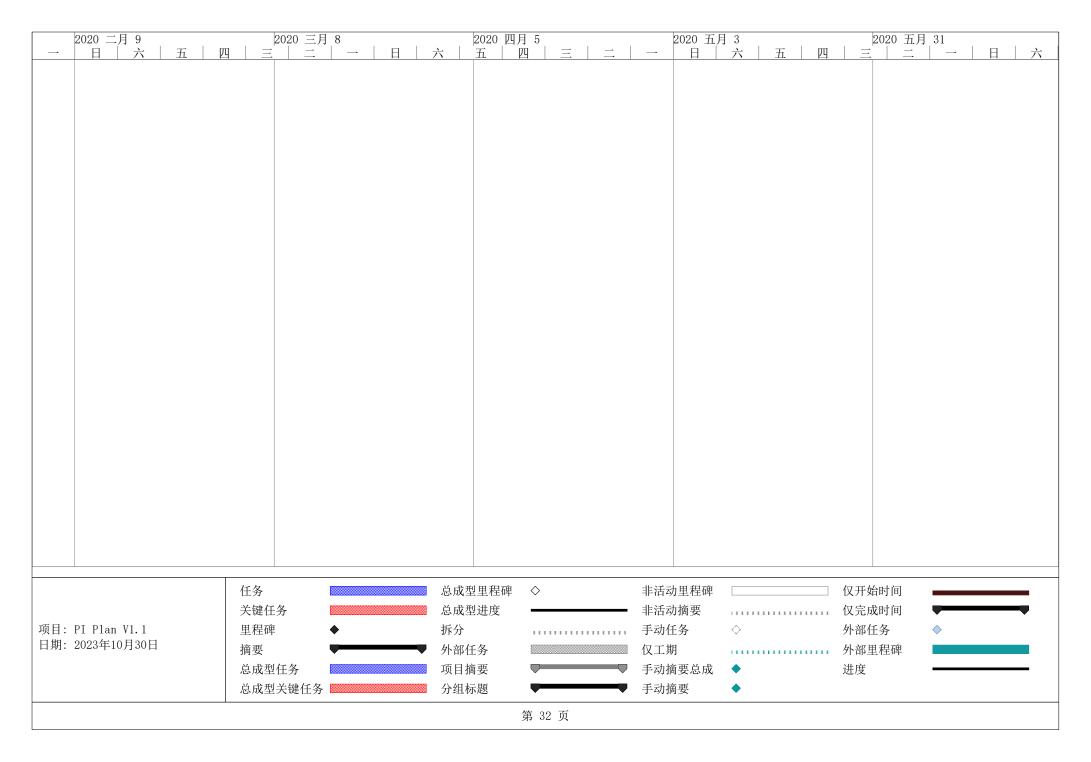

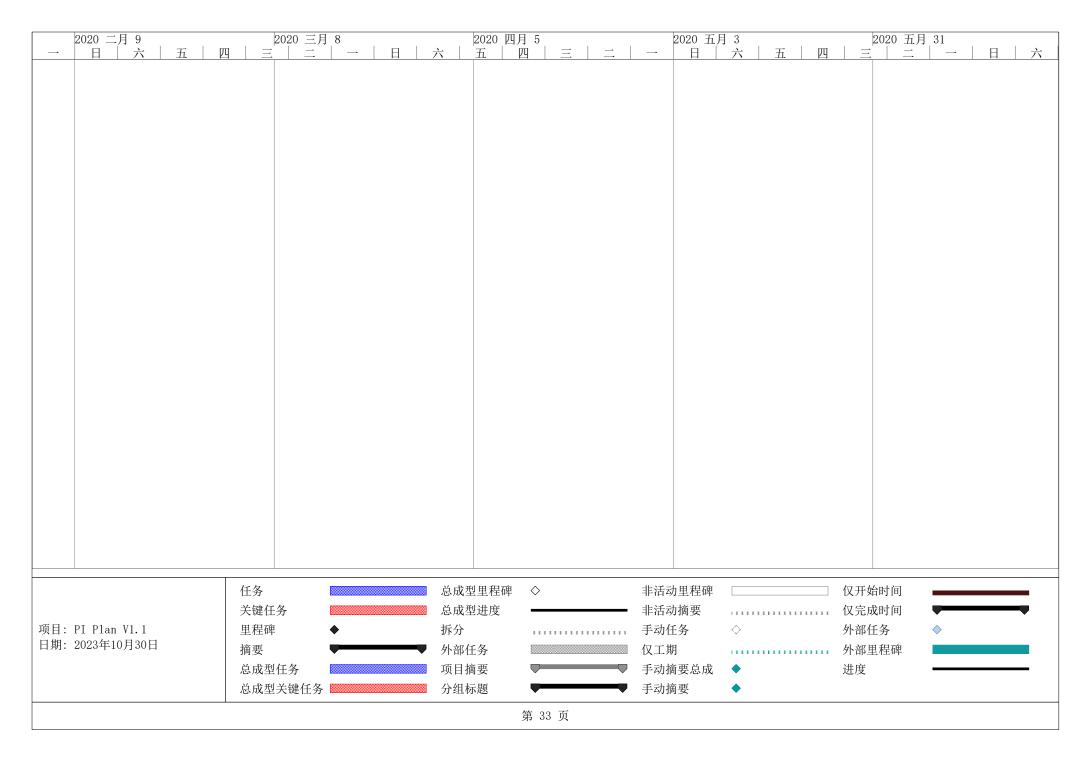

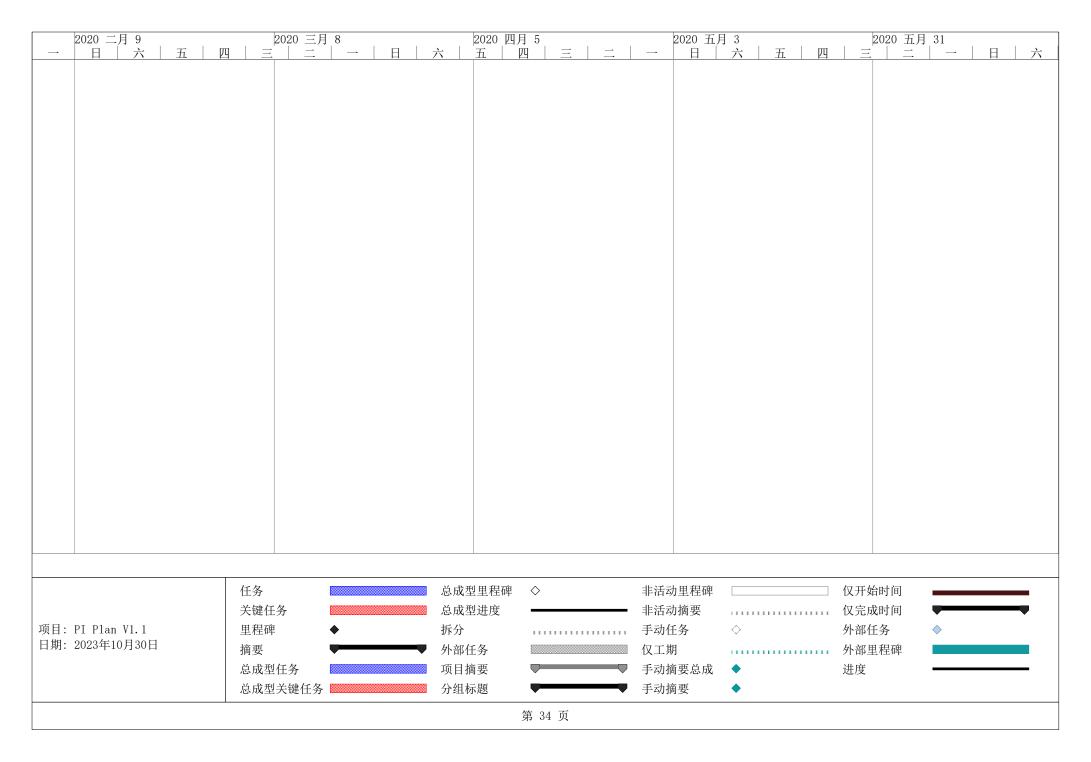

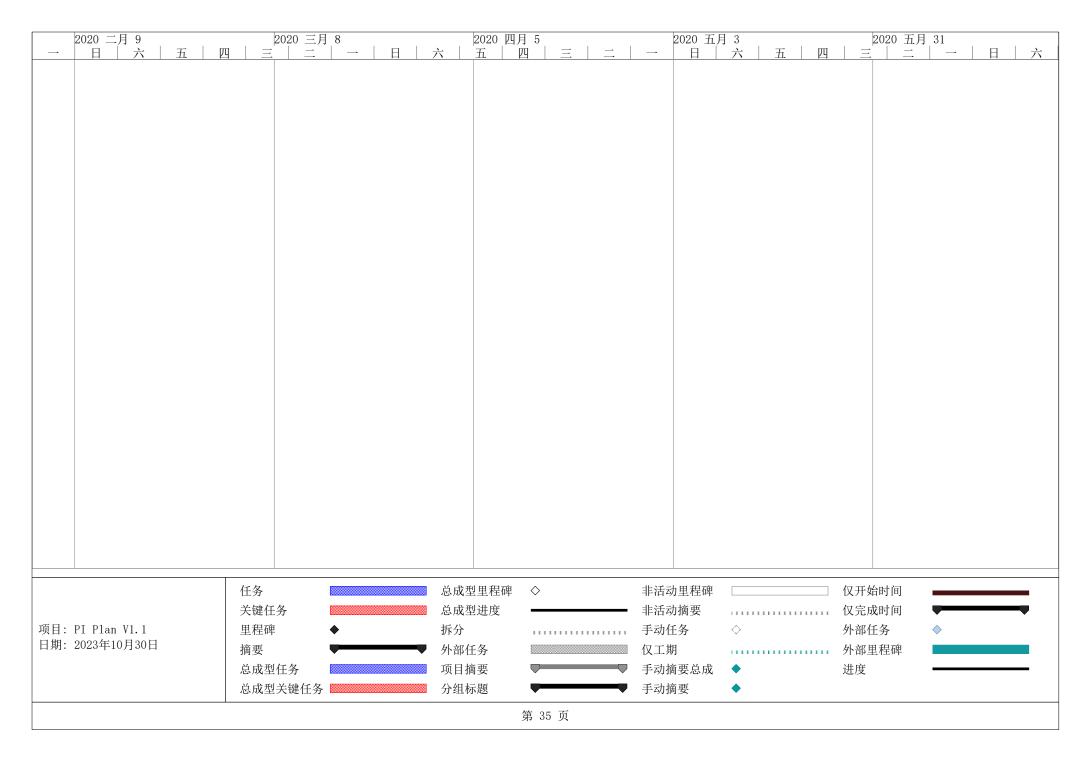

2020 二月 9	2020 三月 8	2020 四月 5	)	2020 五月	3	2020 五,	月 31
- 日   六   五		六 五 四	<u>  =   -  </u>	<u>一 日  </u>	六 五 四	<u>  =   =  </u>	一   日   7
	任务		>	非活动里程碑		仅开始时间	
	关键任务	总成型进度 -		非活动摘要			
目: PI Plan V1.1	里程碑  ◆	1.4.11		手动任务	$\Diamond$	外部任务	<b>♦</b>
期: 2023年10月30日	摘要    ▼	<b>♪</b> 外部任务 ■		仅工期	·		·
	总成型任务	项目摘要    ▼		手动摘要总成	<b>♦</b>	进度	
	总成型关键任务	· 分组标题 <b>▼</b>	<u> </u>	手动摘要	•	~ <u></u> /X	
	2.78.17.10.17		<u> </u>	J : 24 JPJ 25	•		
		第	36 页				

