示识号	0	任务名称	工期	工时	计划开始时间	计划完成时间	前置任务
1		赛事运营支持系统	293 个工作日?	275.75 个工作日	2022年6月30日	2023年8月14日	
2		项目立项	2 个工作日	7.25 个工作日	2023年4月7日	2023年4月10日	
3		了解项目情况,获得初步需求	1 个工作日	4 个工作日	2023年4月7日	2023年4月7日	
4	2	项目初步估算	0.25 个工作日	1 个工作日	2023年4月10日	2023年4月10日:	3
5	₹	项目组织架构,章程制定、 资源、职责,干系人RACI整	0.25 个工作日	0.25 个工作日	2023年4月10日	2023年4月10日	4
6	7	召开项目立项会议	0.25 个工作日	1.5 个工作日	2023年4月10日	2023年4月10日	5
7	2	编写《项目立项报告》	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年4月10日	2023年4月10日:	5
8							
9		项目计划	14.5 个工作日	42.25 个工作日	2023年4月11日	2023年5月1日	
10		项目估算	4 个工作日	12.5 个工作日	2023年4月11日	2023年4月14日	
11	&	确定软件生存周期,初步制 定QA,CM计划	1 个工作日	5 个工作日	2023年4月11日	2023年4月11日	7
12		EPG指导项目经理编写《项目定义过程》	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年4月12日	2023年4月12日:	11
13		根据初步,进行WBS分解	1 个工作日	3 个工作日	2023年4月12日	2023年4月13日	12
14		估算项目的规模,工作量, 成本,形成进度计划<项目 估算>和项目预算	1 个工作日	3 个工作日	2023年4月13日	2023年4月14日	13
15		依据<风险检查表>进行风 险识别,初步形成计划	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年4月14日	2023年4月14日:	14
16		项目计划	8 个工作日	24 个工作日	2023年4月17日	2023年4月26日	
17		项目经理制定项目计划	4 个工作日	4 个工作日	2023年4月17日	2023年4月20日	
18		完善项目进度计划	1 个工作日	1 个工作日	2023年4月17日	2023年4月17日	
19		编写《项目计划书》	2 个工作日	2 个工作日	2023年4月18日	2023年4月19日	18
20		编写〈度量计划〉	1 个工作日	1 个工作日	2023年4月20日	2023年4月20日	19
21		制定从属计划	1 个工作日	5 个工作日	2023年4月17日	2023年4月17日	
22		编写需求调研计划	1 个工作日	1 个工作日	2023年4月17日	2023年4月17日	
23		完善质量保证计划(QA)	1 个工作日	1 个工作日	2023年4月17日	2023年4月17日	
24		完善配置管理计划(CM)	1 个工作日	1 个工作日	2023年4月17日	2023年4月17日	
25		编写测试计划	1 个工作日	1 个工作日	2023年4月17日	2023年4月17日	
26		编写〈培训计划〉	1 个工作日	1 个工作日	2023年4月17日	2023年4月17日	
27		项目计划书,从属计划及项 目定义过程进行评审	1 个工作日	6 个工作日	2023年4月21日	2023年4月21日 2	21, 17

任务 总成型里程碑 仅开始时间 \Diamond 非活动里程碑 关键任务 总成型进度 非活动摘要 仅完成时间 项目: PI Plan V1.1 里程碑 拆分 手动任务 \Diamond 外部任务 日期: 2023年10月30日 摘要 外部任务 仅工期 外部里程碑 总成型任务 项目摘要 手动摘要总成 进度 总成型关键任务 分组标题 手动摘要 第1页

标识号	任务名称	工期	工时	计划开始时间	计划完成时间	前置任务
28	评审中发现的缺陷进行修正	1 个工作日	7 个工作日	2023年4月24日	2023年4月24日	27
29	项目计划书的评审与发布	1 个工作日	1 个工作日	2023年4月25日	2023年4月25日	28
30	调研计划发给客户	1 个工作日	1 个工作日	2023年4月26日	2023年4月26日	29
31	建立计划基线	2 个工作日	2.5 个工作日	2023年4月27日	2023年4月28日	21
32	计划基线建立申请,填写 《基线建立申请》	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年4月27日	2023年4月27日	30
33	QA和CM对配置库进行功能 审计和物理审计	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年4月27日	2023年4月27日	32
34	配置管理在配置库中建立 计划基线	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年4月28日	2023年4月28日	33
35	填写计划基线《发布报告》	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年4月28日	2023年4月28日	34
36	召开项目培训	1.5 个工作日	1.5 个工作日	2023年4月18日	2023年4月19日	
37	依据《项目培训计划》组 织培训	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年4月18日	2023年4月18日	26
38	编写培训反馈记录	1 个工作日	1 个工作日	2023年4月18日	2023年4月19日	37
39	项目计划里程碑	0.5 个工作日	1.75 个工作日	2023年5月1日	2023年5月1日	
40	开策划里程碑会议,填写 《策划里程碑状态报告》	0.25 个工作日	1.5 个工作日	2023年5月1日	2023年5月1日	31
41	项目经理根据里程碑数据 进行阶段性调整	0.25 个工作日	0.25 个工作日	2023年5月1日	2023年5月1日	40
42						
43	需求开发	13 个工作日	35.75 个工作日	2023年5月1日	2023年5月18日	
44	需求调研	1.5 个工作日	1.5 个工作日	2023年5月1日	2023年5月2日	
45	按照《需求调研计划》进 行调研,形成调研记录	1 个工作日	1 个工作日	2023年5月1日	2023年5月2日	
46	编写《需求跟踪矩阵》填 写原始需求	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年5月2日	2023年5月2日	
47	需求分析	9.5 个工作日	30.5 个工作日	2023年5月3日	2023年5月16日	44
48	分析需求,编写《用户需求 说明书》	2 个工作日	2 个工作日	2023年5月3日	2023年5月4日	
49	评审〈用户需求说明书〉,记 录并修改缺陷	0.5 个工作日	3 个工作日	2023年5月5日	2023年5月5日	
50	QA检查<用户需求说明书 >并记录不符合项并修改	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年5月5日	2023年5月5日	49
51	〈用户需求说明书〉提交客 户确认	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年5月8日	2023年5月8日	50


任务 总成型里程碑 仅开始时间 \Diamond 非活动里程碑 关键任务 总成型进度 非活动摘要 仅完成时间 项目: PI Plan V1.1 里程碑 拆分 手动任务 \Diamond 外部任务 日期: 2023年10月30日 摘要 外部任务 仅工期 外部里程碑 总成型任务 项目摘要 手动摘要总成 进度 总成型关键任务 分组标题 手动摘要 第 2 页

示识号	a 1	王务名称	工期	工时	计划开始时间	计划完成时间	前置任务
52		编写《产品需求说明书》	2 个工作日	2 个工作日	2023年5月8日	2023年5月10日	51
53		评审〈产品需求说明书〉,记录并修改缺陷	0.5 个工作日	3 个工作日	2023年5月10日	2023年5月10日	52
54	&	完善〈项目估算〉和《需求 跟踪矩阵》	1 个工作日	3 个工作日	2023年5月11日	2023年5月11日	53
55	&	完善编写《测试计划》	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年5月12日	2023年5月12日	
56	&	评审《测试计划》并发布	1 个工作日	2 个工作日	2023年5月12日	2023年5月15日	
57	&	完善〈项目进度计划〉,完 善〈项目计划书〉	1 个工作日	1 个工作日	2023年5月15日	2023年5月16日	
58	&	依据《产品需求说明书》 编写《系统测试用例》	1 个工作日	3 个工作日	2023年5月11日	2023年5月11日	
59	&	QA检查《产品需求说明 书》和《系统测试用例》	1 个工作日	3 个工作日	2023年5月12日	2023年5月12日	
60	&	评审〈系统测试用例〉记录 并修改缺陷	1 个工作日	6 个工作日	2023年5月15日	2023年5月15日	59
61		建立需求基线	2 个工作日	2.5 个工作日	2023年5月16日	2023年5月17日	60
62		需求基线建立申请,填写 《基线建立申请》	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年5月16日	2023年5月16日	
63		QA和CM对配置库进行功能 和物理审计	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年5月16日	2023年5月16日	62
64		配置管理在配置库中建立 需求基线	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年5月17日	2023年5月17日	63
65		填写需求基线《发布报告》	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年5月17日	2023年5月17日	
66		需求里程碑	0.5 个工作日	1.25 个工作日	2023年5月18日	2023年5月18日	
67		需求里程碑会议,填写《需 求里程碑状态报告》	0.25 个工作日	1 个工作日	2023年5月18日	2023年5月18日	65
68		项目经理对项目计划进行 阶段性调整,完善《需求	0.25 个工作日	0.25 个工作日	2023年5月18日	2023年5月18日	67
69							
70		系统设计	14 个工作日?	37.25 个工作日	2023年5月18日	2023年6月7日	43
71		决策分析	1.25 个工作日	4.25 个工作日	2023年5月18日	2023年5月19日	
72		完善技术方案,必要情况进行决策分析形成《决策分	1 个工作日	4 个工作日	2023年5月18日	2023年5月19日	
73		技术解决方案制定,购买 复用分析	0.25 个工作日	0.25 个工作日	2023年5月19日	2023年5月19日	72
74		系统概要设计	3.25 个工作日	7 个工作日	2023年5月19日	2023年5月24日	71



15:11 日		万夕		丁	T'III	11.41 TT.42 H-151	21. b		設果た々
标识号	0	任务名称		工期	工时	计划开始时间	计划	完成时间	前置任务
75	2	进行总体设计,编设计书》	写《概要	2 个工作日	2 个工作日	2023年5月22	2日	2023年5月23日	73
76		评审〈概要设计〉,	记录缺陷	1 个工作日	4 个工作日	2023年5月24	1日	2023年5月24日	75
77	2	数据库初步设计		1 个工作日	1 个工作日	2023年5月19	日	2023年5月22日	
78		系统详细设计		5 个工作日?	15 个工作日	2023年5月25	5日	2023年5月31日	76
79		依据《概要设计说 编写《详细设计说		3 个工作日	3 个工作日	2023年5月25	5日	2023年5月29日	
80		评审〈详细设计〉,	记录缺陷	1 个工作日	5 个工作日	2023年5月30)日	2023年5月30日	79
81	&	QA检查<详细设计 符合项并修正	>记录不	1 个工作日	2 个工作日	2023年5月31	LE I	2023年5月31日	80
82	2	完善《需求跟踪知	巨阵》	1 个工作日?	1 个工作日	2023年5月25	5日	2023年5月25日	
83	oe ·	依据《详细设计说 编制《单元测试计	说明书》 计划》	1 个工作日	2 个工作日	2023年5月31	I 日	2023年5月31日	
84	2	依据《详细设计说 《单元测试计划》 《单元测试用例》	编制	1 个工作日	2 个工作日	2023年5月25		2023年5月25日	
85		编写〈交付件一览表〉		1 个工作日	1 个工作日	2023年6月1	H	2023年6月1日	
86		编写〈用户操作手册〉	初稿	1 个工作日	1 个工作日	2023年6月2	2日	2023年6月2日	
87	&	编写〈接口列表〉		0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年6月5		2023年6月5日	
88	&	编写〈接口定义书〉		1 个工作日	2 个工作日	2023年6月5		2023年6月6日	
89		编写〈产品集成计划〉	>	1 个工作日	2 个工作日	2023年6月6		2023年6月7日	88
90		建立设计基线		2 个工作日	2.5 个工作日	2023年6月1	* * *	2023年6月2日	
91		设计基线建立申请 《基线建立申请》		0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年6月1		2023年6月1日	
92		QA和CM对配置库边		0.5 个工作日	1 个工作日	2023年6月1		2023年6月1日	
93		配置管理在配置库 设计基线		0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年6月2		2023年6月2日	
94		填写设计基线《发	文布报告》	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年6月2		2023年6月2日	93
95		设计里程碑		0.5 个工作日	2 个工作日	2023年6月5		2023年6月5日	
96	2	召开设计里程碑设 填写《设计里程码	卑状态报	0.25 个工作日	1.75 个工作日	2023年6月5	5日	2023年6月5日	94
97		项目经理对项目; 阶段性调整,完善 跟踪矩阵》	計划进行	0.25 个工作日	0.25 个工作日	2023年6月5	5日	2023年6月5日	96
98		₹ /d+ /d+ 177 ed-170		00 5 4 7 16 17	05 55 A T 16 D	0000 H a H s	• 1-1	0000 27 110 11	70
99		系统编码实现		26.5 个工作日	85.75 个工作日	2023年6月7	<u> </u>	2023年7月13日	70
			任务		总成型里程碑	\Diamond	非活动里程碑		□ 仅开
			关键任务		总成型进度		非活动摘要		111 仅完加
饭日 ·	рт і	Plan V1.1	里程碑	<u> </u>	振分		手动任务	\Diamond	外部包
		3年10月30日						Ť	
□ /yJ·	202	0 10/100 H	摘要		→ 外部任务		仅工期		
			总成型任务		グロスタイプ 東京 		手动摘要总成	•	进度
			总成型关键位	任务 📉	分组标题		手动摘要	•	
						然 4 五			


标识号	0	任务名称	工期	工时	计划开始时间	计划完成时间	前置任务
100		编码	17 个工作日	59 个工作日	2023年6月7日	2023年6月30日	
101		运营管理系统升级	6 个工作日	12 个工作日	2023年6月7日	2023年6月15日	81
102	2	业务协作门户升级	7 个工作日	14 个工作日	2023年6月7日	2023年6月16日	81
103	2	移动端监控应用系统建设	11 个工作日	33 个工作日	2023年6月15日	2023年6月30日	101
104		代码审查(编码期间完善, 日期为截止日期)	2 个工作日	3.5 个工作日	2023年6月30日	2023年7月4日	
105	<u></u>	完善〈产品集成计划〉(编 码期间完善)	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年6月30日	2023年6月30日	103
106	&	完善〈单元测试计划〉(编 码期间完善)	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年7月3日	2023年7月3日	105
107	&	核心代码交叉走查(编码 期间完善)	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年7月3日	2023年7月3日	106
108	<u></u>	完善单元测试用例(编码 期间完善)	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年7月4日	2023年7月4日	107
109		编写单元测试用例(编码期 间完善,日期为截止日期)	1 个工作日	2 个工作日	2023年7月4日	2023年7月5日	
110	2	评审<单元测试用例>, 记录缺陷并修正	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年7月4日	2023年7月4日	108
111	2	QA检查<单元测试用例 >记录不符合项并修正	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年7月5日	2023年7月5日	110
112		执行单元测试	4.5 个工作日	9 个工作日	2023年6月30日	2023年7月6日	
113	<u></u>	依据《单元测试用例》执 行单元测试	2 个工作日	4 个工作日	2023年6月30日	2023年7月4日	100
114	&	单元测试执行过程中发现 的缺陷记录《单元测试	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年7月4日	2023年7月4日	113
115	<u></u>	编写《单元测试报告》	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年7月5日	2023年7月5日	
116	<u></u>	QA检查《单元测试报告》 和《单元测试BUG记录》	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年7月5日	2023年7月5日	115
117		完善〈接口定义书〉	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年7月6日	2023年7月6日	87, 116
118		接口进行评审	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年7月6日	2023年7月6日	87, 117
119		产品集成	3 个工作日	6 个工作日	2023年7月7日	2023年7月11日	
120	2	搭建集成环境	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年7月7日	2023年7月7日	
121	<u>&</u>	依据〈产品集成检查列表 〉,〈接口列表〉进行检查	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年7月7日	2023年7月7日	120
122	&	进行产品集成,模块集成过程中编写<产品集成模块核	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年7月10日	2023年7月10日	121



标识号	0	任务名称	工期	工时	计划开始时间	计划完成时间	前置任务
123	2	准备完毕进行产品集成, 进行集成测试	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年7月10日	2023年7月10日	122
124	&	问题修复处理	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年7月11日	2023年7月11日	123
125	2	编写《产品集成阶段报告》	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年7月11日	2023年7月11日	124
126		建立开发基线	1.75 个工作日	3.25 个工作日	2023年7月11日	2023年7月13日	
127		开发基线建立申请,填写 《基线建立申请》	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年7月11日	2023年7月11日	125SS
128	&	QA和CM对配置库进行功能 审计和物理审计	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年7月12日	2023年7月12日	
129	&	配置管理在配置库中建立 开发基线	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年7月12日	2023年7月12日	
130		填写开发基线《发布报告》	0.25 个工作日	0.25 个工作日	2023年7月13日	2023年7月13日	129
131		实现阶段里程碑	0.75 个工作日	3 个工作日	2023年7月13日	2023年7月13日	
132		召开实现里程碑评审会议, 填写《编码里程碑状态报	0.5 个工作日	2 个工作日	2023年7月13日	2023年7月13日	130
133		项目经理对项目计划进行 阶段性调整,完善《需求 跟踪矩阵》	0.25 个工作日	1 个工作日	2023年7月13日	2023年7月13日	132
134						_	
135		系统测试	13 个工作日	29 个工作日	2023年7月7日	2023年7月26日	
136		系统测试	10.5 个工作日	17 个工作日	2023年7月7日	2023年7月21日	
137	&	测试前进行测试用例自评	1 个工作日	2 个工作日	2023年7月7日	2023年7月10日	
138	&	搭建系统测试环境	1 个工作日	2 个工作日	2023年7月10日	2023年7月11日	
139	&	执行系统测试	5 个工作日	5 个工作日	2023年7月11日	2023年7月18日	
140	&	执行回归测试	2 个工作日	4 个工作日	2023年7月18日	2023年7月20日	
141		记录测试中发现的BUG并进 行修改	1 个工作日	2 个工作日	2023年7月20日	2023年7月21日	
142	&	统计分析测试数据编写〈系 统测试报告〉	0.5 个工作日	2 个工作日	2023年7月21日	2023年7月21日	141
143		建立测试基线	2 个工作日	8 个工作日	2023年7月24日	2023年7月25日	
144	&	测试基线建立申请,填写 《基线建立申请》	0.5 个工作日	2 个工作日	2023年7月24日	2023年7月24日	142
145	&	QA和CM对配置库进行功能 审计和物理审计	0.5 个工作日	2 个工作日	2023年7月24日	2023年7月24日	144
146	&	配置管理在配置库中建立 测试基线	0.5 个工作日	2 个工作日	2023年7月25日	2023年7月25日	145

任务 总成型里程碑 仅开始时间 \Diamond 非活动里程碑 关键任务 总成型进度 非活动摘要 仅完成时间 项目: PI Plan V1.1 里程碑 拆分 手动任务 \Diamond 外部任务 日期: 2023年10月30日 摘要 外部任务 仅工期 外部里程碑 总成型任务 项目摘要 手动摘要总成 进度 总成型关键任务 分组标题 手动摘要


示识号	0	任务名称	工期	工时	计划开始时间	计划完成时间	前置任务
147	2	填写测试基线《发布报告》	0.5 个工作日	2 个工作日	2023年7月25日	2023年7月25日	146
148		测试阶段里程碑	0.5 个工作日	4 个工作日	2023年7月26日	2023年7月26日	
149	&	召开测试里程碑评审会议, 填写《编码里程碑状态报	0.25 个工作日	2 个工作日	2023年7月26日	2023年7月26日	147
150	&	项目经理对项目计划进行 阶段性调整	0.25 个工作日	2 个工作日	2023年7月26日	2023年7月26日	149
151							
152		上线及验收 (产品交付)	11.5 个工作日	22 个工作日	2023年7月26日	2023年8月10日	135
153		试运行	3.5 个工作日	7.5 个工作日	2023年7月26日	2023年7月31日	
154	2	制定《系统上线验收计 划》提交客户确认	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年7月26日	2023年7月26日	142
155	2	更新完善《产品交接验收单	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年7月27日	2023年7月27日	154
156		更新完善〈用户手册〉	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年7月27日	2023年7月27日	155
157		QA检查〈用户手册〉记录不符合项进行修正	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年7月28日	2023年7月28日	156
158		产品进行打包,编写《产 品打包清单》	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年7月28日	2023年7月28日	157
159		配置管理员根据《产品交 接验收单》将产品基线中 的配置项放入产品库	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年7月31日	2023年7月31日	158
160	2	系统安装部署,用户确认	0.5 个工作日	1.5 个工作日	2023年7月31日	2023年7月31日	159
161		验收	9 个工作日	8.5 个工作日	2023年7月26日	2023年8月8日	
162	&	项目经理向客户提出验收 申请,编写《验收计划》	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年7月26日	2023年7月26日	142
163	&	测试人员与客户共同编写 《验收测试用例》	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年7月27日	2023年7月27日	162
164	2	执行验收测试	7 个工作日	4.5 个工作日	2023年7月27日	2023年8月7日	163
165		记录验收测试BUG,并进行 修正至关闭	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年8月7日	2023年8月7日	164
166		编写《验收报告》,客户确	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年8月8日	2023年8月8日	165
167		建立产品基线	2 个工作日	4 个工作日	2023年8月8日	2023年8月10日	
168		产品基线建立申请,填写 《基线建立申请》	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年8月8日	2023年8月8日	166
169	<u></u>	QA和CM对配置库进行功能 审计和物理审计	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年8月9日	2023年8月9日	168



示识号	任务名称	工期	工时	计划开始时间	计划完成时间	前置任务
170	配置管理在配置库中建立 产品基线	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年8月9日	2023年8月9日	169
171	填写产品基线《发布报告》	0.5 个工作日	1 个工作日	2023年8月10日	2023年8月10日	170
172	验收里程碑	0.5 个工作日	2 个工作日	2023年8月10日	2023年8月10日	
173	召开验收里程碑评审会 议,填写《验收里程碑状	0.25 个工作日	1.5 个工作日	2023年8月10日	2023年8月10日	171
174	必要时对相关计划进行相 应调整	0.25 个工作日	0.5 个工作日	2023年8月10日	2023年8月10日	173
175						
176	项目总结	2 个工作日	5.5 个工作日	2023年8月11日	2023年8月14日	172
177	编写《项目总结报告》, 收集 相关经验	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年8月11日	2023年8月11日	
178	项目总结大会(总结度量、 经验以及教训)	0.5 个工作日	4 个工作日	2023年8月11日	2023年8月11日	177
179	更新《项目总结报告》	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年8月14日	2023年8月14日	178
180	EPG将度量数据、优秀案例、 经验教训等纳入组织财富库	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年8月14日	2023年8月14日	179
181						
182	配置管理	181.5 个工作日	2.5 个工作日	2022年7月29日	2023年4月10日	
183	搭建配置库	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2023年4月10日	2023年4月10日	3
.84 	配置管理 1	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2022年7月29日	2022年7月29日	
85	配置管理 2	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2022年8月31日	2022年8月31日	
186	配置管理 3	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2022年9月30日	2022年9月30日	
186 	配置管理 4	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2022年10月28日	2022年10月28日	
188						
189	需求管理	41.75 个工作日	1 个工作日	2023年5月5日	2023年7月4日	
190	需求跟踪矩阵的维护-需求	0.25 个工作日	0.25 个工作日	2023年5月5日	2023年5月5日	
191	需求跟踪矩阵的维护-设计	0.25 个工作日	0.25 个工作日	2023年6月7日	2023年6月7日	70
192	需求跟踪矩阵的维护-编码	0.25 个工作日	0.25 个工作日	2023年7月4日	2023年7月4日	
193	需求跟踪矩阵的维护-测试	0.25 个工作日	0.25 个工作日	2023年5月16日	2023年5月16日	60
194 🤇	周期性质量保证活动	86.5 个工作日	2.5 个工作日	2022年6月30日	2022年10月28日	
195 🚡	周期性质量保证活动 1	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2022年6月30日	2022年6月30日	
196	周期性质量保证活动 2	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2022年7月29日	2022年7月29日	
197	周期性质量保证活动 3	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2022年8月31日	2022年8月31日	
198	周期性质量保证活动 4	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2022年9月30日	2022年9月30日	

任务 总成型里程碑 仅开始时间 \Diamond 非活动里程碑 关键任务 总成型进度 非活动摘要 仅完成时间 项目: PI Plan V1.1 里程碑 拆分 手动任务 \Diamond 外部任务 日期: 2023年10月30日 摘要 外部任务 仅工期 外部里程碑 总成型任务 项目摘要 手动摘要总成 进度 总成型关键任务 分组标题 手动摘要

标识号	1	任务名称	工期	工时	计划开始时间	计划完成时间	前置任务
199		周期性质量保证活动 5	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2022年10月28日	2022年10月28日	
200	0	项目周例会跟踪风险和度量	90.5 个工作日	5 个工作日	2022年7月1日	2022年11月4日	
201		项目周例会跟踪风险和度量 1	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2022年7月1日	2022年7月1日	
202	00	项目周例会跟踪风险和度量 2	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2022年7月15日	2022年7月15日	
203		项目周例会跟踪风险和度量 3	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2022年7月29日	2022年7月29日	
204		项目周例会跟踪风险和度量 4	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2022年8月12日	2022年8月12日	
205	00	项目周例会跟踪风险和度量 5	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2022年8月26日	2022年8月26日	
206		项目周例会跟踪风险和度量 6	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2022年9月9日	2022年9月9日	
207	00	项目周例会跟踪风险和度量 7	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2022年9月23日	2022年9月23日	
208	00	项目周例会跟踪风险和度量 8	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2022年10月7日	2022年10月7日	
209		项目周例会跟踪风险和度量 9	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2022年10月21日	2022年10月21日	
210	00	项目周例会跟踪风险和度量 1	0.5 个工作日	0.5 个工作日	2022年11月4日	2022年11月4日	



资源名称		六月 2		2019 六月 30		2019 七月 28	1	2019 八月 25
	<u> </u>	十 六 一	五 三		日六	五 四 三		日 六 三
项目经理, 高级设计, 测试, 高级编码								
项目经理, 高级编码, 高级测试, 高级设计								
项目经理								
项目经理,设计,需求,测试,配置管理,高级 扁码								
页目经理								
项目经理,配置管理,质量保证								
项目经理, EPG								
项目经理,高级编码,设计								
项目经理, 高级编码, 设计								
项目经理								
项目经理								
项目经理 第日经理								
项目经理								
需求								
质量保证主管 配置管理								
高级测试								
音训								
配置管理,测试,项目经理,需求,设计,高级 扁码								
任务			总成型里程碑	·	非活动里程碑		仅开始时间	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			■■■■ 总成型进度	- V	非活动摘要			
项目: PI Plan V1.1 里程		♦	拆分			\Diamond	外部任务	\$
日期: 2023年10月30日 摘要		-	→ 外部任务		仅工期			
	型任务		项目摘要		手动摘要总成	♦	进度	
	型关键任务		分组标题	—	手动摘要	•		
				第 10 页				

资源名称		9 六月 2	5 四 三	2019 六月 30 二 一		2019 七月 28	= -	2019 八月 25	
需求,设计,测试,配置管理,EPG,项目	经理, i	日 六 3	5 四 三	- -	日 六	五 四 三		日六	1 11.
项目经理									
项目经理									
配置管理									
配置管理,质量保证									
配置管理									
配置管理									
培训									
培训									
项目经理, 需求, 设计, 测试, 配置管理 编码	,高级								
项目经理									
需求									
需求									
需求									
项目经理, 需求, 设计, 测试, 配置管理 编码	,高级								
^{拥[5]} 配置管理, 质量保证									
项目经理,需求									
	任务		总成型里程碑	\Diamond	非活动里程碑		仅开始时间		
-ZE DI DI 111 1	关键任务		■ 总成型进度		非活动摘要		仅完成时间	^	
项目: PI Plan V1.1 日期: 2023年10月30日	里程碑	*	拆分		手动任务	\Diamond	外部任务	♦	
H /91. 2020 T 10/100 H	摘要		▼ 外部任务		仅工期 五計				
	总成型任务 总成型关键任务		 ■ 项目摘要 ■ 分组标题		手动摘要总成 手动摘要	♦	进度		
				第 11 页					

资源名称		2019 六			, ,	2019 六月 30		2019 七月 28		2019 八月	25
		H	六	<u> </u>	四 三		日一六	五 三		日	六 五
项目经理,需求,设计,测试,配置领	管理,高级										
编码											
高级编码,设计,项目经理											
测试											
测试,项目经理											
项目经理											
项目经理, 需求, 测试											
需求,测试,质量保证											
项目经理,需求,设计,测试,配置行	管理,高级										
编码											
配置管理											
配置管理,质量保证											
配置管理											
配置管理											
项目经理, 需求, 测试, 配置管理											
项目经理											
人口工工工											
设计,项目经理,需求,高级编码											
架构师											
	任务				总成型里程碑	♦	非活动里程碑		仅开始时间		
	关键任务	00000			总成型进度		非活动 重性		仅完成时间		
项目: PI Plan V1.1	里程碑								外部任务	♦	•
日期: 2023年10月30日	海里 海要				外部任务		于幼任 务 仅工期	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		V	
. , ,	摘安 总成型任务	▼		•	介		(X工期)手动摘要总成	♦	が ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		
	总成型长键				分组标题	<u> </u>	于动摘安总成 手动摘要	*	<i>八八</i> 又		
	心风至大链	山ガ			刀紅小吃	V	丁ツ泂女	▼			
						第 12 页					

资源名称	20	19 六月 2 日 六	五.	四 三	2019 六月 30		2019 七月 28 五 四 三	= -	2019 八月 25 日 六 三
		н / /	11.			П / /	11.		<u> </u>
页目经理, 需求, 设计, 架构师 架构师									
界构师									
页目经理,设计,需求,编码,架构师 设计,编码									
设计 设计, 编码									
扁码, 设计									
设计 设计 设计 项目经理, 设计									
页目经理,设计									
记置管理									
记置管理, 质量保证 记置管理									
尼置管理									
页目经理,设计,需求,测试,高级编码,酉 管理,质量保证 页目经理	置								
				总成型里程碑	♦	非活动里程碑		仅开始时间	
	关键任务			总成型进度		非活动摘要			-
E #E 0000 K 10 E 00 E	里程碑	•		拆分		手动任务	\Diamond	外部任务	♦
	摘要			外部任务		仅工期			
	总成型任务 总成型关键任务	Z		项目摘要 分组标题		手动摘要总成 手动摘要	♦	进度	
	心风王大珽江乡	7	*************	刀 :11170125	▼	厂约顶女	▼		


资源名称		2019 ナ		T	100		2019 六月 30			七月 2	28	1 -	ı		月 25	T
		日	六	五.	四	<u> =</u>		日 六	五.	四	=	=		日	<u></u> 六	五.
高级编码, 架构师																
高级编码, 编码 编码, 设计, 架构师																
細的,反互,条构则																
高级编码																
高级编码																
高级编码																
高级编码																
高级编码																
高级编码																
高级编码																
高级编码																
高级编码																
高级编码,质量保证																
项目经理,设计																
项目经理,设计																
高级编码																
高级编码																
高级编码																
	任务				总成型	甲程砷	♦	非活动里程碑				仅开始时	计间			
	注				总成型		<u> </u>	非活动重性降非活动摘要				仅完成時				
项目: PI Plan V1.1	里程碑	•			拆分	KLIX.						外部任务		♦		•
日期: 2023年10月30日	摘要	<u></u>			外部任	务		工期				外部里和		·		
	总成型任务	· ·		Ť	项目摘		V	手动摘要总成				进度				
	总成型关键位	任务 ■			分组标		—	手动摘要	•							
	1						第 14 页									


资源名称		2019 <i>テ</i> 日	月 2	<u>Fi</u> .	四		2019 六月 30	日 六	2019 五.	七月 28 四	三	<u> </u>	20	19 八月	25 六 五
高级编码		Н			<u> </u>			Н Л		<u> </u>				Н	Л Д
高级编码															
高级编码															
配置管理															
配置管理,质量保证															
配置管理															
配置管理															
项目经理,设计,编码,测试															
项目经理															
测试															
测试 测试															
测试															
编码															
测试															
配置管理															
配置管理,质量保证															
配置管理															
					V D 774	TT distant									
	任务					里程碑	♦	非活动里程碑				仅开始时间			
项目: PI Plan V1.1	关键任务 里程碑	■			总成型 拆分		-					仅完成时间 外部任务) (
日期: 2023年10月30日	生住曜 摘要	-			外部任	久		■ 仅工期				外部生程 外部里程码			
	点成型任务	V		_	ティア			■ K工期 ■ 手动摘要总成	•			かい ・ 进度	†·		
	总成型关键位	王务 🏻			分组标		<u> </u>	▼ 子动摘要	*			~-!X			
	l						第 15 页								


资源名称		9 六月 2 日 六 五		2019 六月 30 二 一		2019 七月 28 五 四 三	= -	2019 八月 25日	
配置管理		П / Л Д.			П Л	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>
项目经理,配置管理主管,质量保证主管试	. 测								
项目经理									
项目经理									
项目经理									
设计									
设计,质量保证									
项目经理, 需求									
配置管理									
项目经理, 设计, 测试									
项目经理									
项目经理									
测试 测试, 编码									
项目经理									
配置管理									
配置管理,质量保证									
	T A				46.24° −1. ET 4E 222		/T T 4/2 12 2		
	任务		◎ 总成型里程碑	♦	非活动里程碑		仅开始时间		
	关键任务 里程碑	<u> </u>	■ 总成型进度 歩公		非活动摘要	⇒	仅完成时间 外部任务	\rightarrow	
HH 0000 F10 H 00 H	生性牌 摘要	<u> </u>	拆分 ▶ 外部任务		手动任务 仅工期	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	摘安 总成型任务	¥	✓ 介部任务 ■ 项目摘要		以工知 手动摘要总成	♦	グド部 生 柱 峰 进 度		
	心成至任另 总成型关键任务		■ 分组标题	· · ·	手动摘要	•	ML/X		
				第 16 页					


资源名称		19 六月 2 日 六	五 四 三	2019 六月 30 二 一		2019 七月 28 五 四 三	= -	2019 八月 25 日 六	五
配置管理		П Л	ш рд		П //	77 54		Н /	<u> </u>
配置管理									
项目经理,需求,测试,设计,质量保证 高级编码	E主管,								
项目经理									
项目经理									
EPG, 编码, 测试, 配置管理, 设计, 项目需求, 质量保证	经理,								
项目经理 EPG									
DI O									
配置管理									
配置管理									
配置管理 配置管理									
配置管理									
需求									
设计									
编码 测试									
质量保证									
质量保证 质量保证									
质量保证									
	任务		总成型里程碑	♦	非活动里程碑		仅开始时间		
	关键任务		心,从土,还,久		非活动摘要			_	
项目: PI Plan V1.1 日期: 2023年10月30日	里程碑	•	拆分		手动任务	\Diamond	外部任务	♦	
口朔. 2023年10月30日	摘要		→ 外部任务		仅工期				
	总成型任务	2	■■■		手动摘要总成	*	进度		
	总成型关键任务	Ĭ L	分组标题		手动摘要	•			
				第 17 页					


	[日	月 2	五.	四 =	2019 六月 三 二	30	日 六	20 ±	019 七月	28 <u> </u> 三	=	_	2019 E	9 八月 2	25 六	Ŧi
量保证		Н			<u> </u>			Ц / /		T K	<u> </u>			<u> </u>	1 /	/\	
〔 同组成员																	
所目组成员 所目组成员																	
頁 目组成员																	
页目组成员 5日4日4日																	
近目组成员 近目组成员																	
语组成员 语组成员																	
页目组成员																	
[目组成员																	
[日组成员																	
	任务				总成型里程	碑 ◇		非活动里看	建碑			□ 仅开	始时间	_			•
	任务				总成型里程 总成型进度	碑 ◇		非活动里程						-			
页目:PI Plan V1.1	关键任务	•			总成型进度			* 非活动摘要	į			1. 仅完月	成时间	•			
	关键任务 里程碑	*			总成型进度 拆分			• 非活动摘要 手动任务	į	\Diamond		1 仅完成 外部位	成时间 任务	↓			
项目:PI Plan V1.1 日期:2023年10月30日	关键任务 里程碑 摘要	*			总成型进度 拆分 外部任务	11111		非活动摘要手动任务仅工期	Î	\langle		(Q完) 外部() 外部(成时间 任务 里程碑	•			
	关键任务 里程碑 摘要 总成型任务	• •			总成型进度 拆分 外部任务 项目摘要	11111		非活动摘要手动任务仅工期手动摘要总	Î	♦		1 仅完成 外部位	成时间 任务 里程碑	▼			
	关键任务 里程碑 摘要	◆ ▼ E务			总成型进度 拆分 外部任务	11111		非活动摘要手动任务仅工期	Î	\langle		(Q完) 外部() 外部(成时间 任务 里程碑	•			-

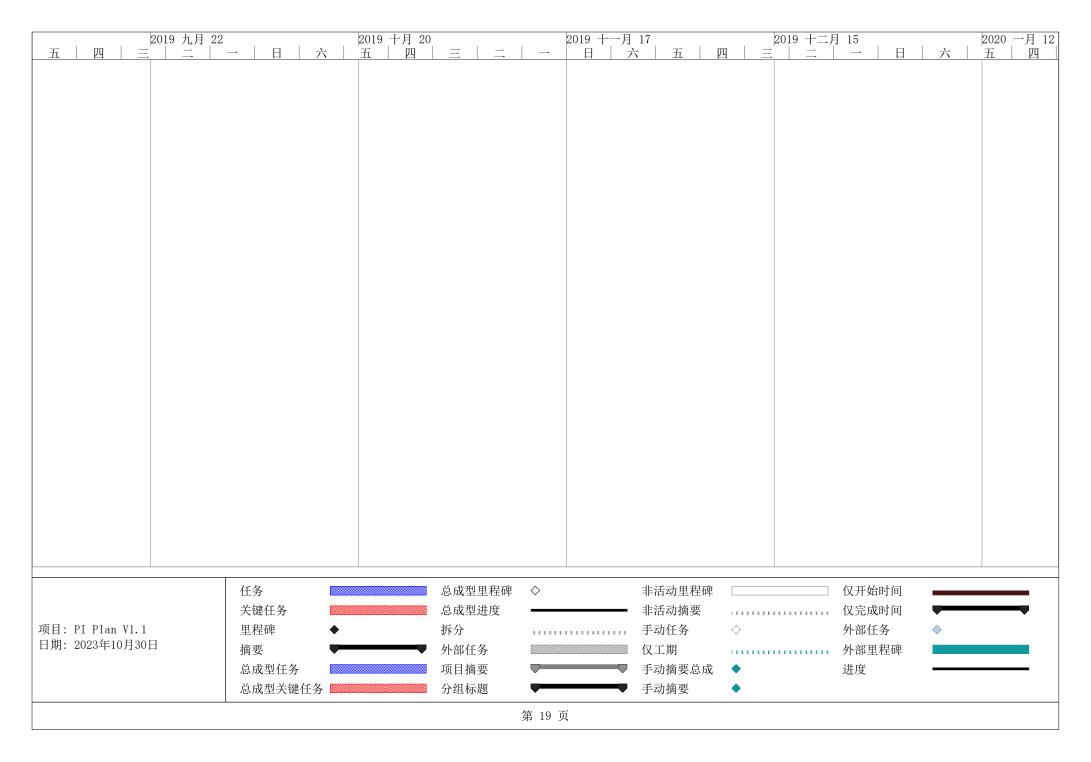


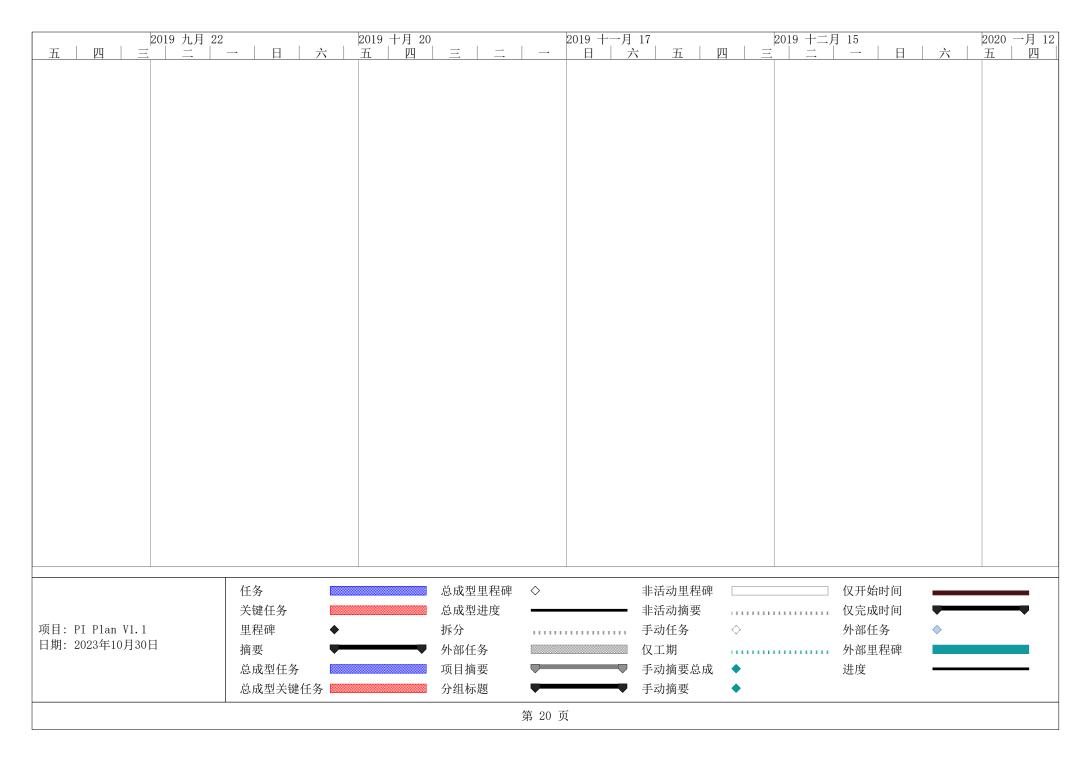


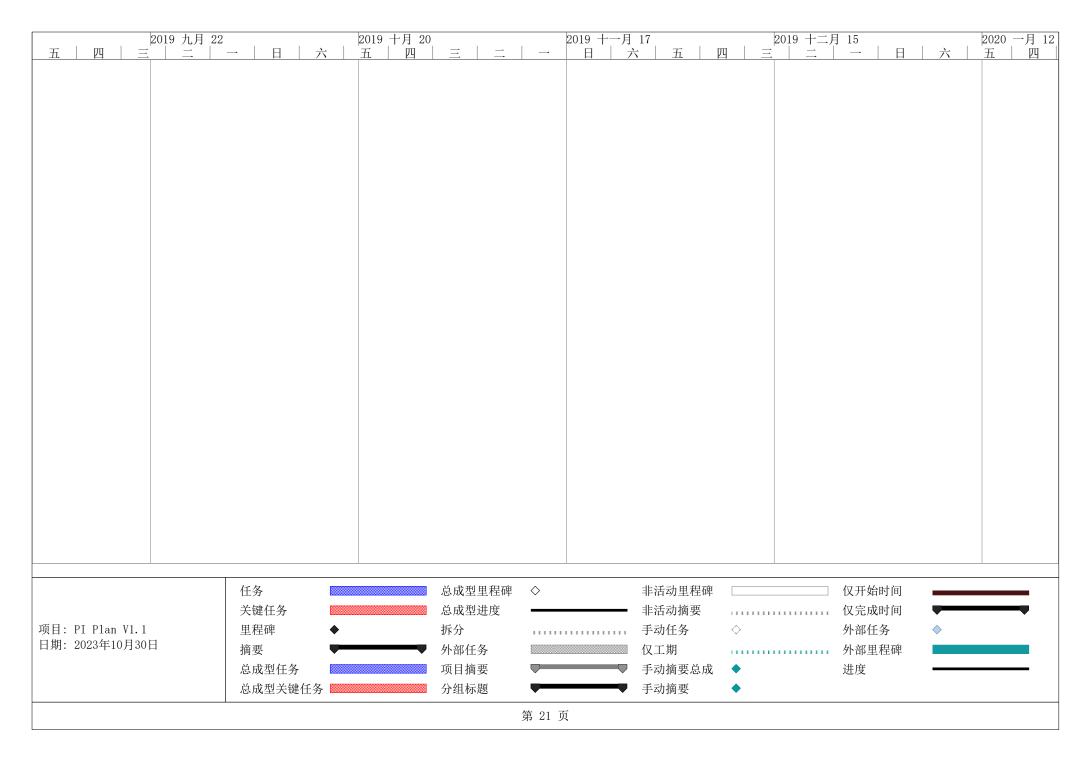


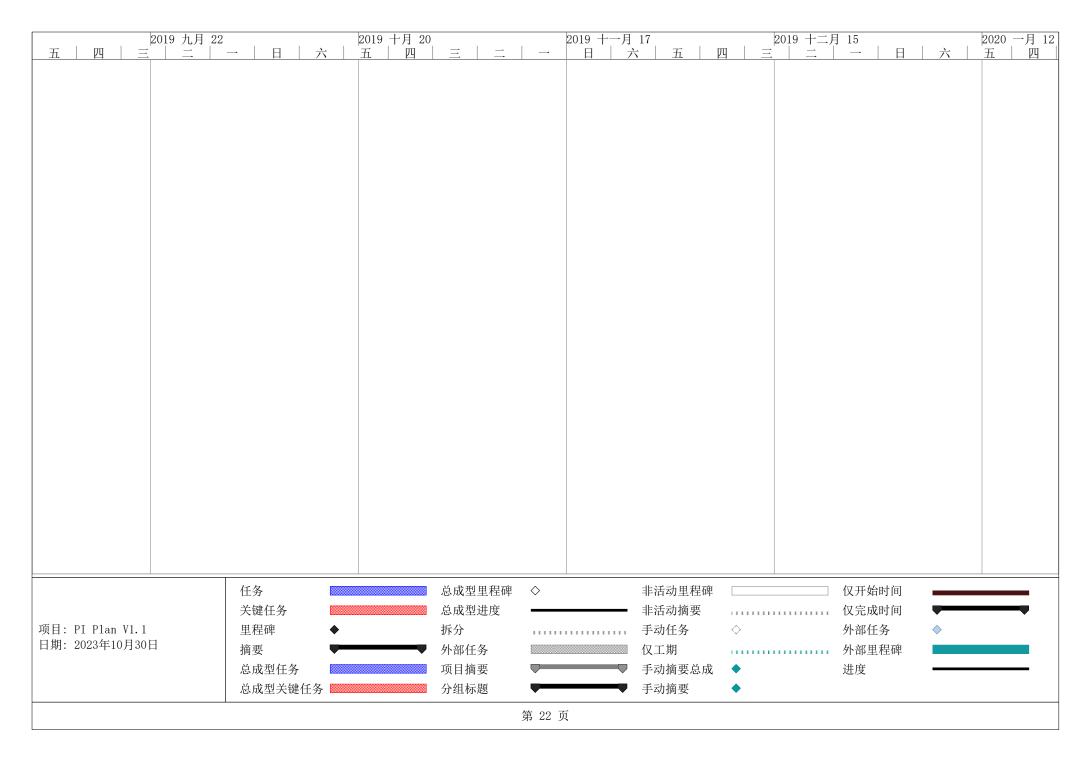


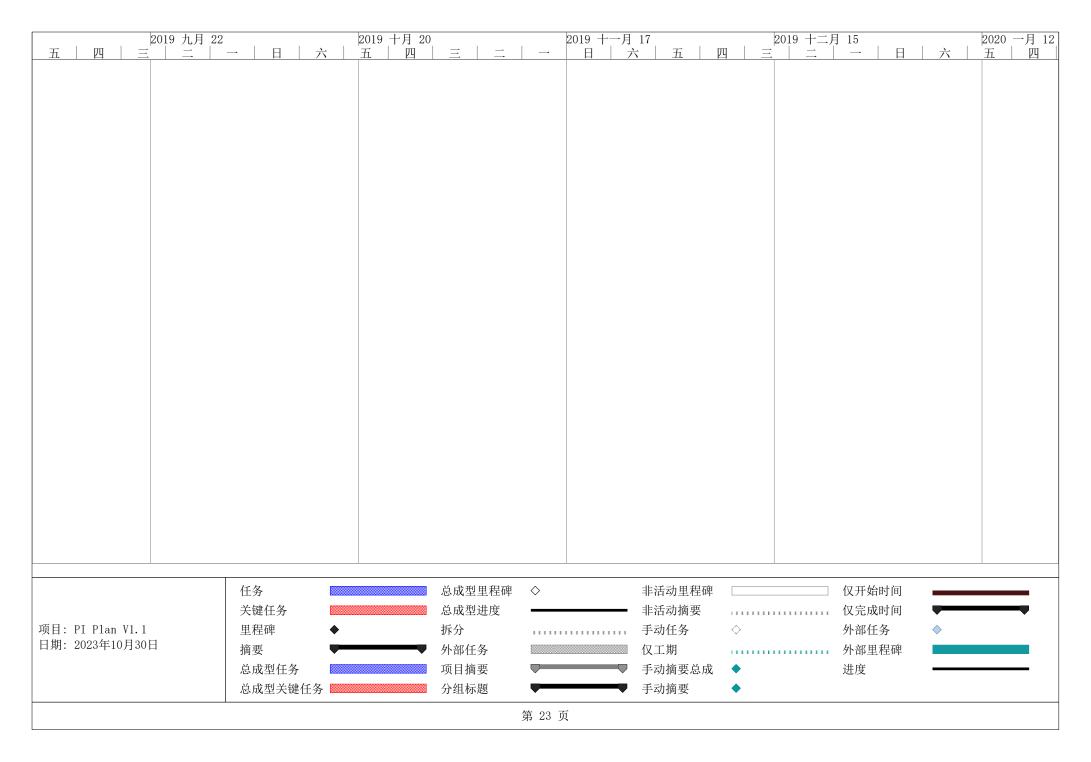


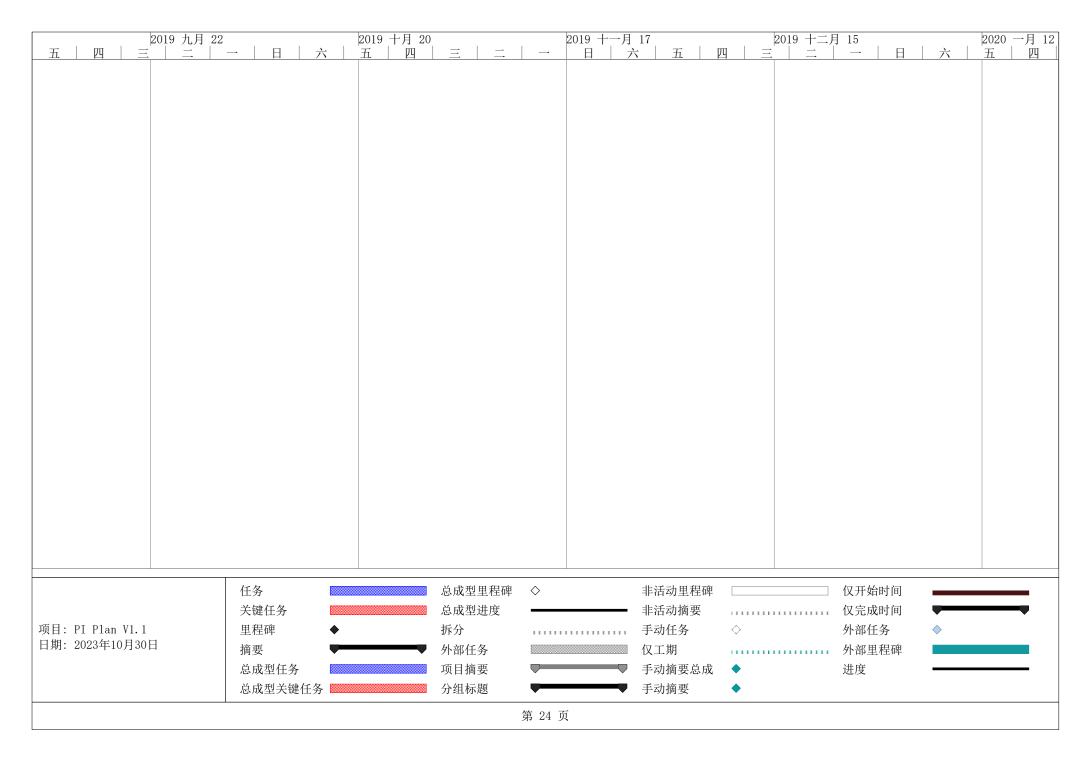


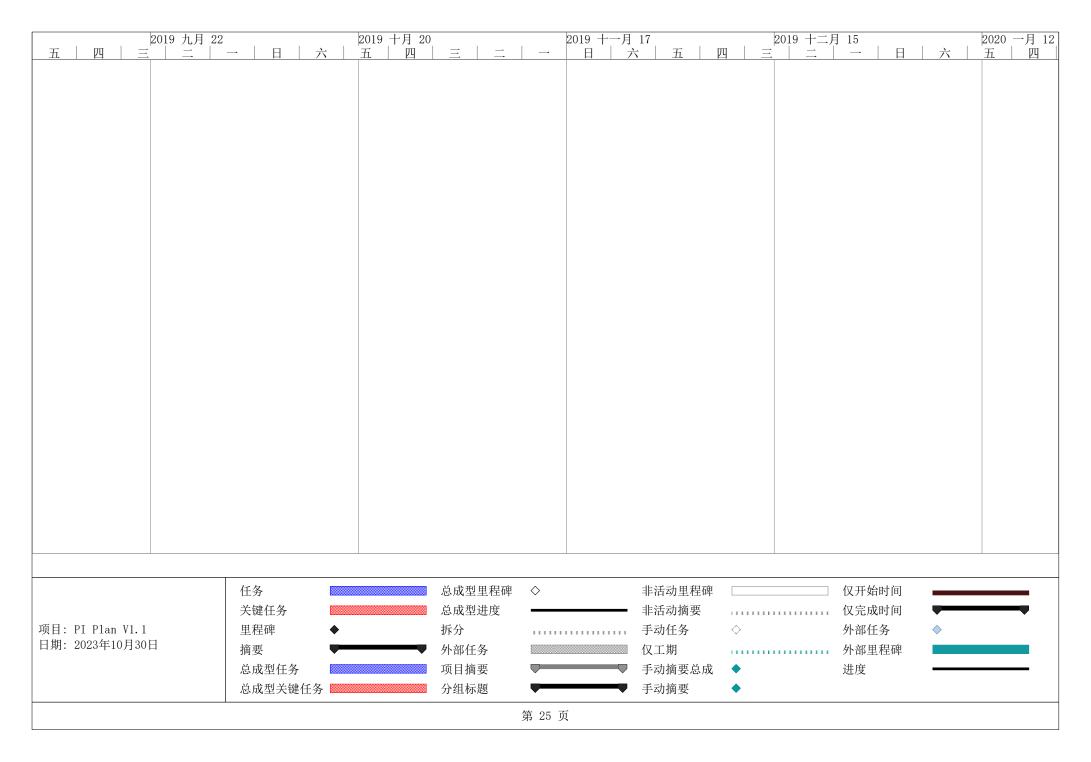


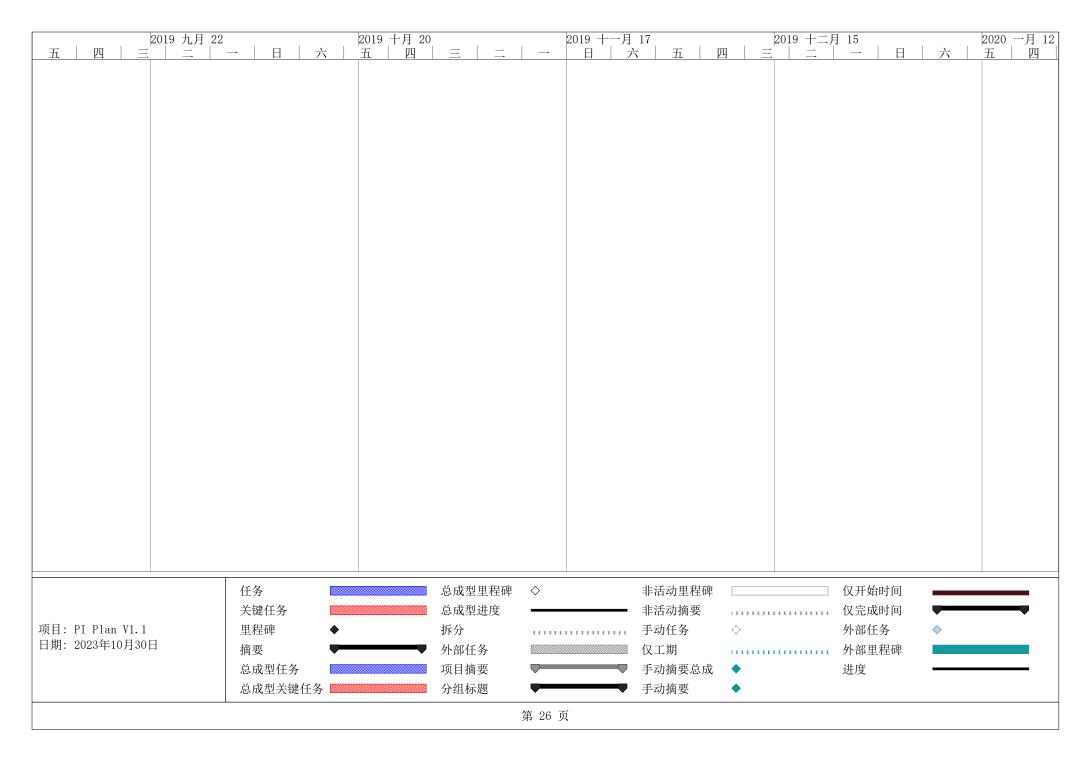


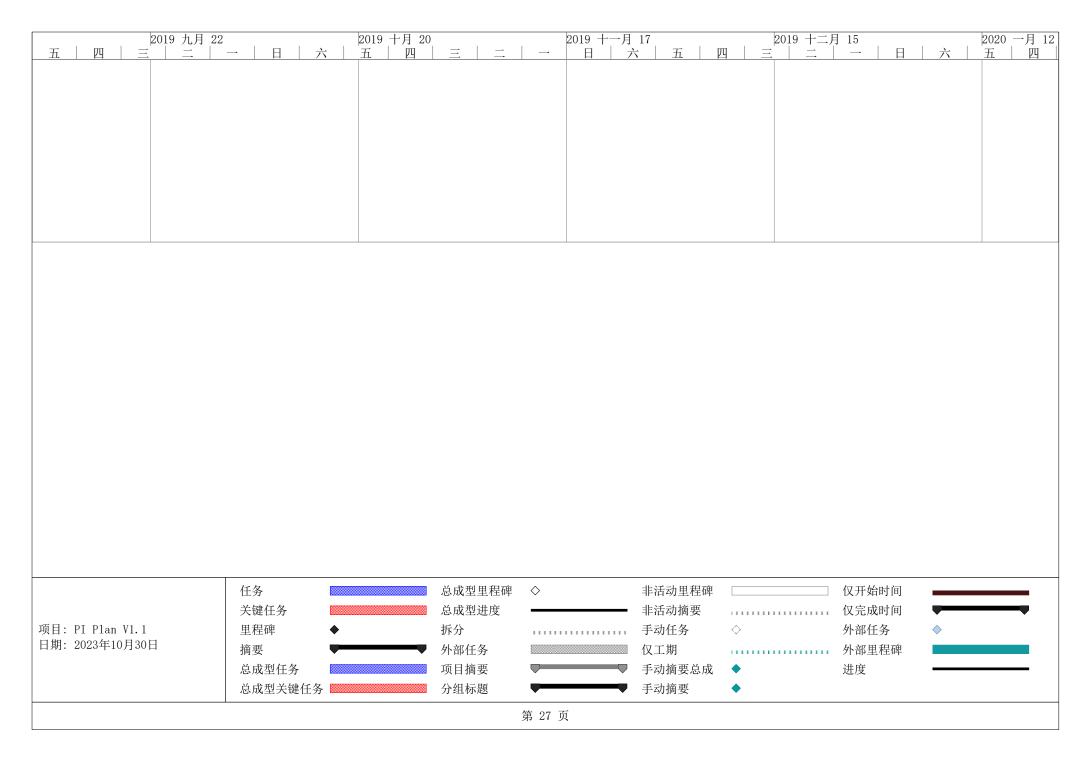


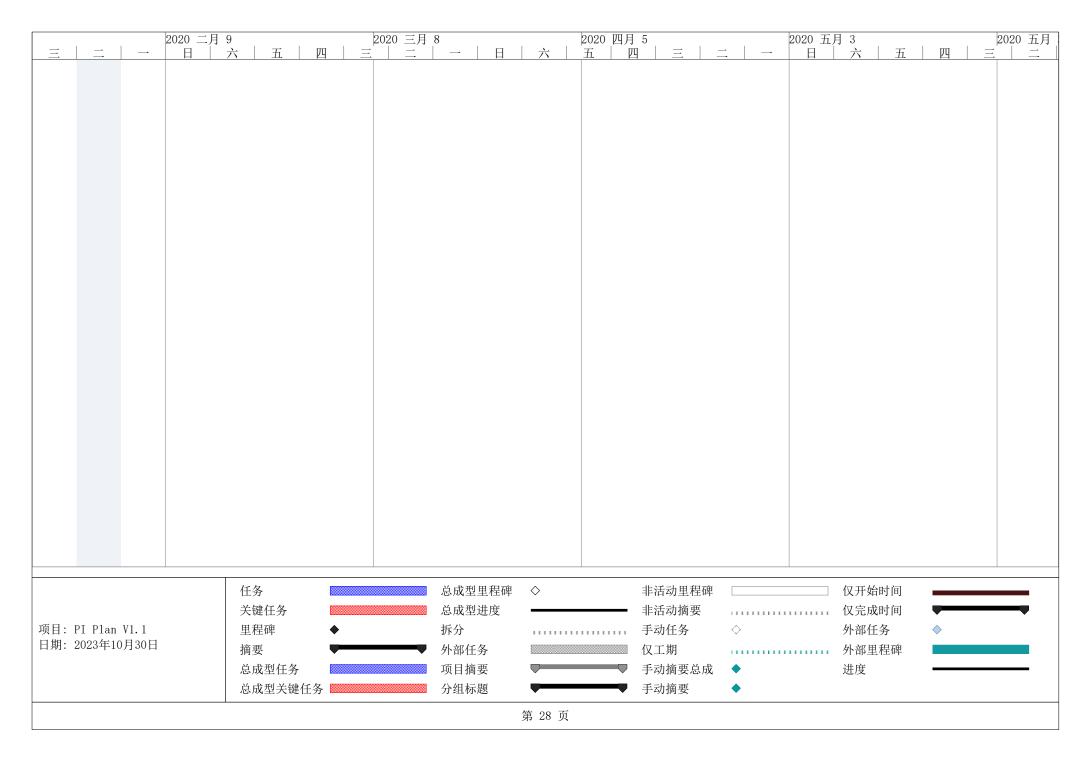


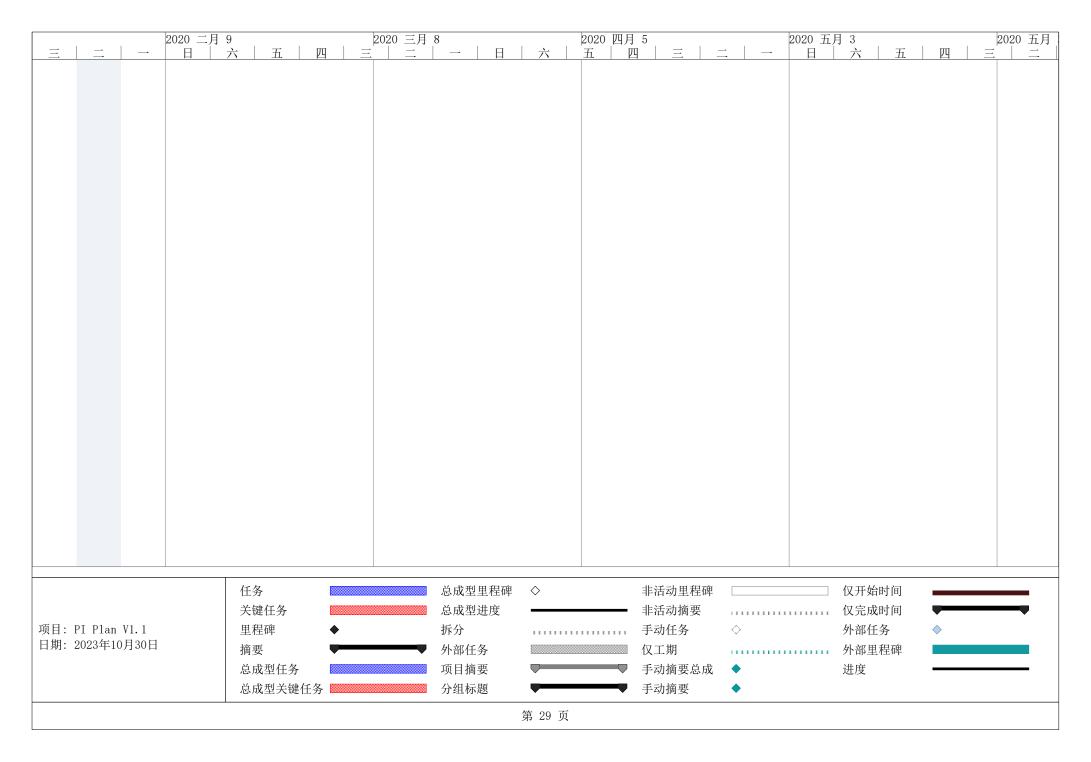


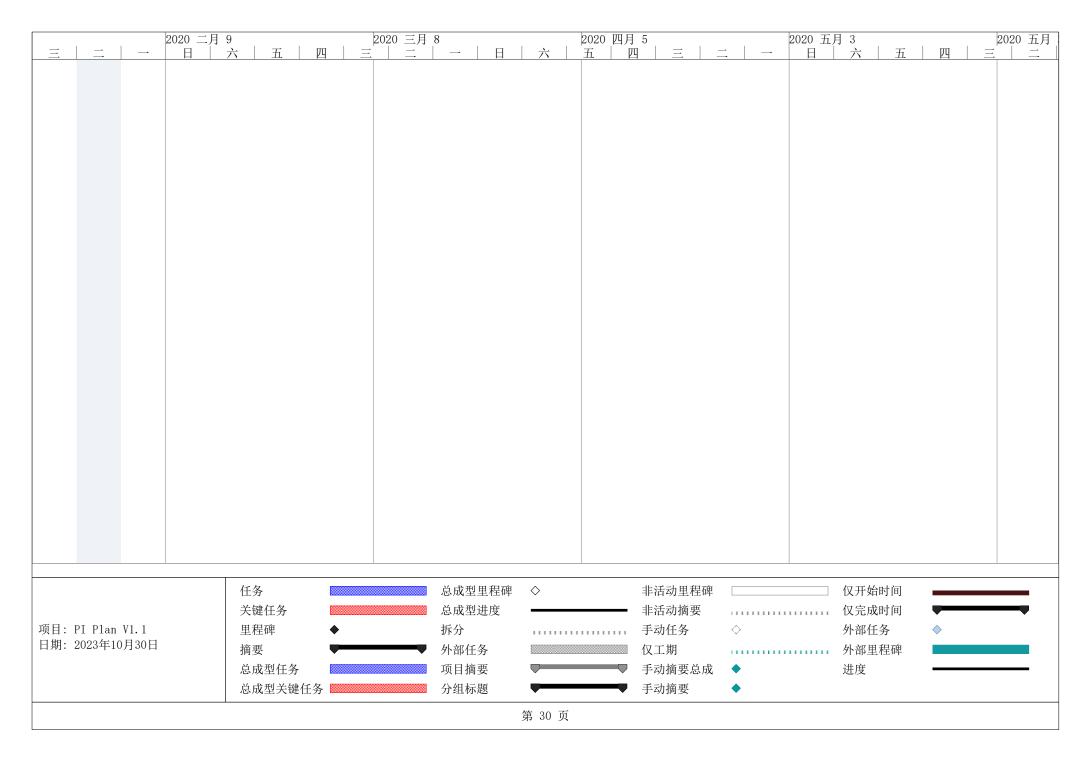


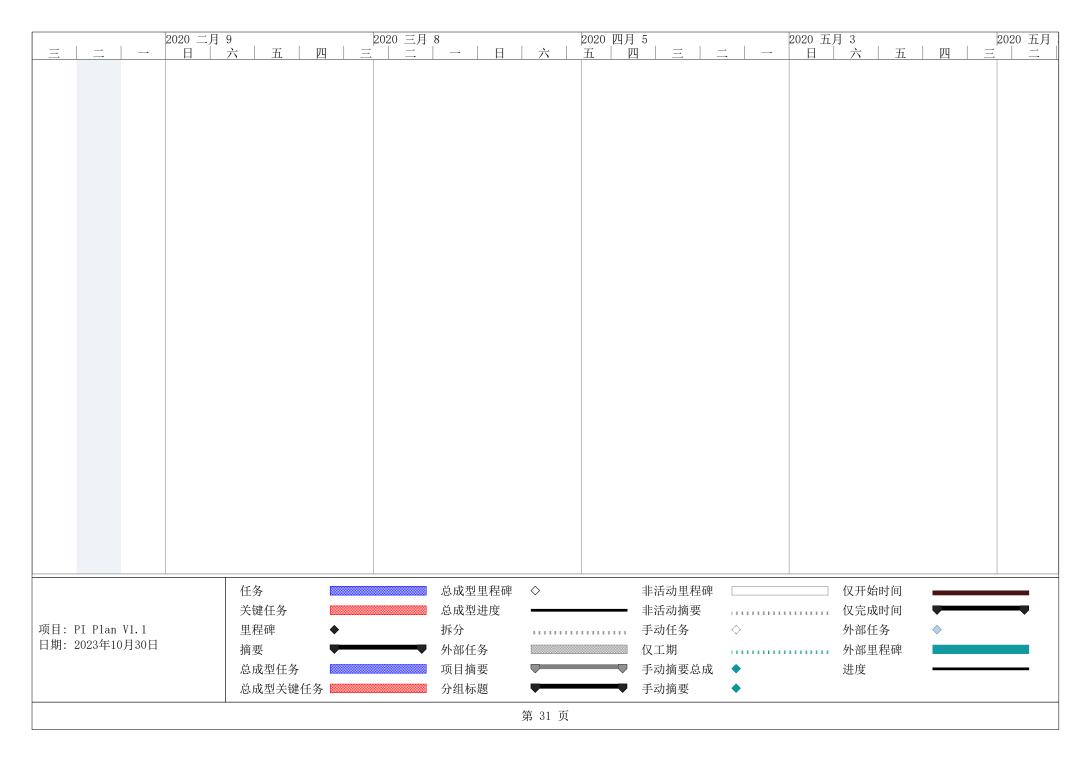


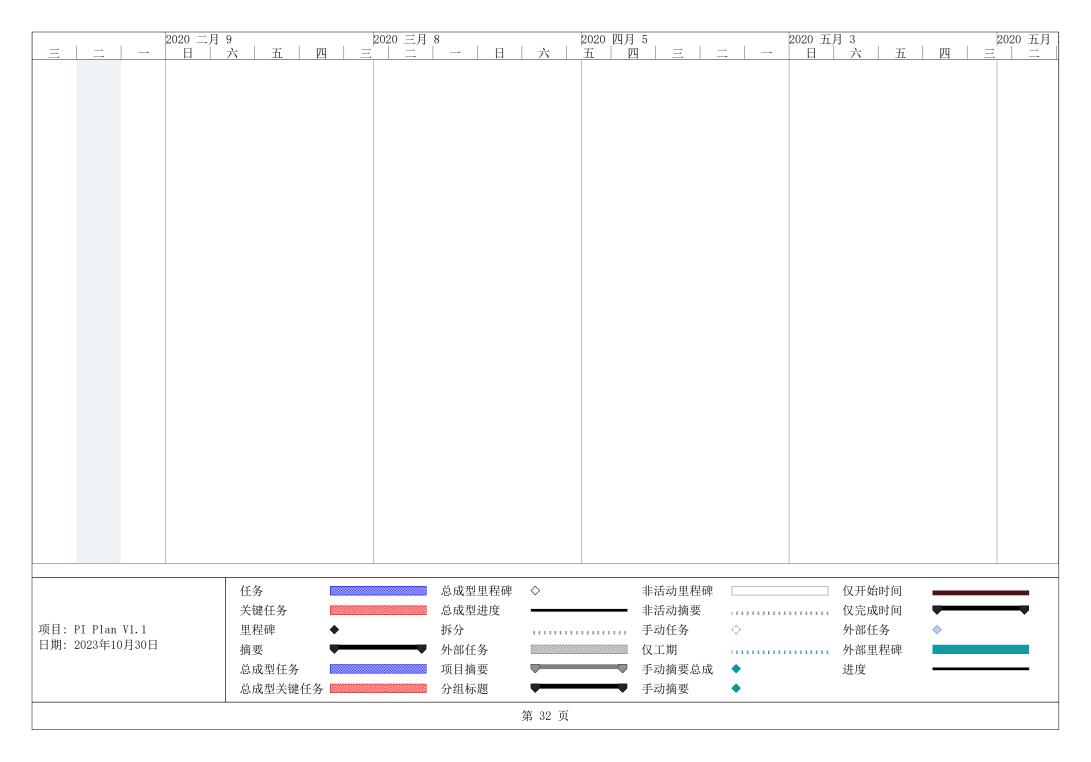


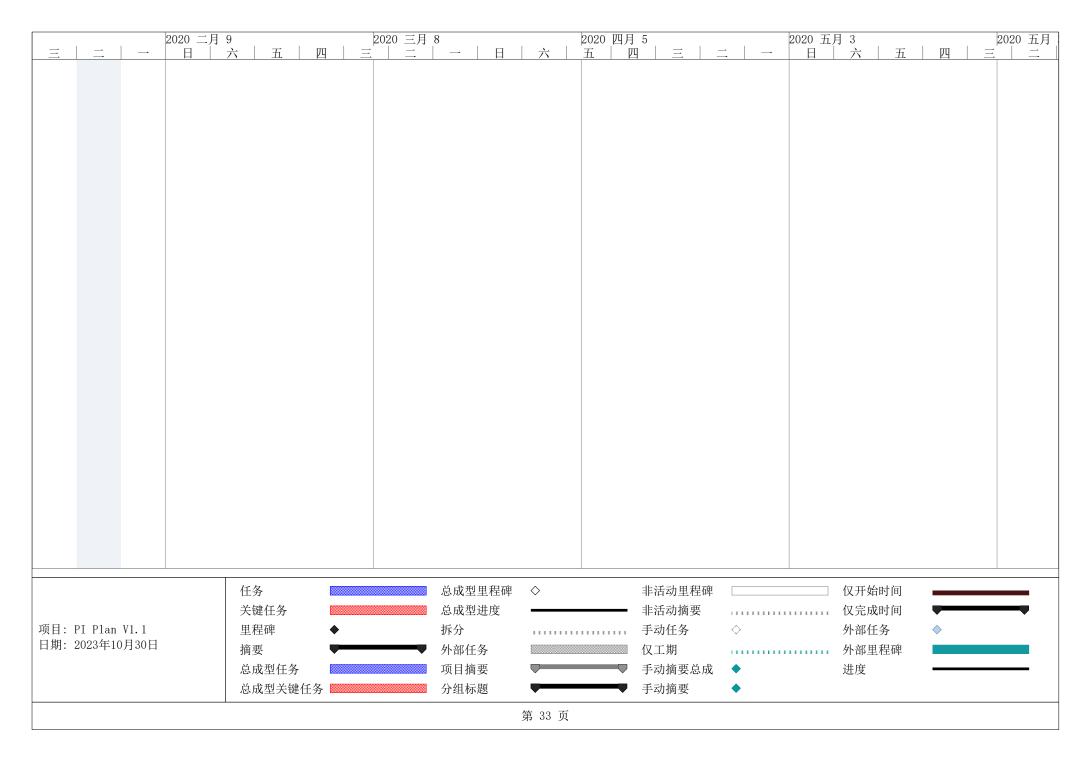


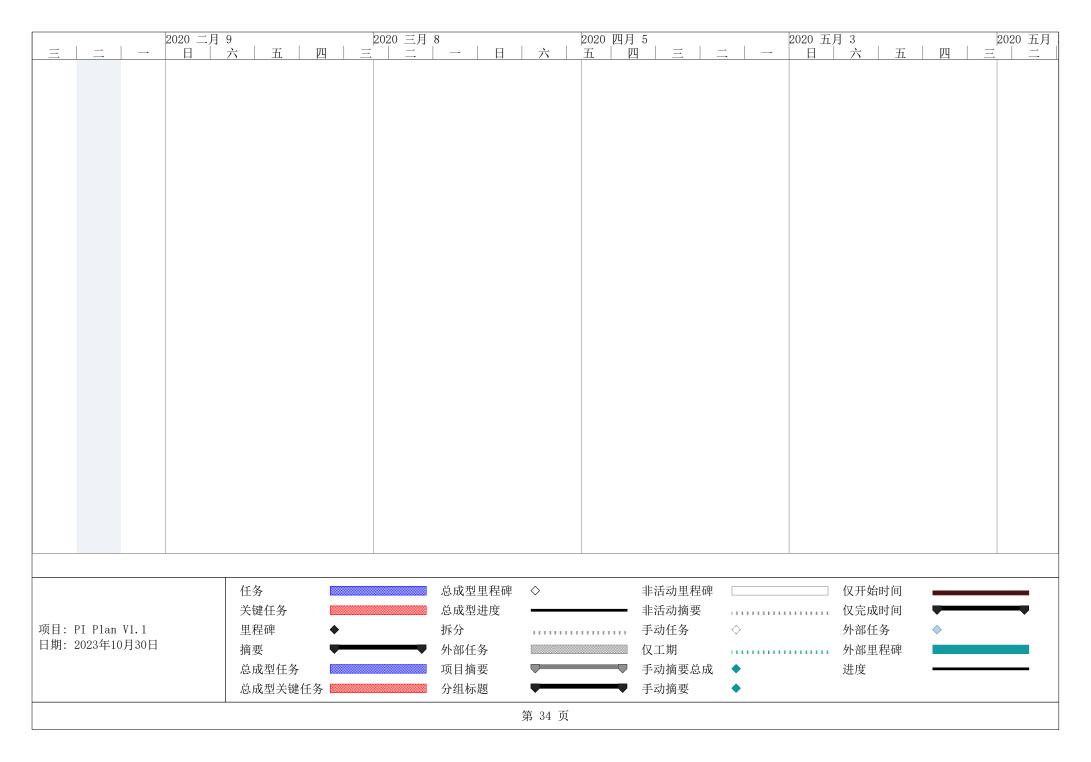


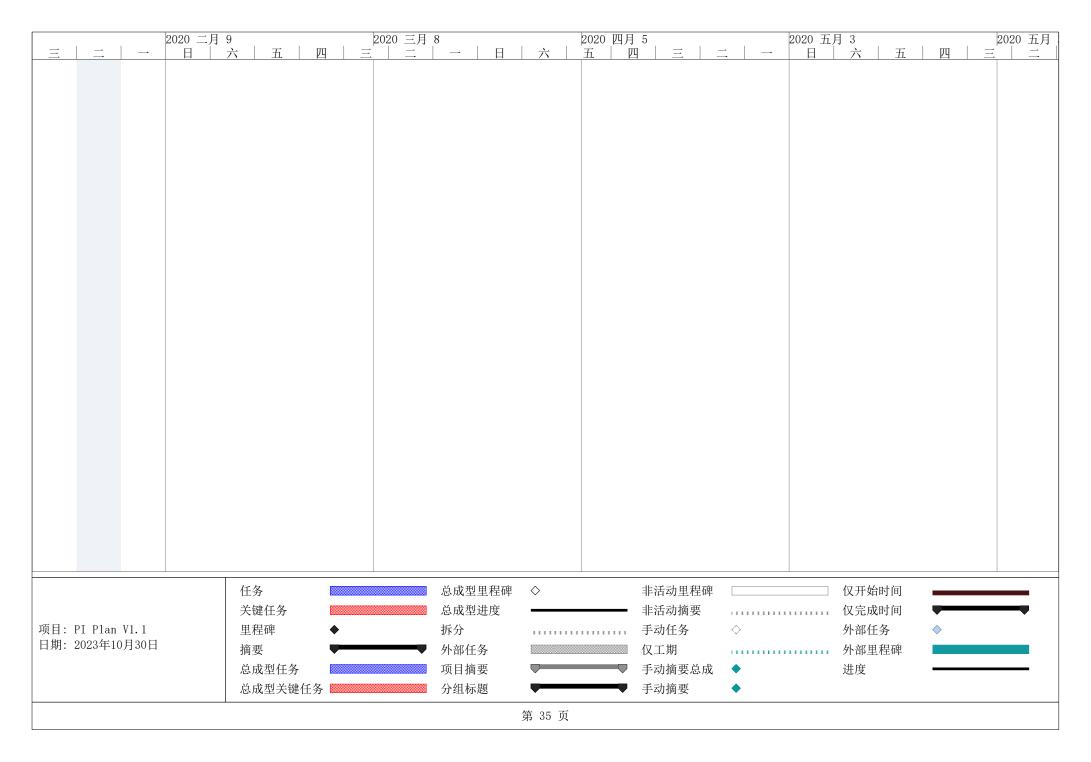


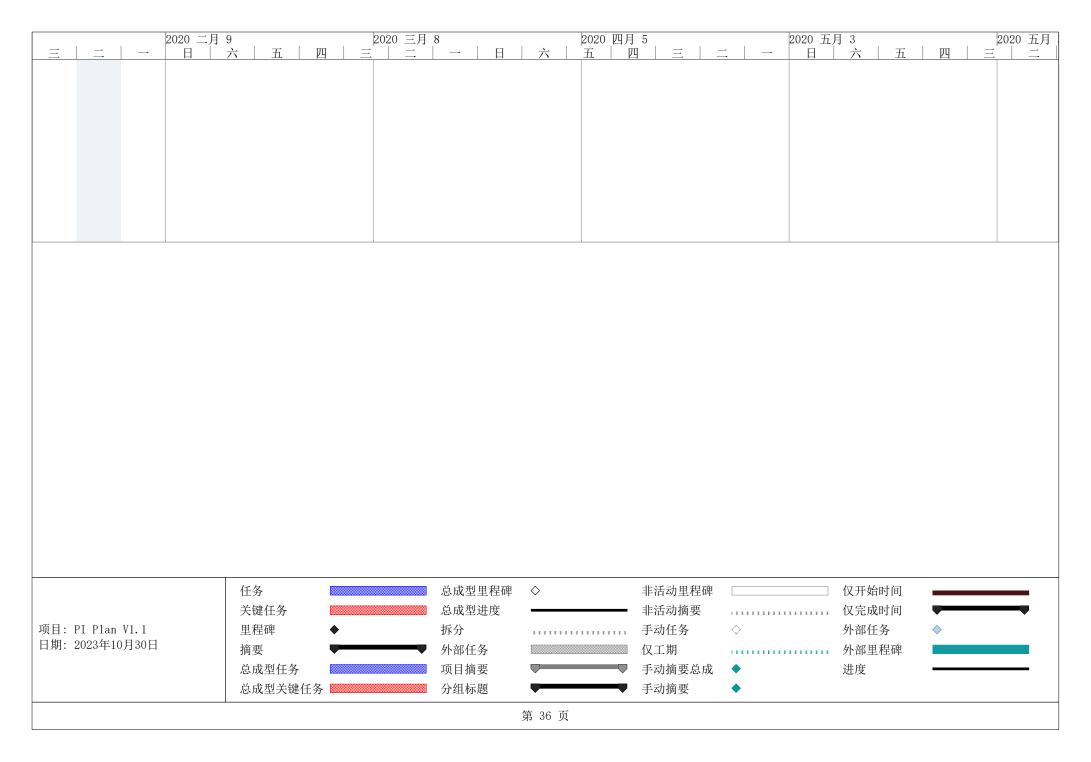


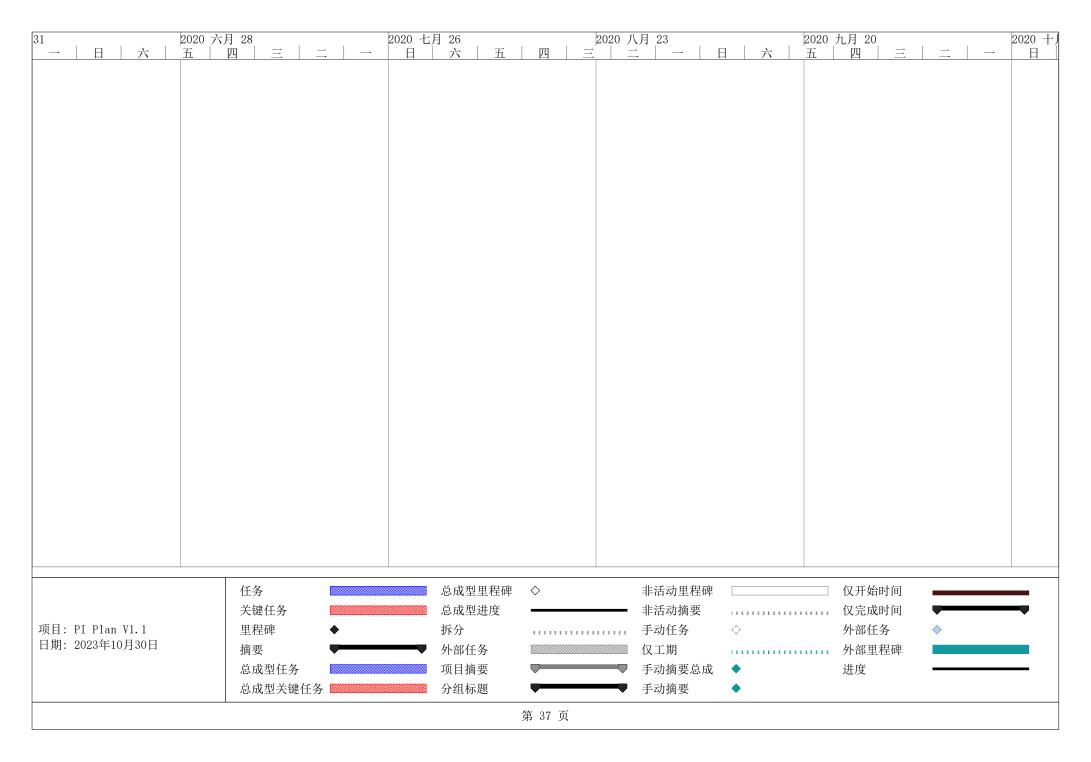


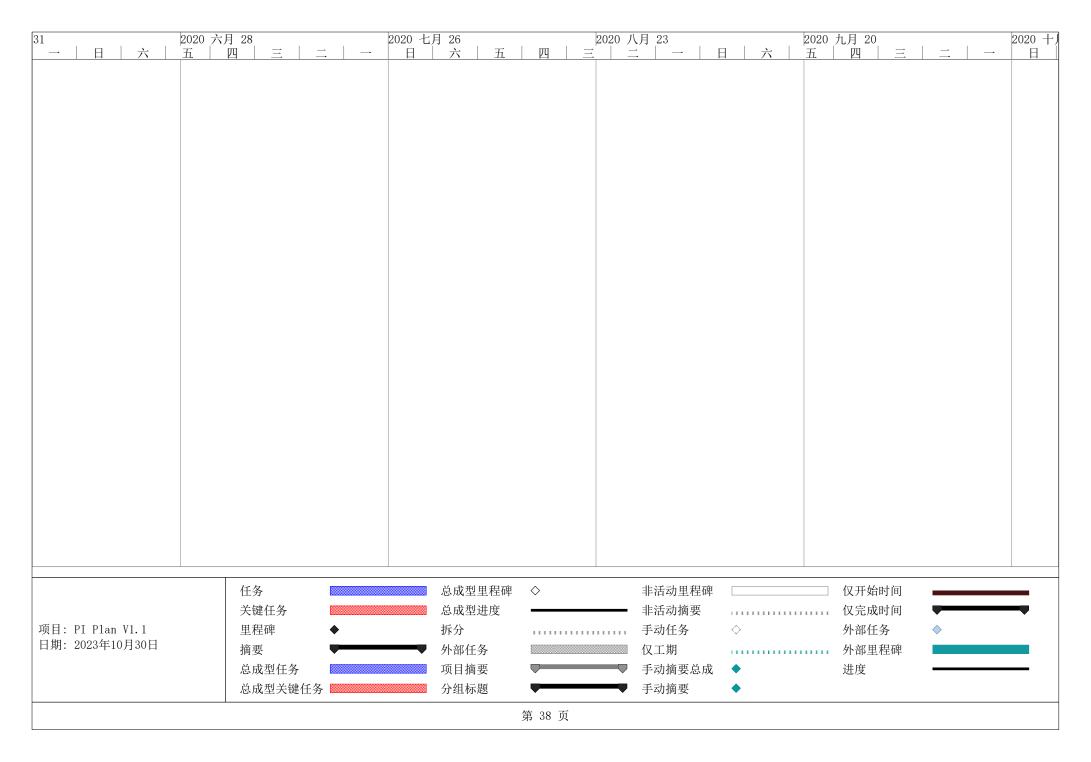


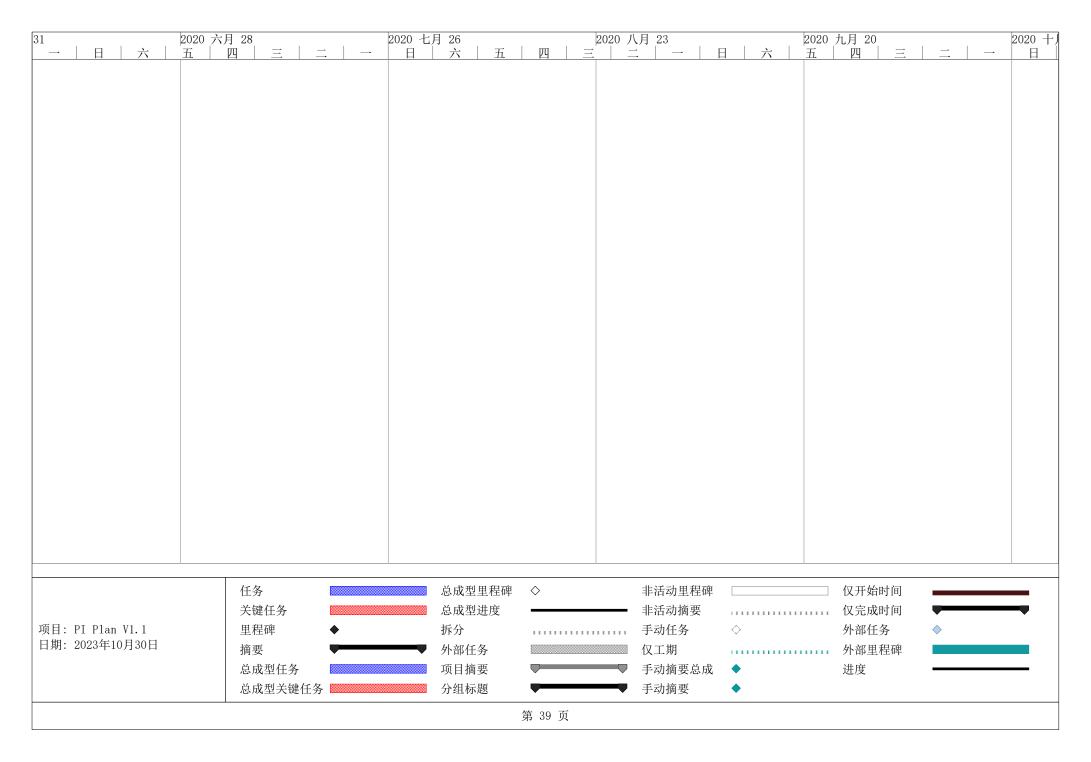


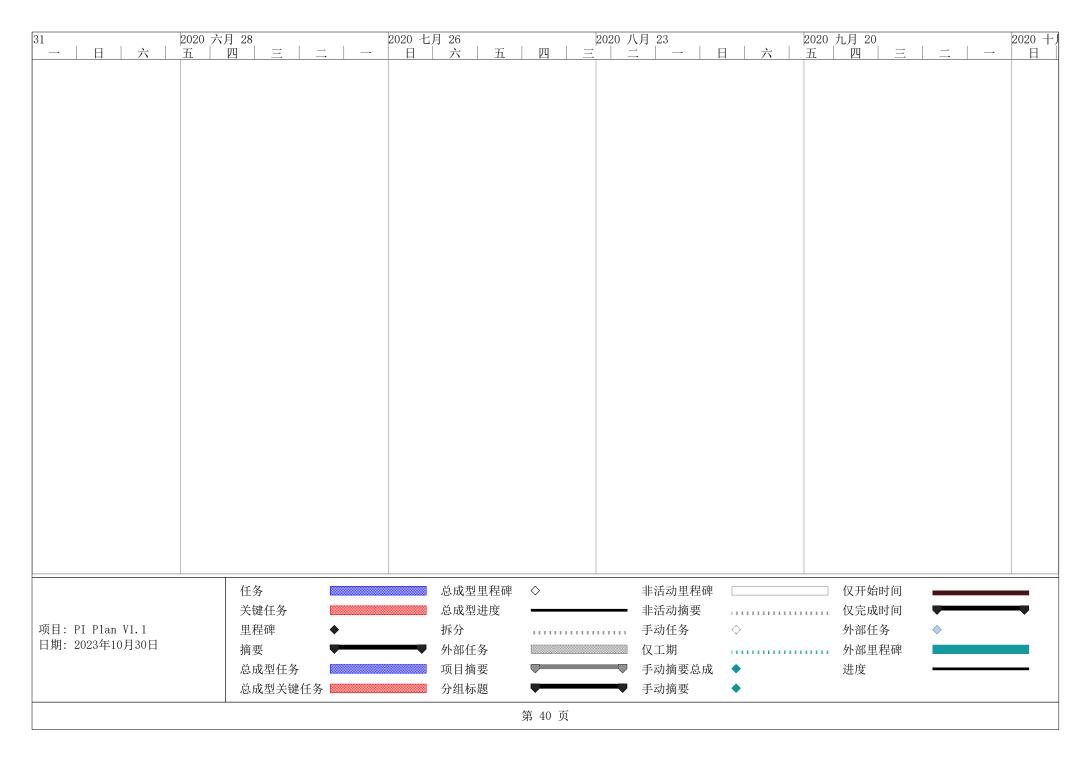


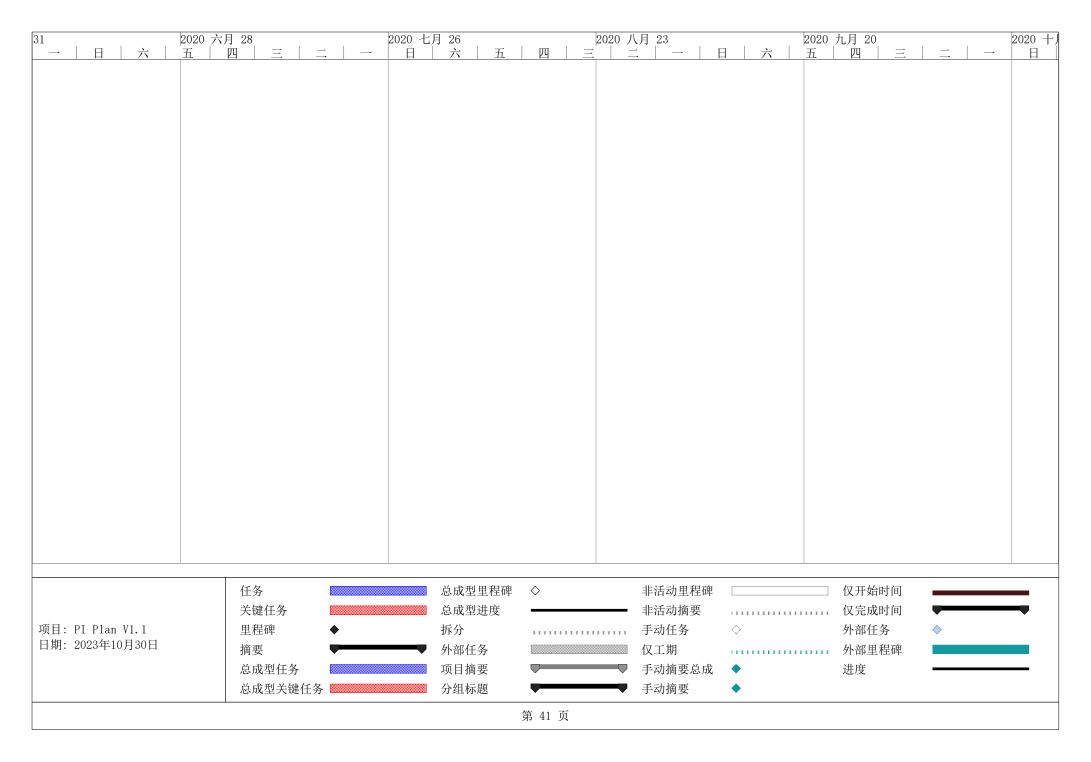


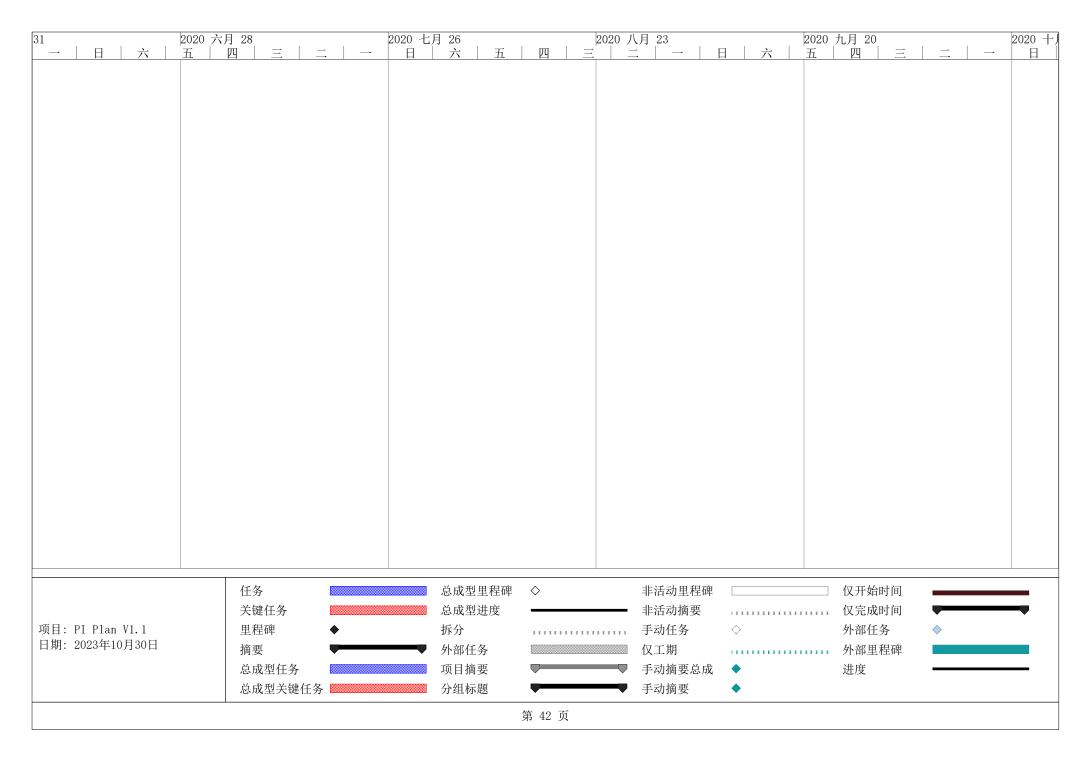


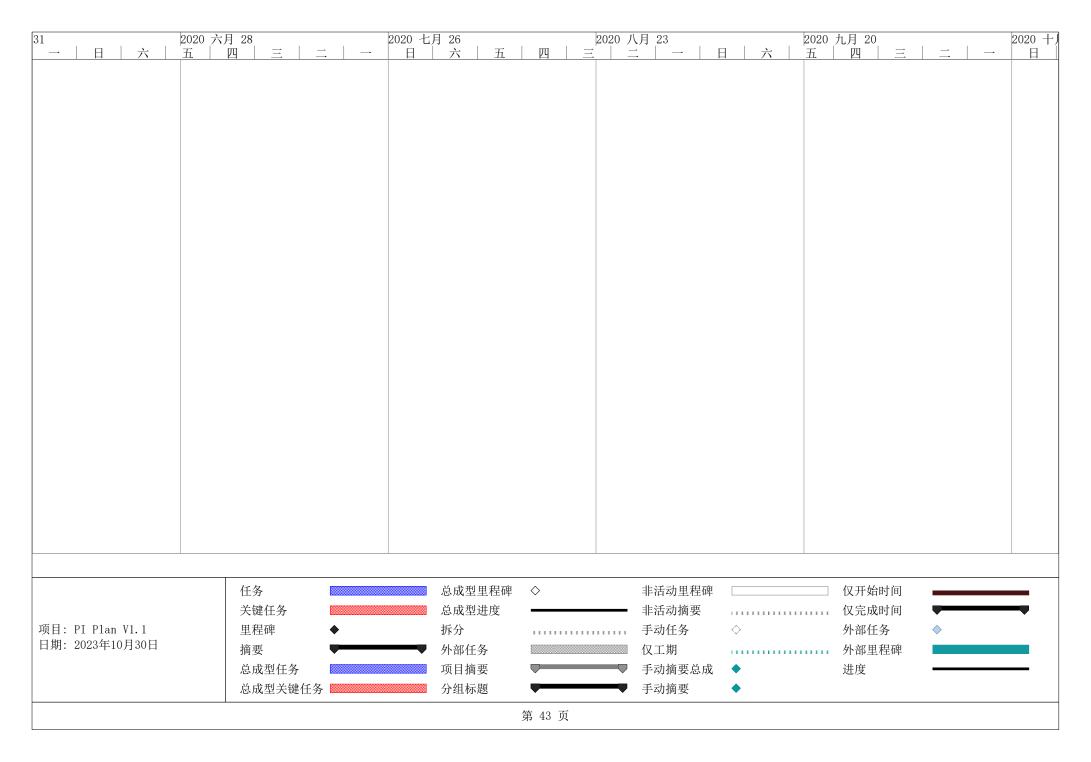


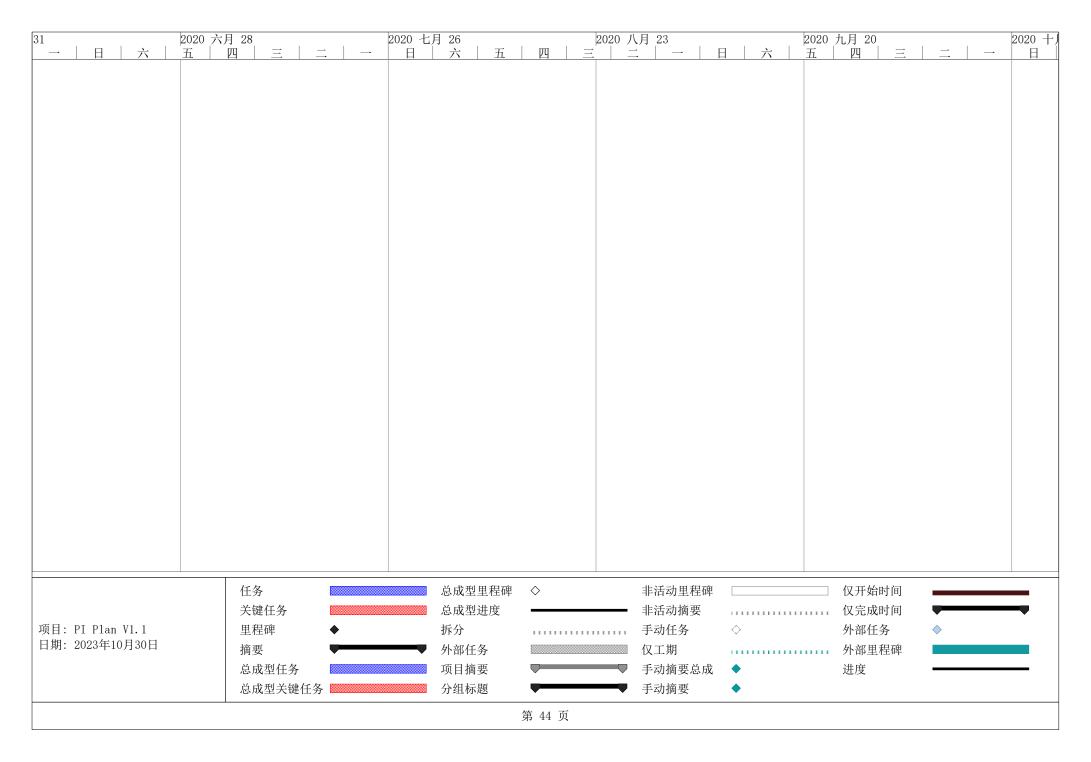


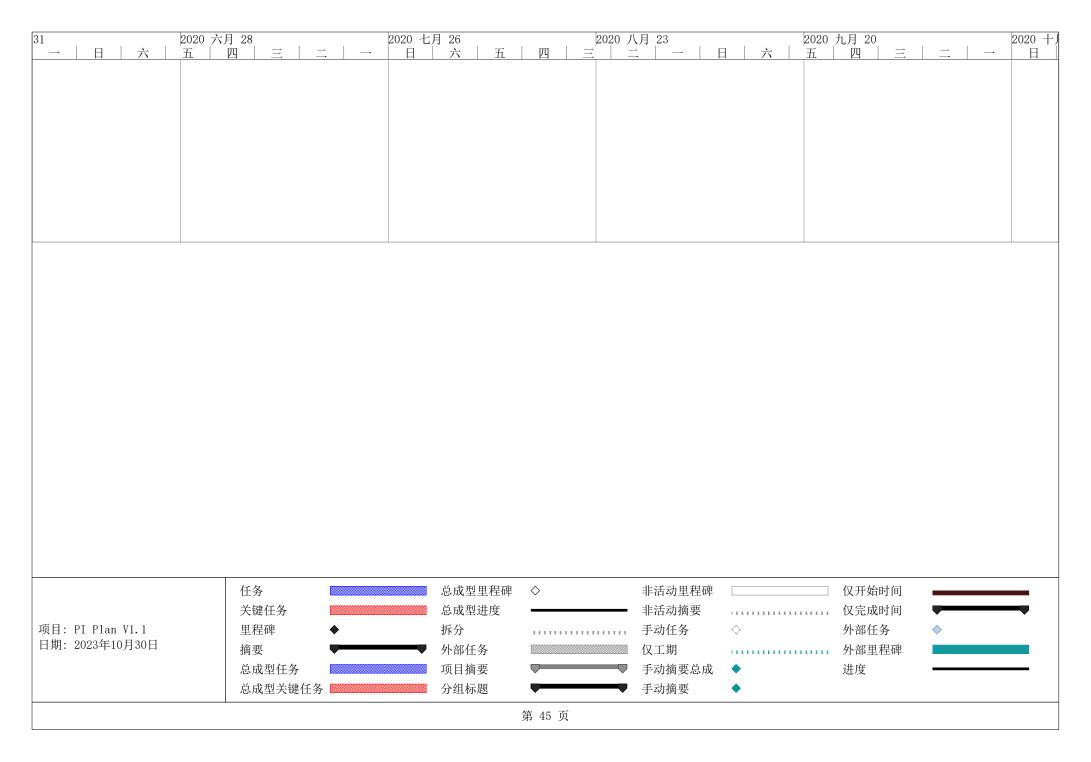


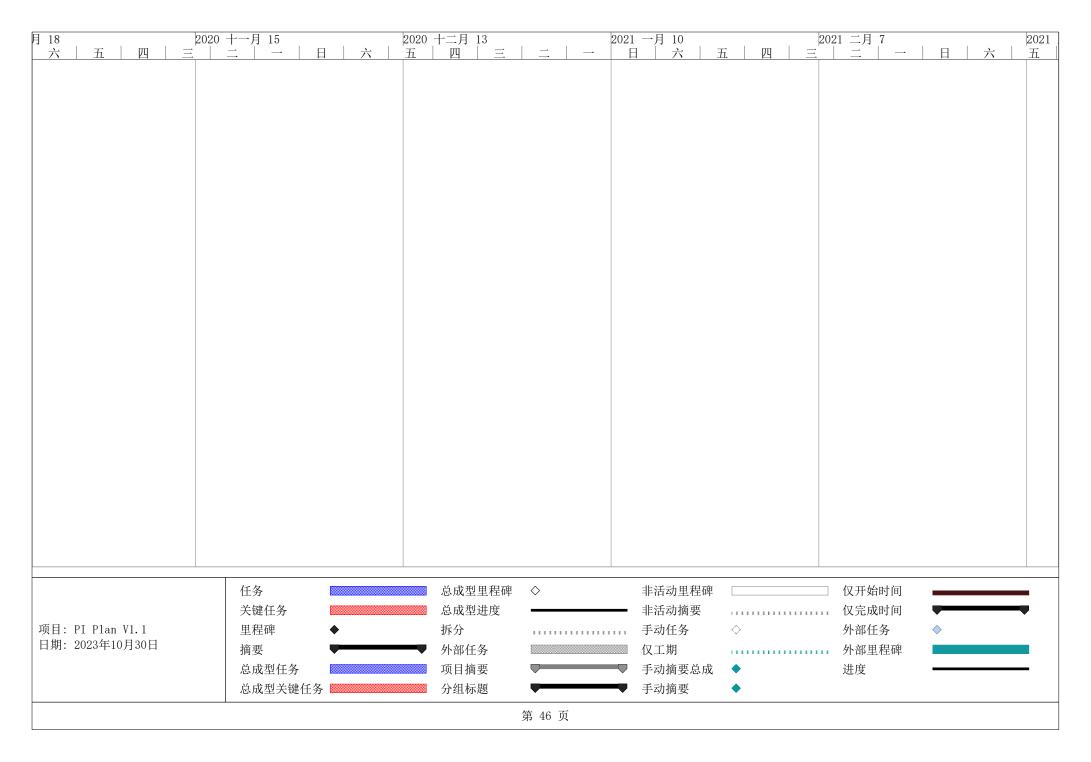


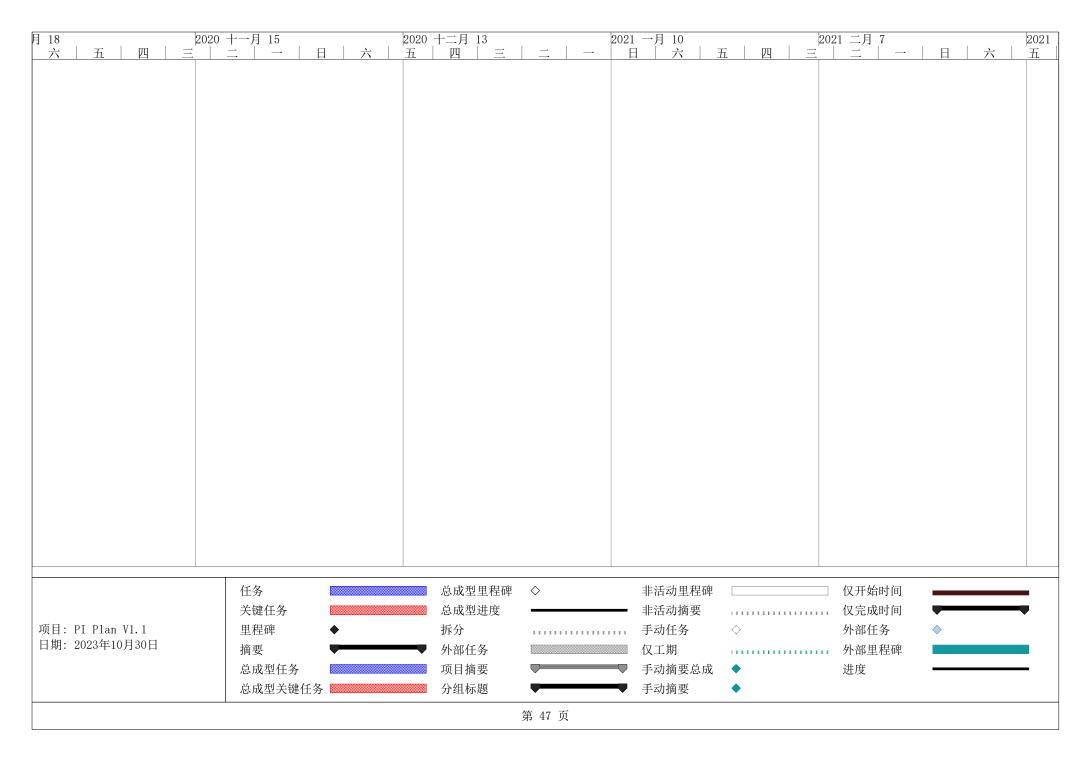


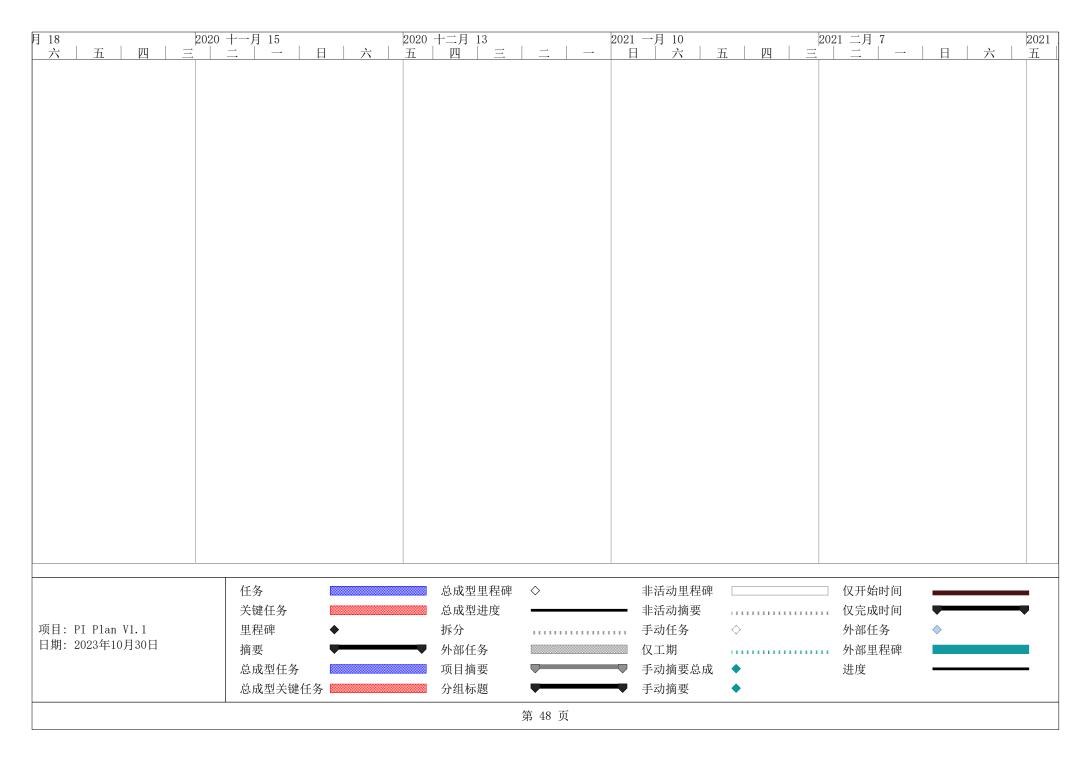


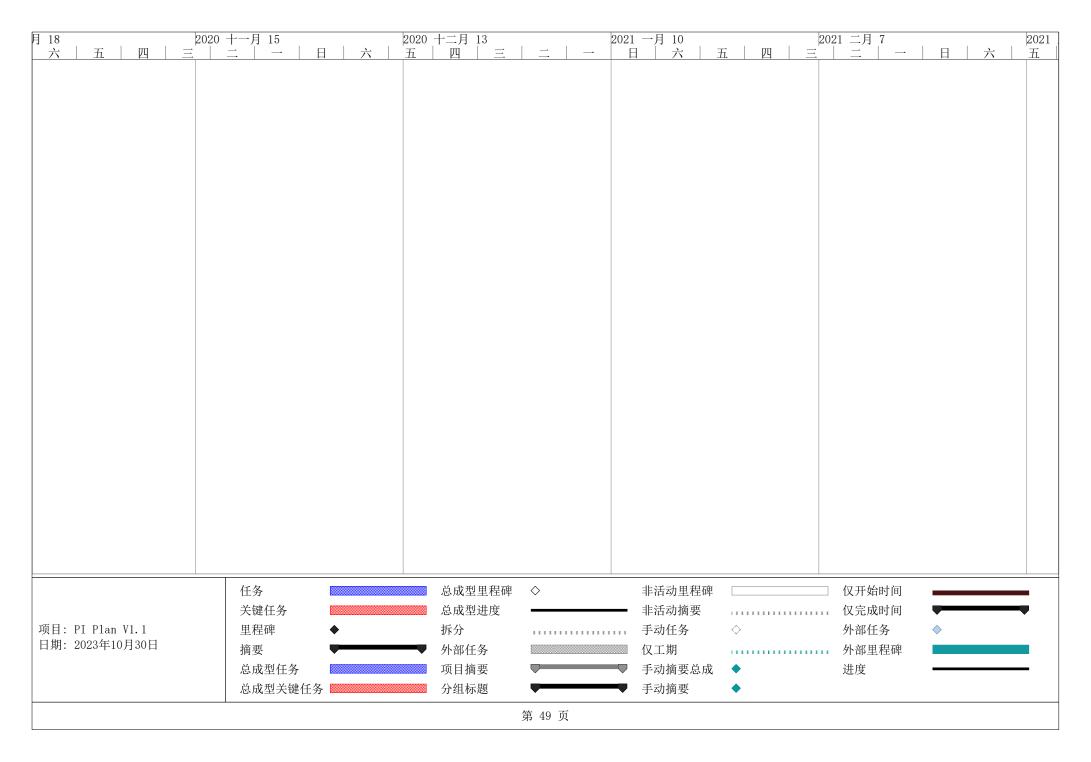


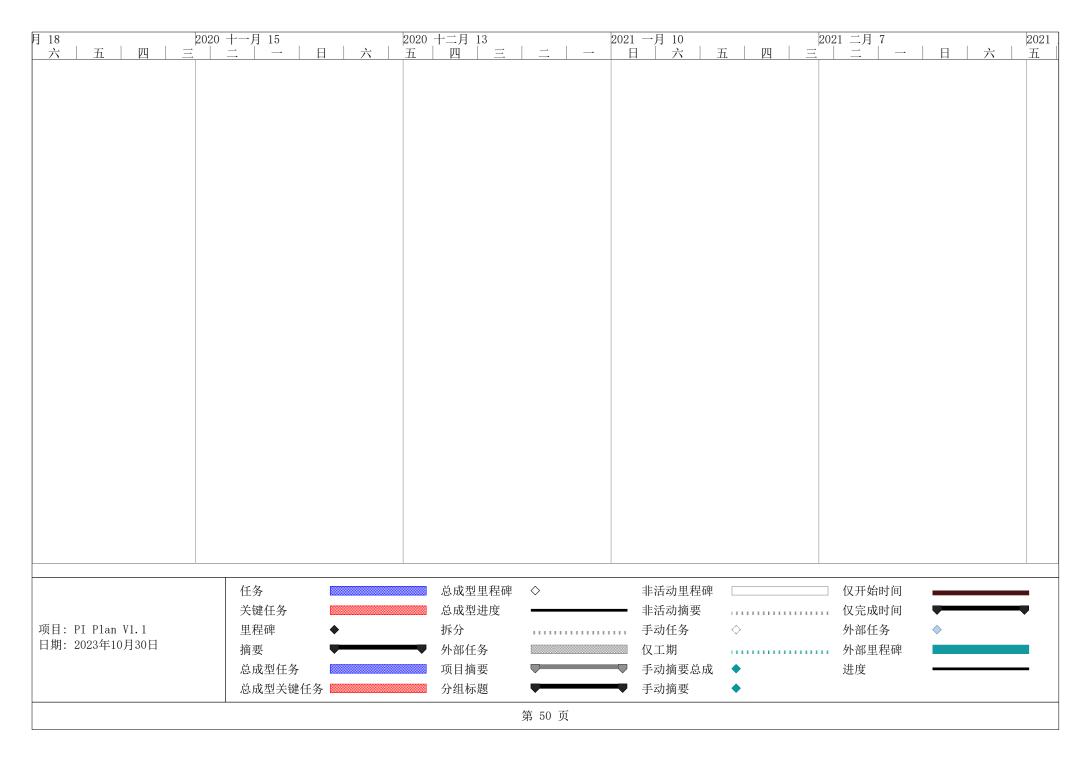


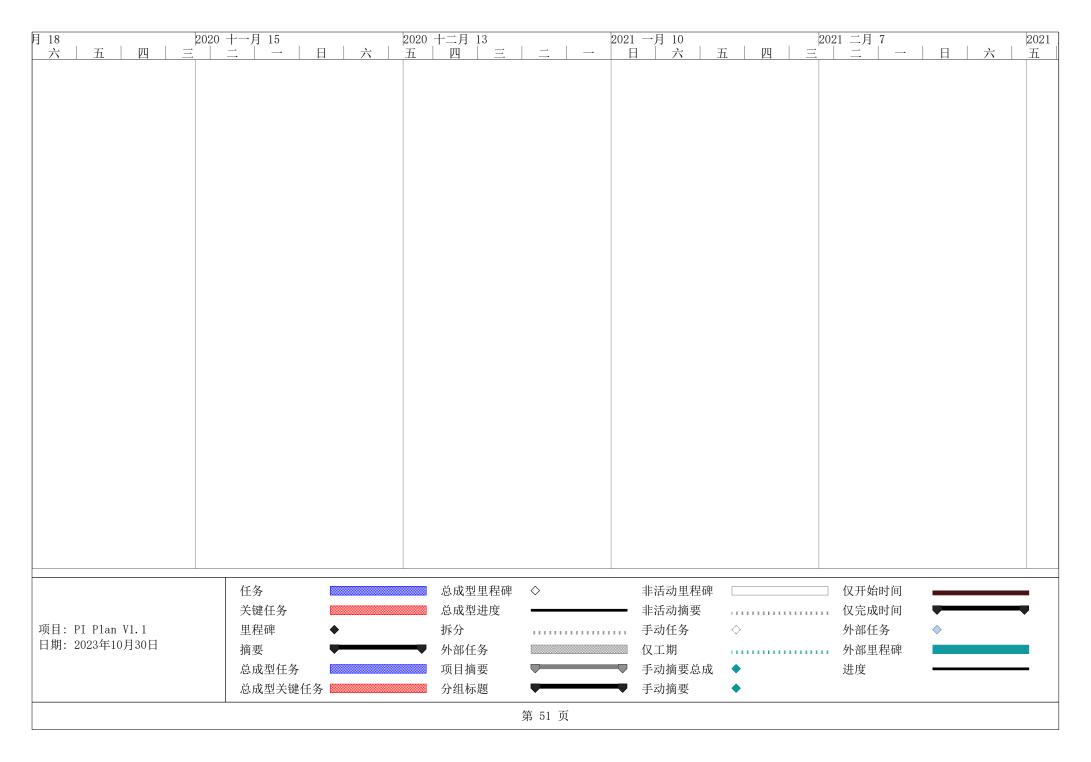


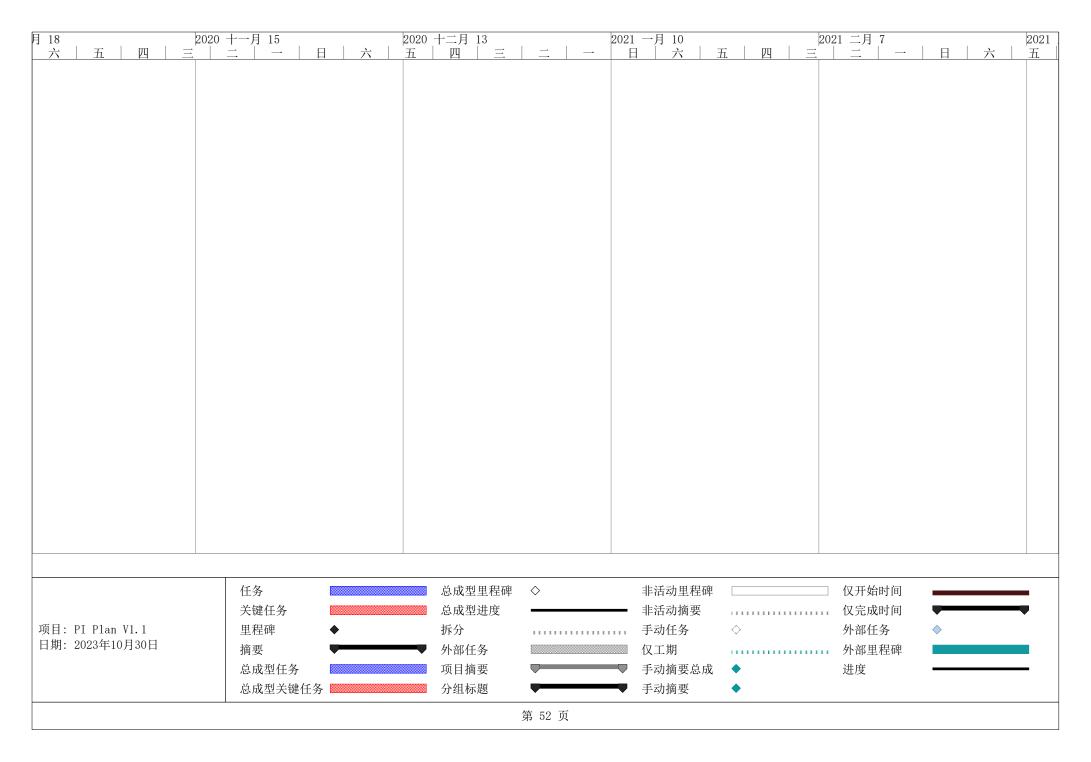


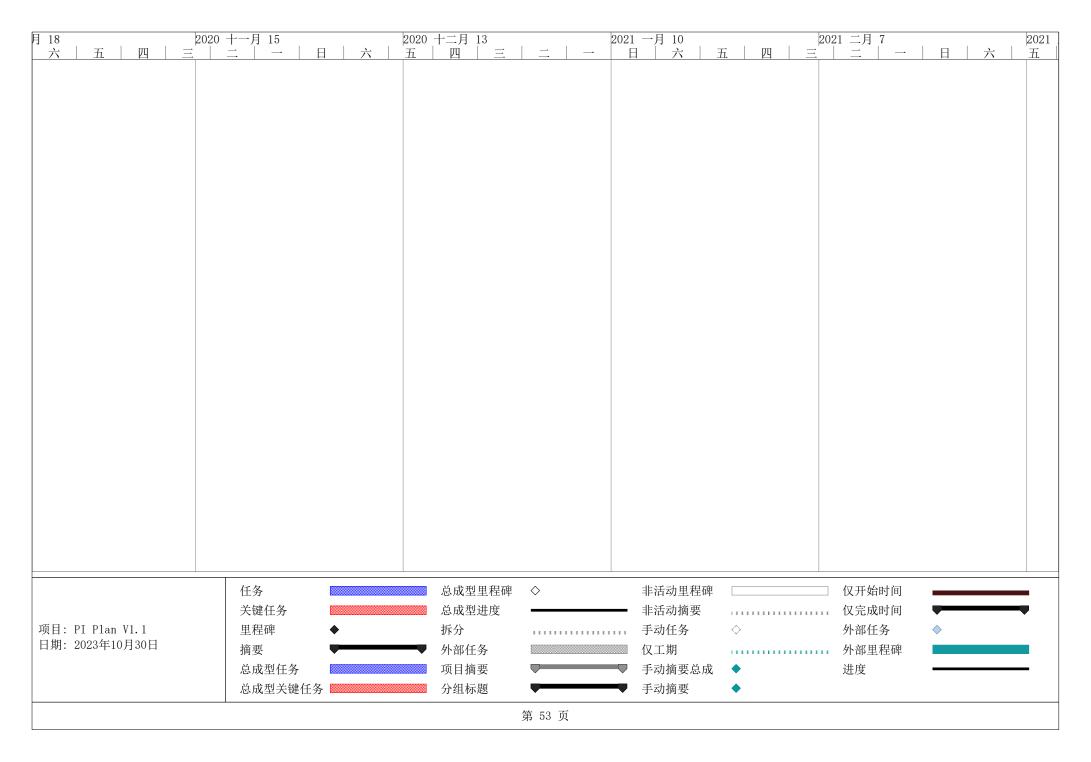


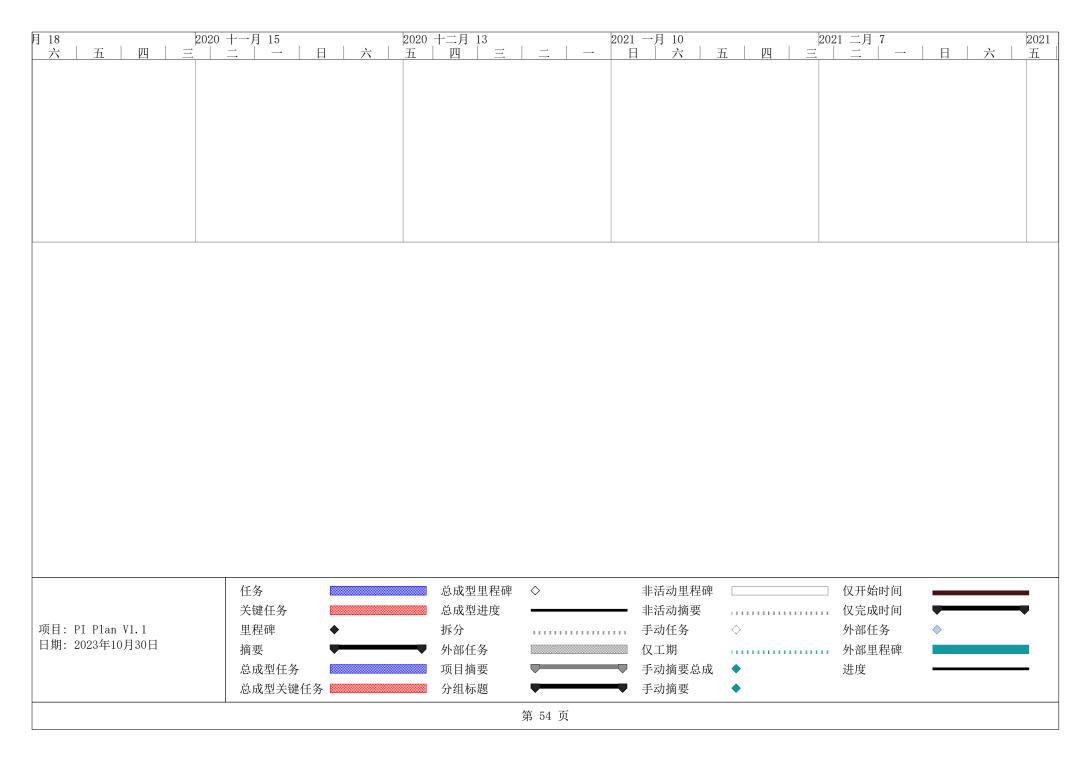


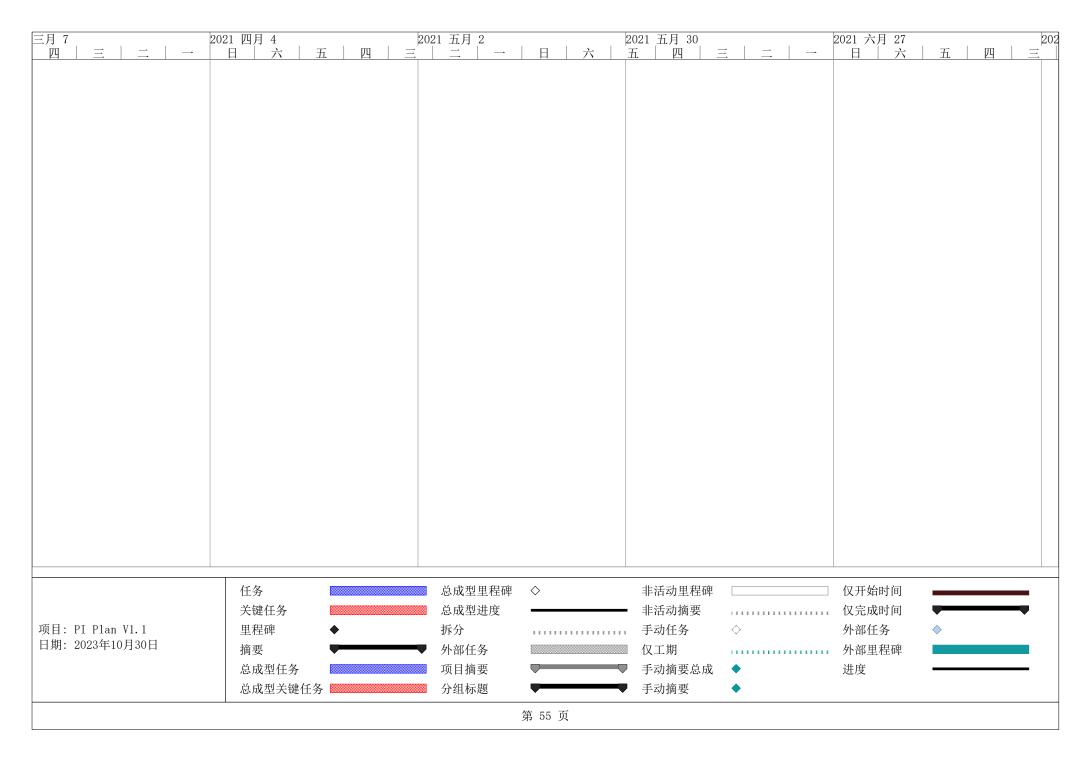


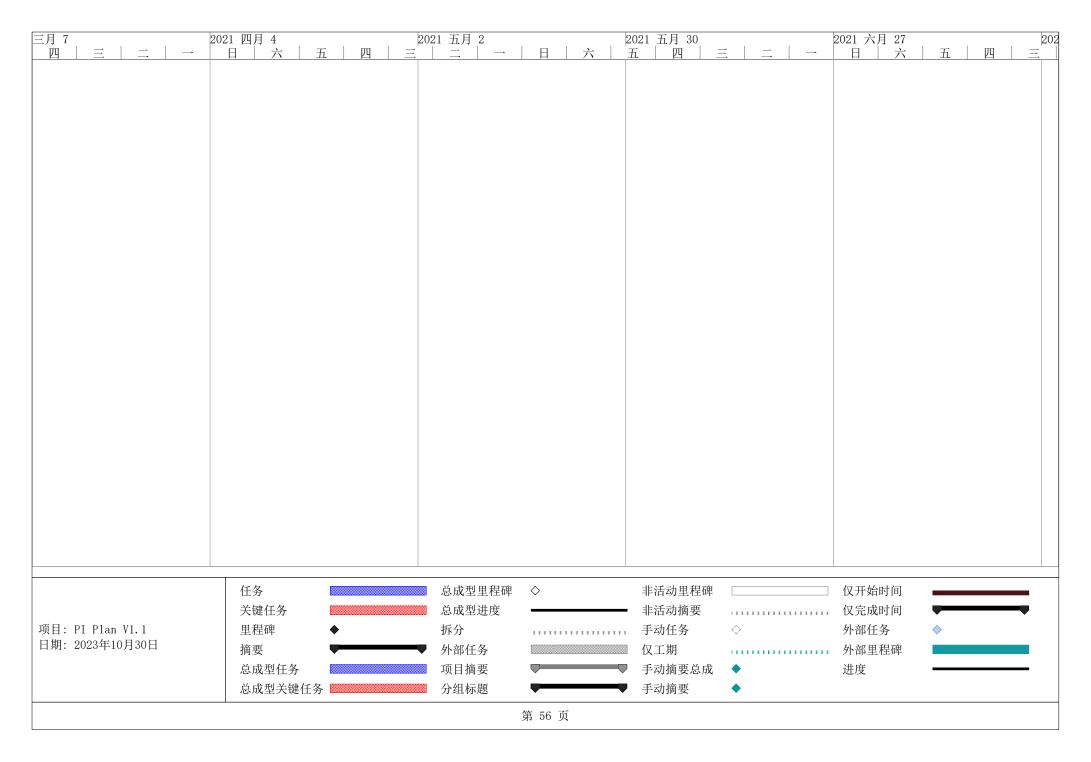


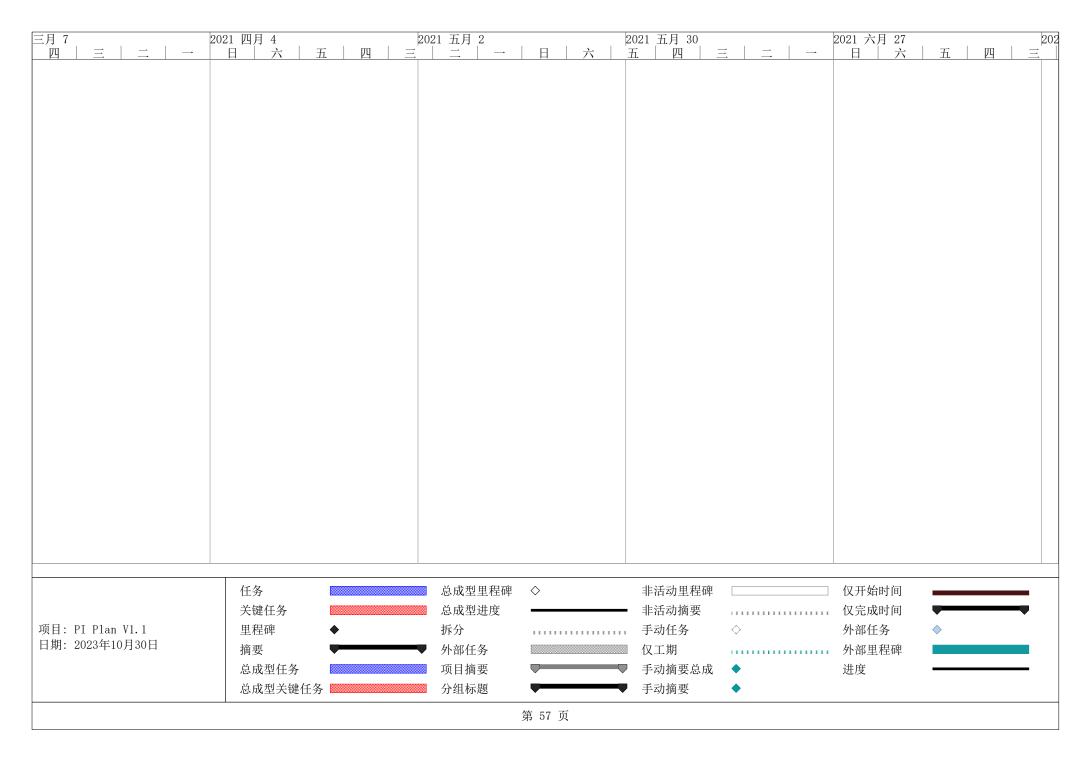


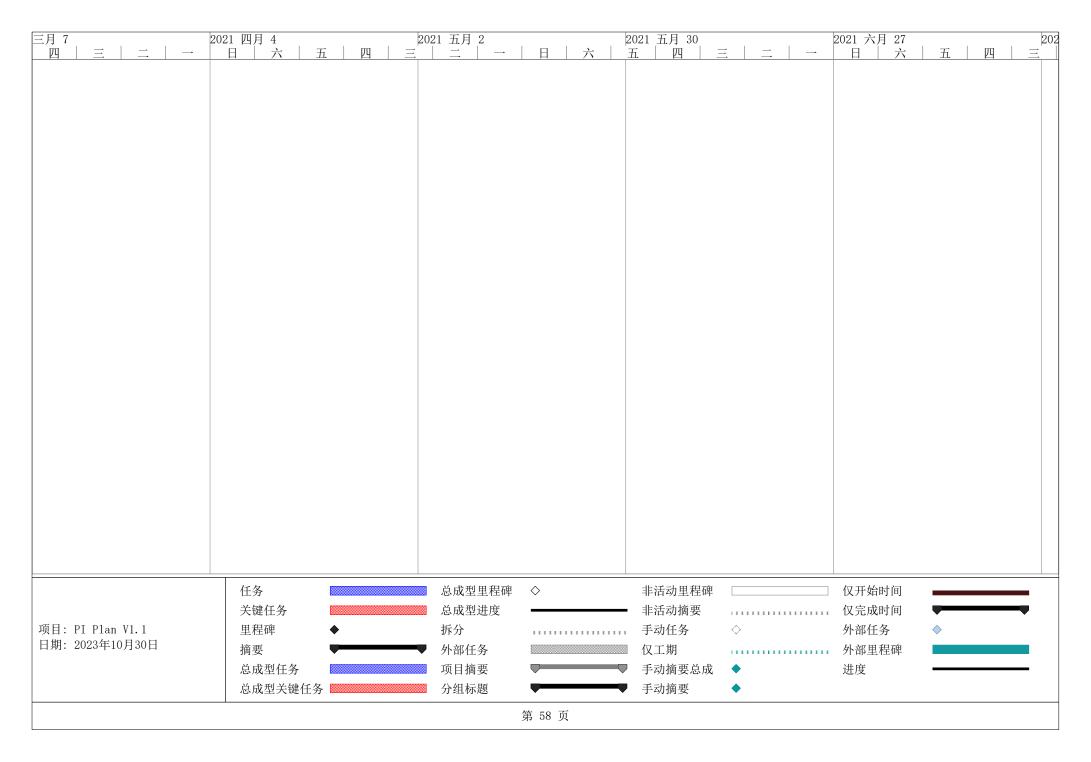


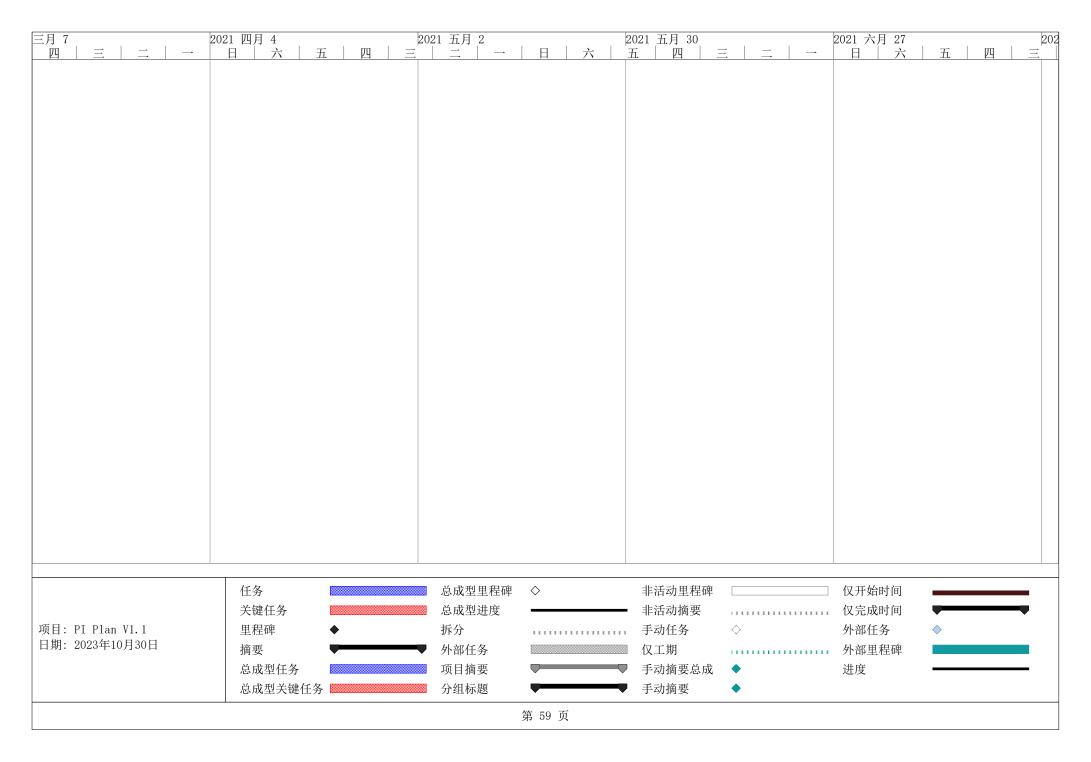


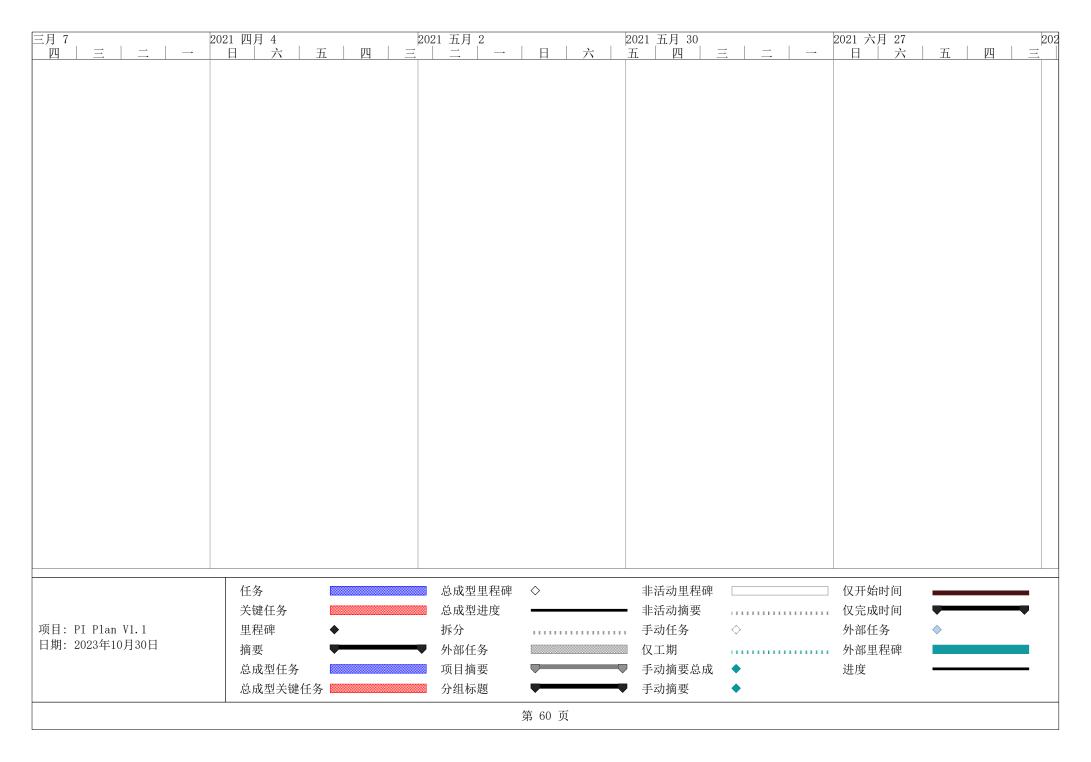


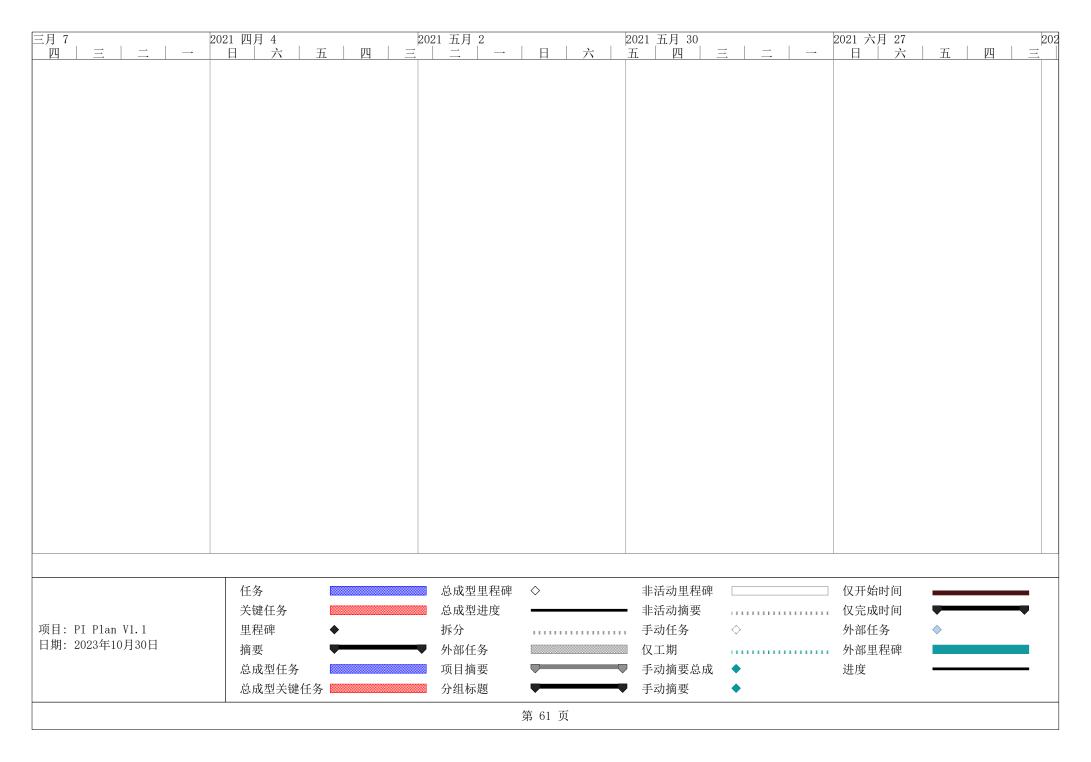


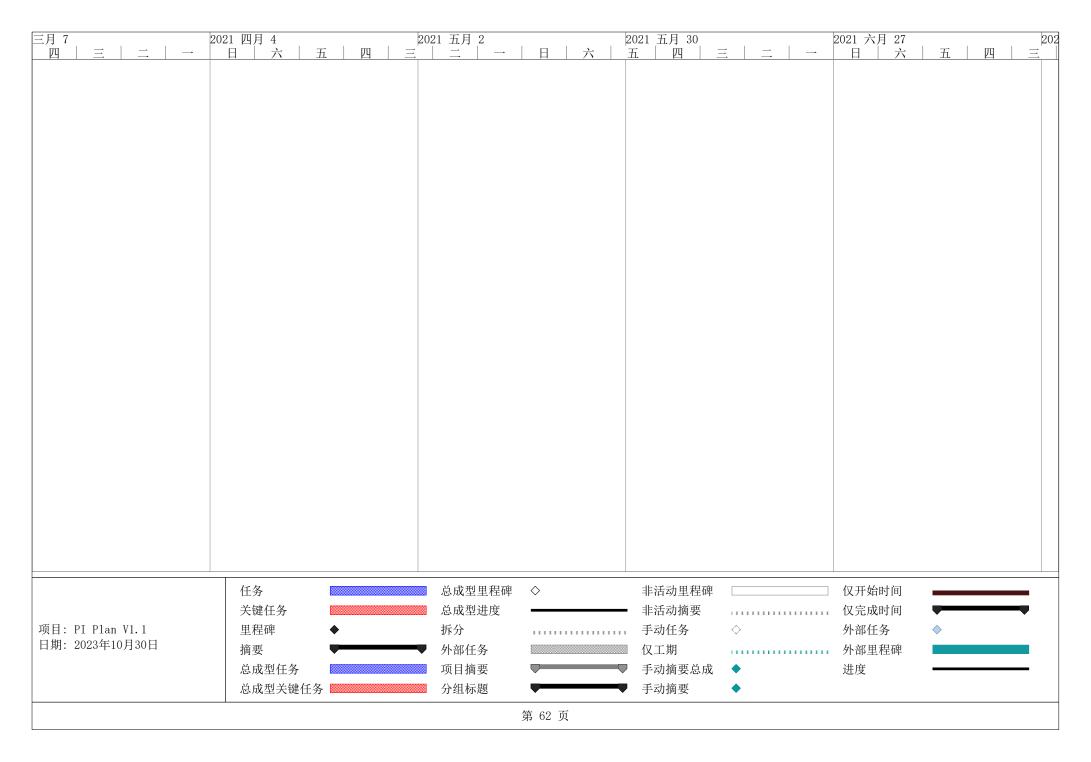


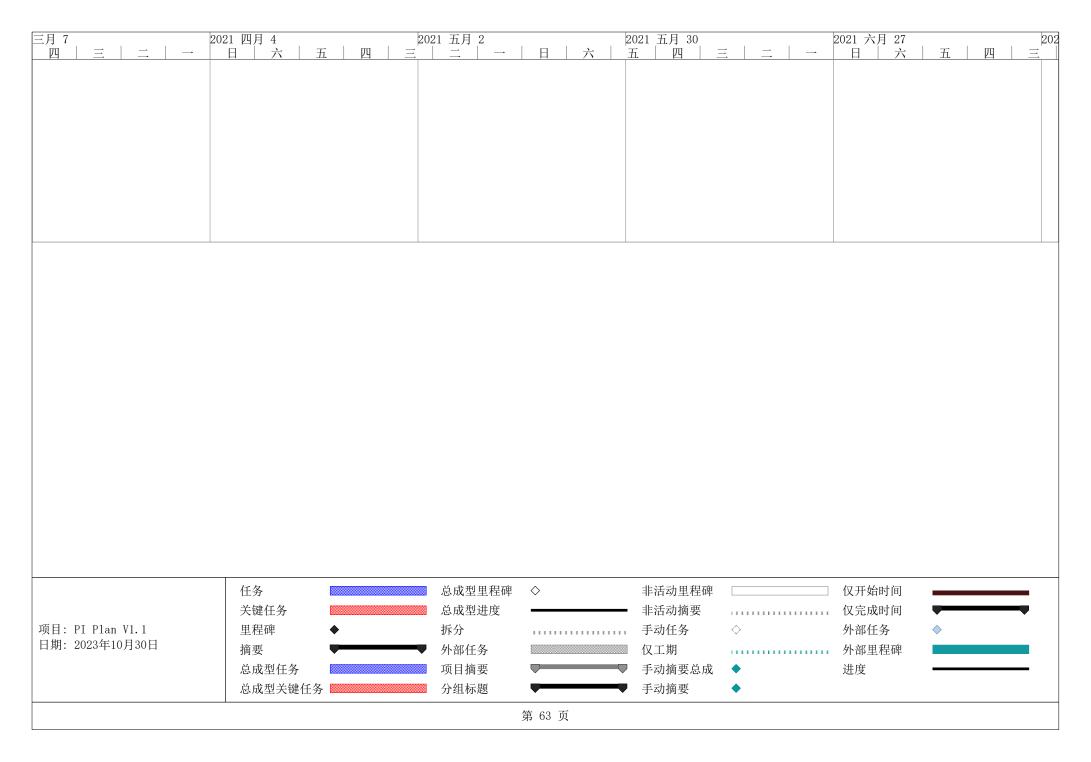


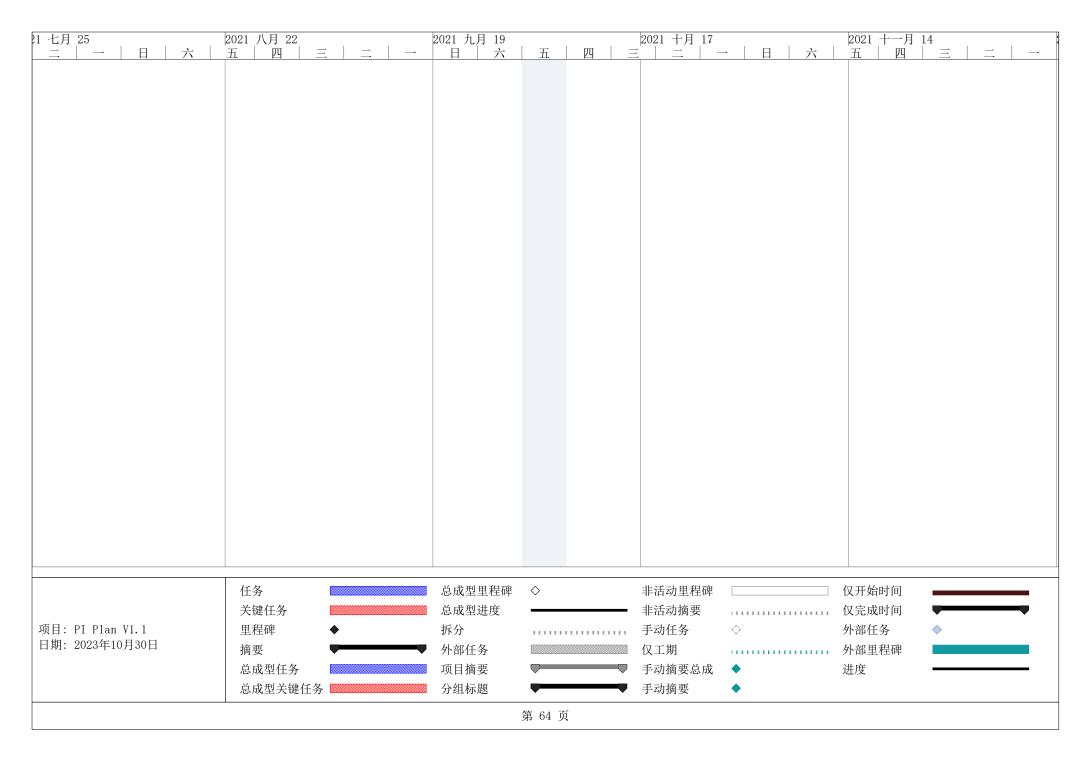


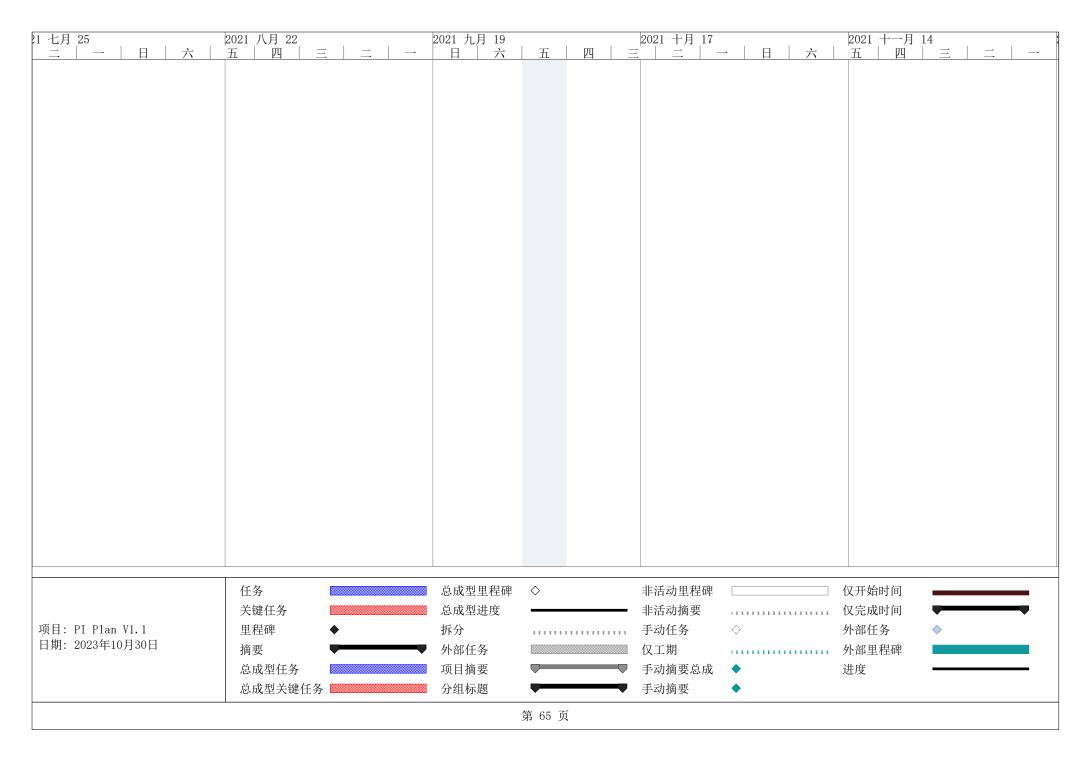


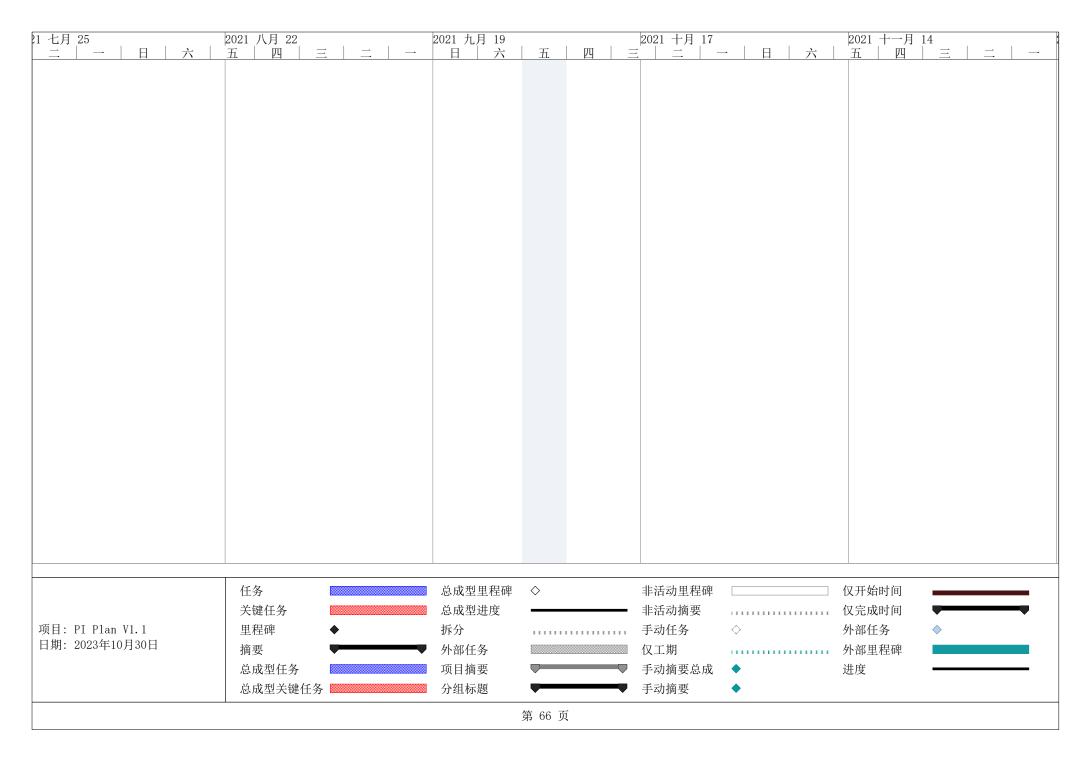


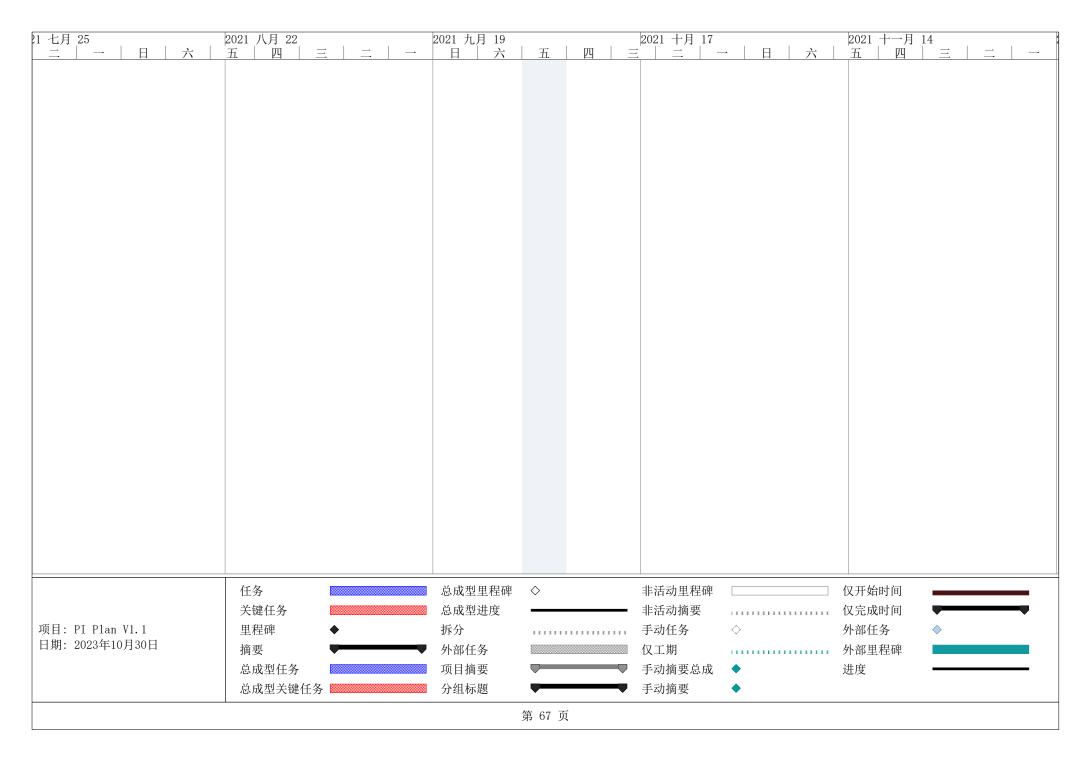


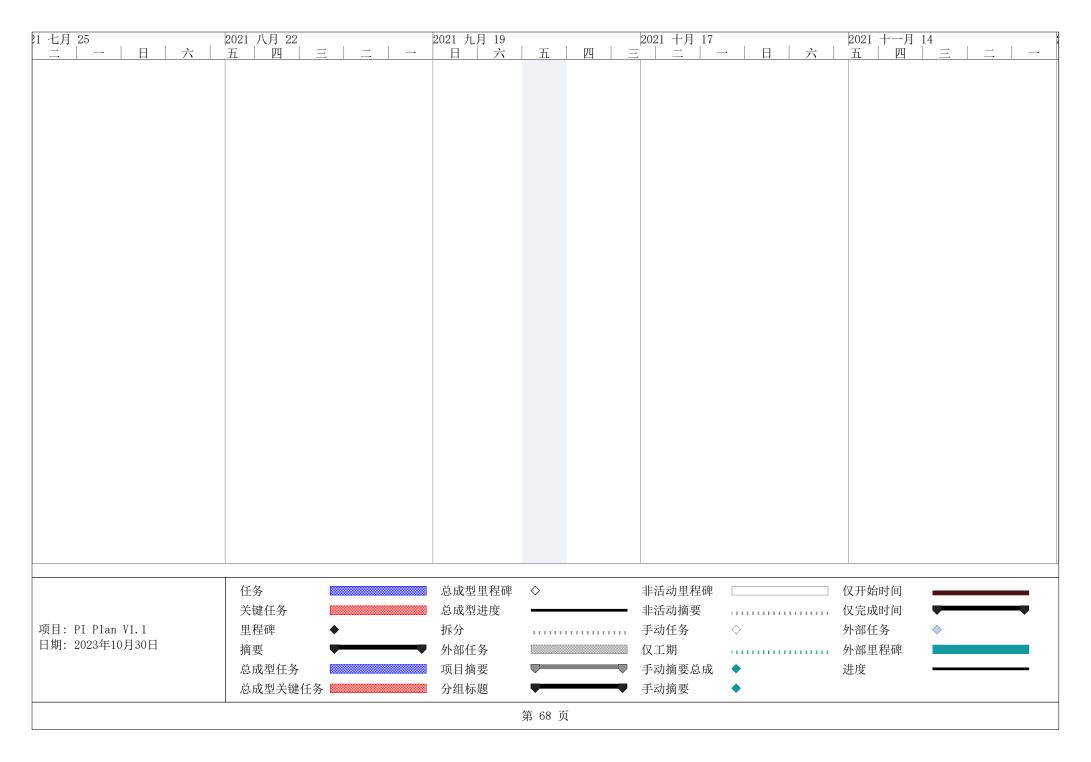


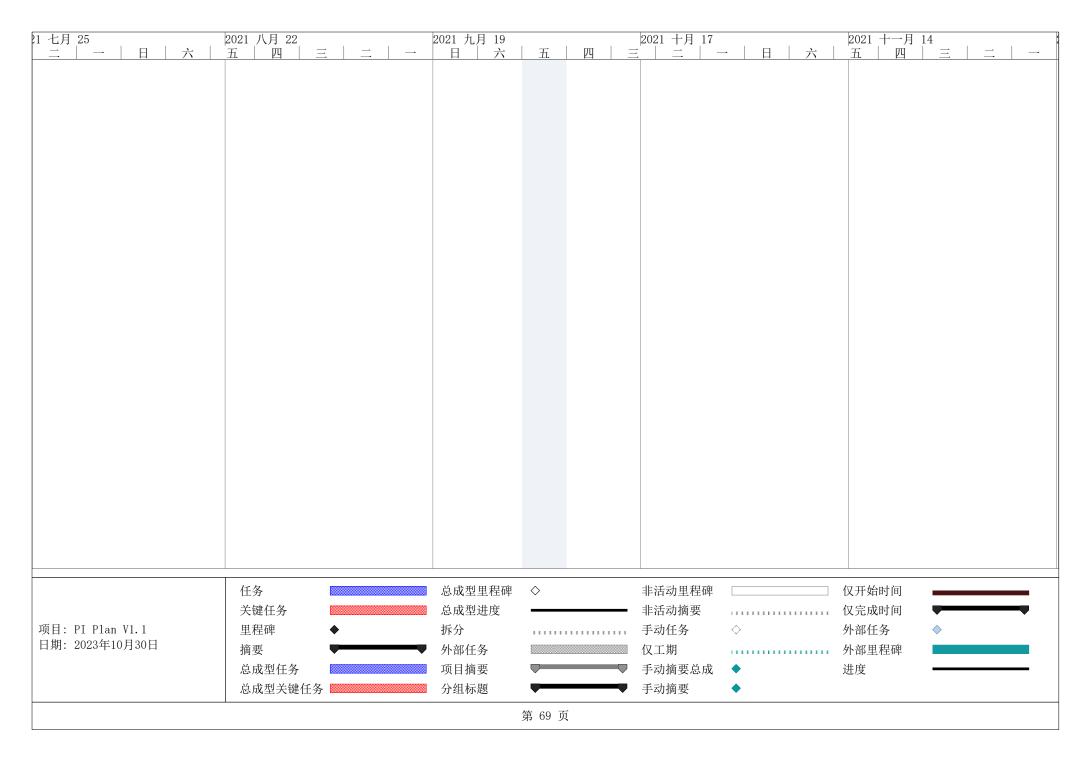


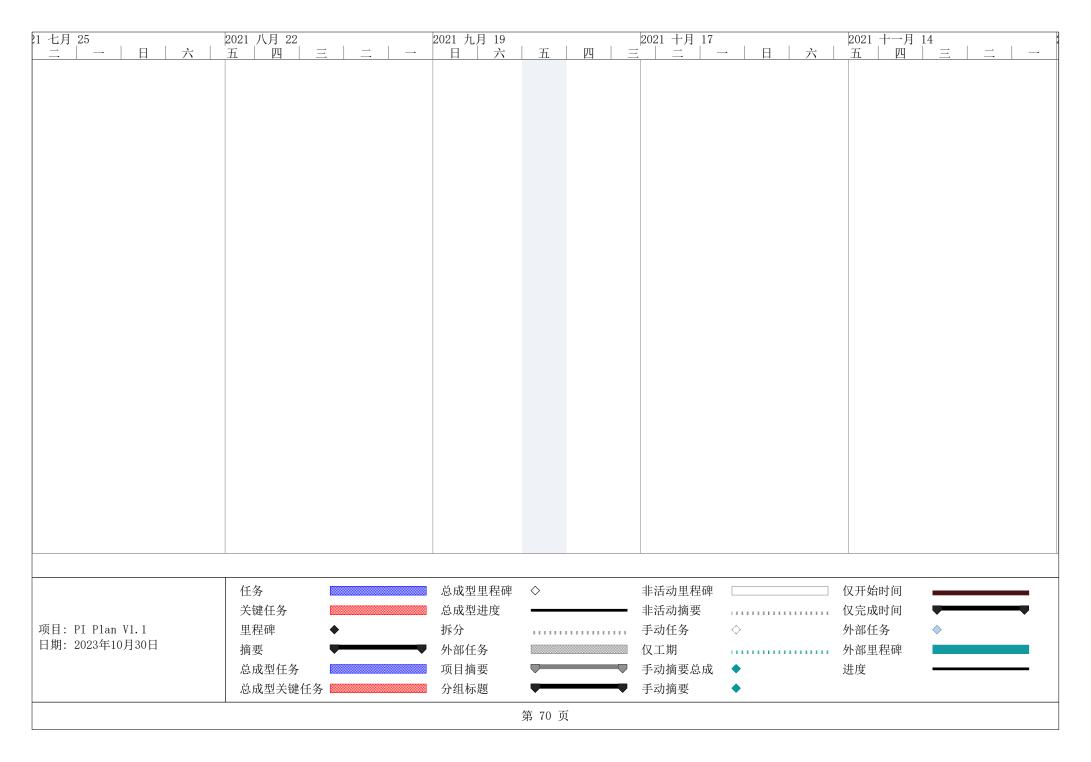


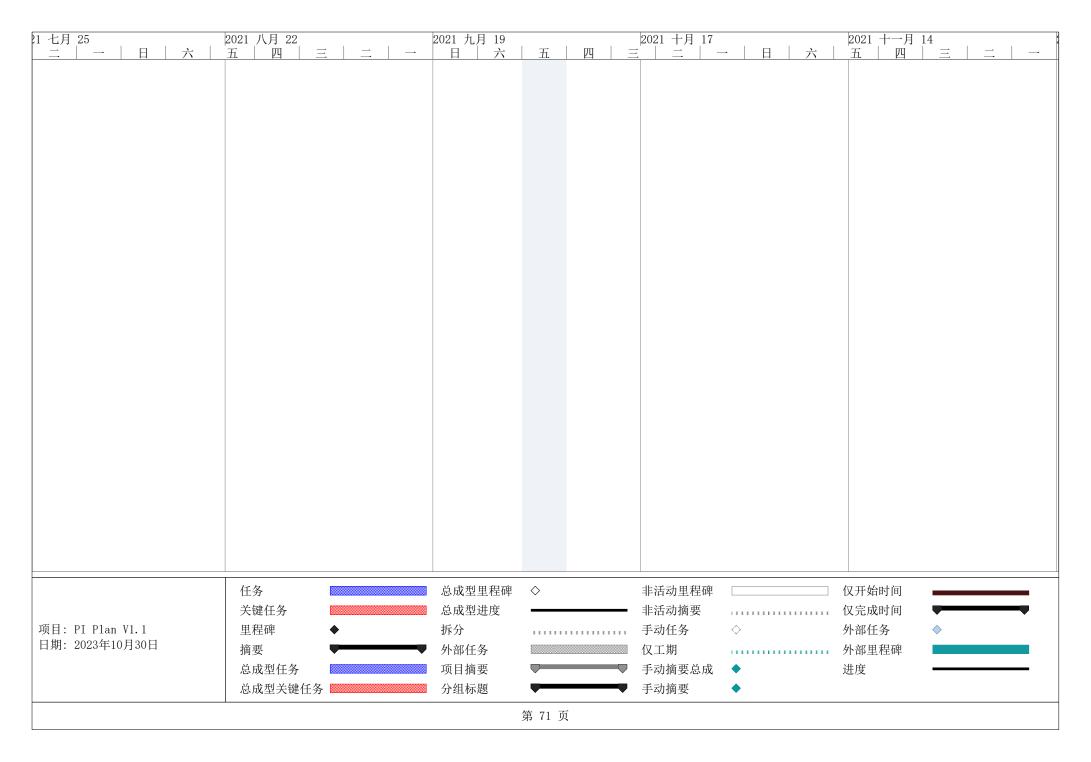


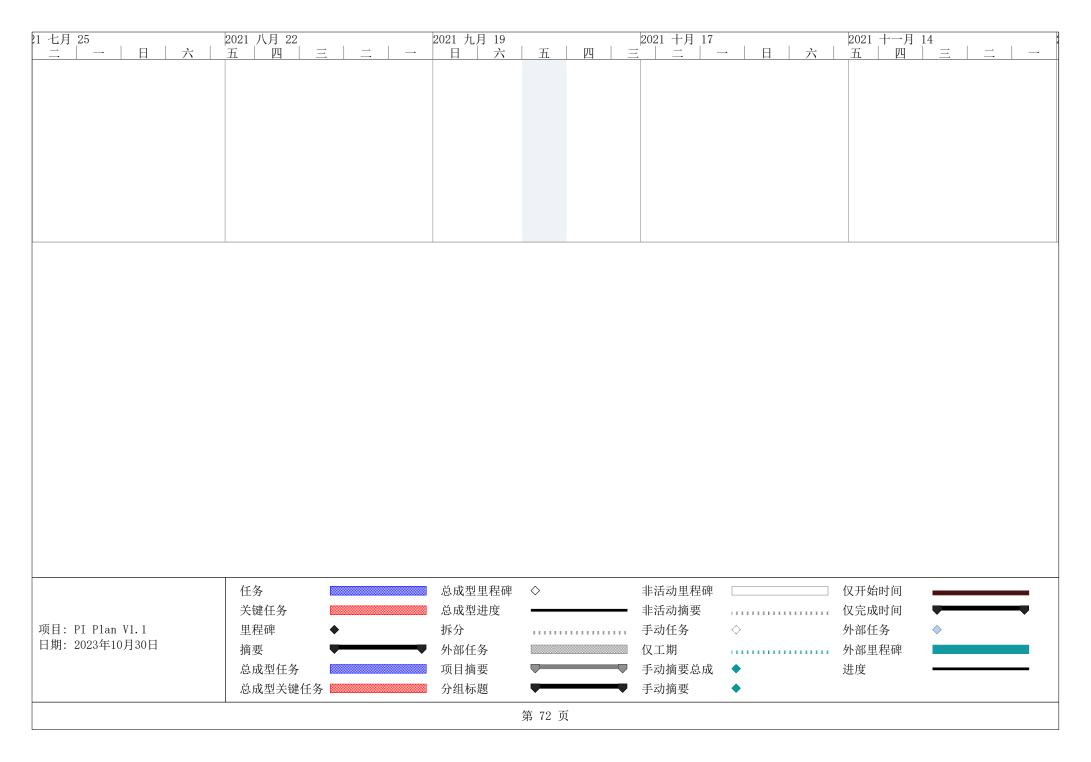


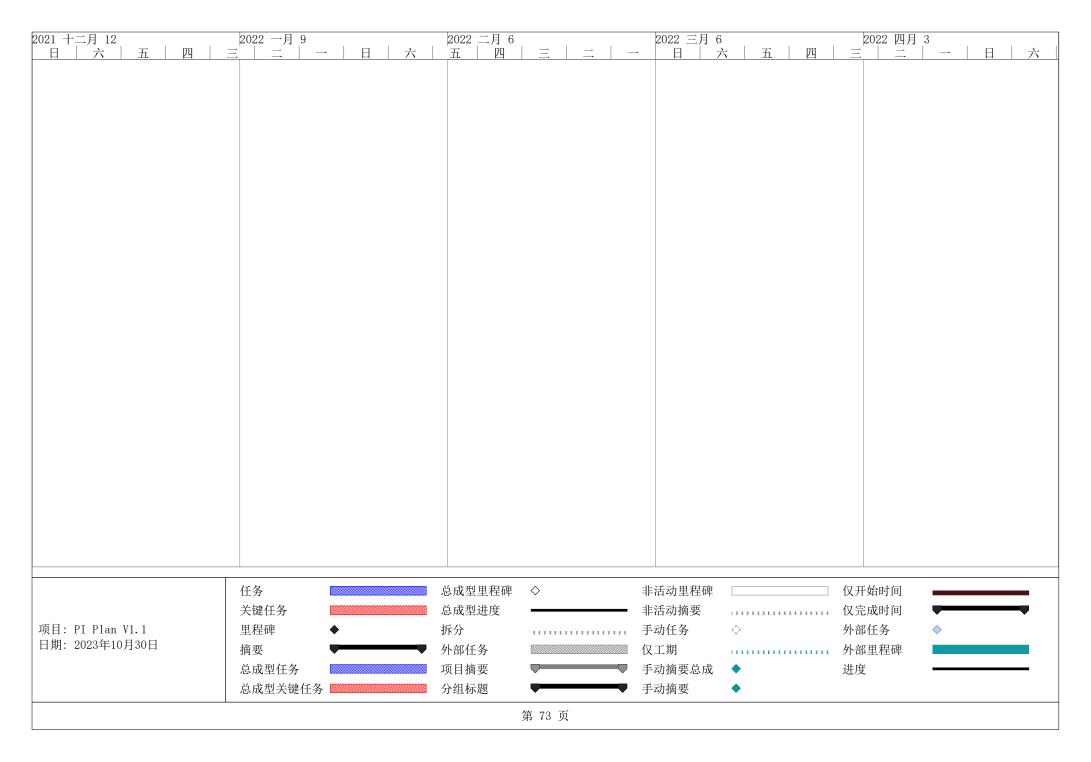


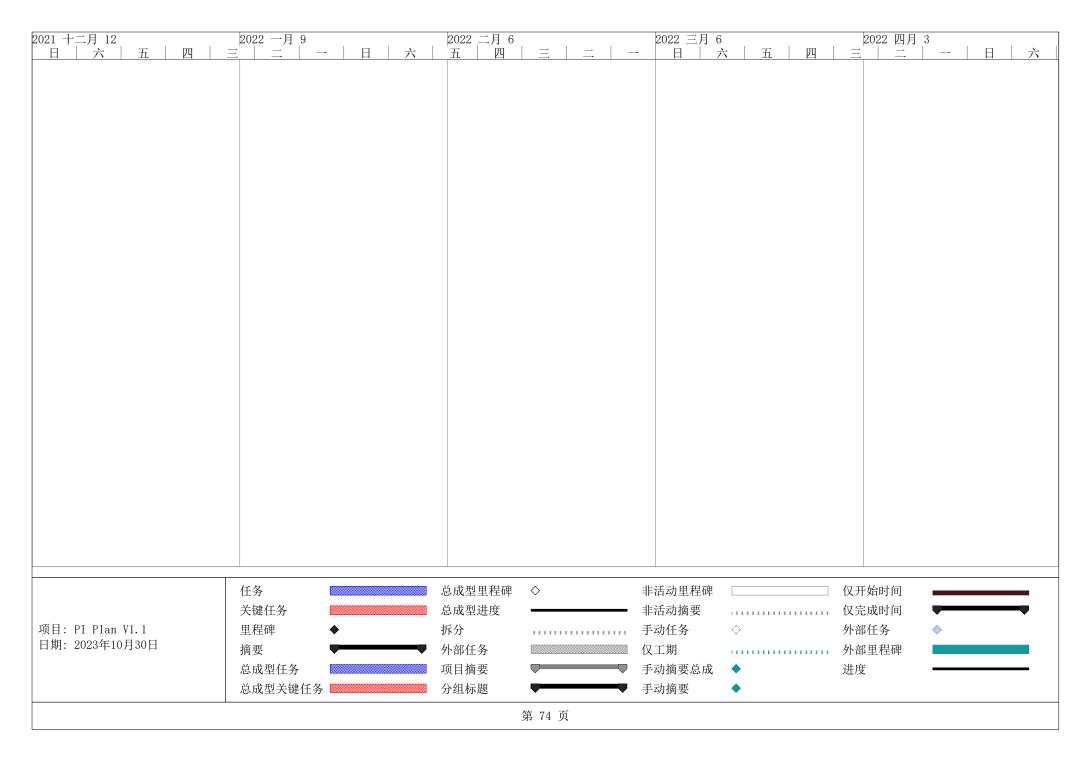


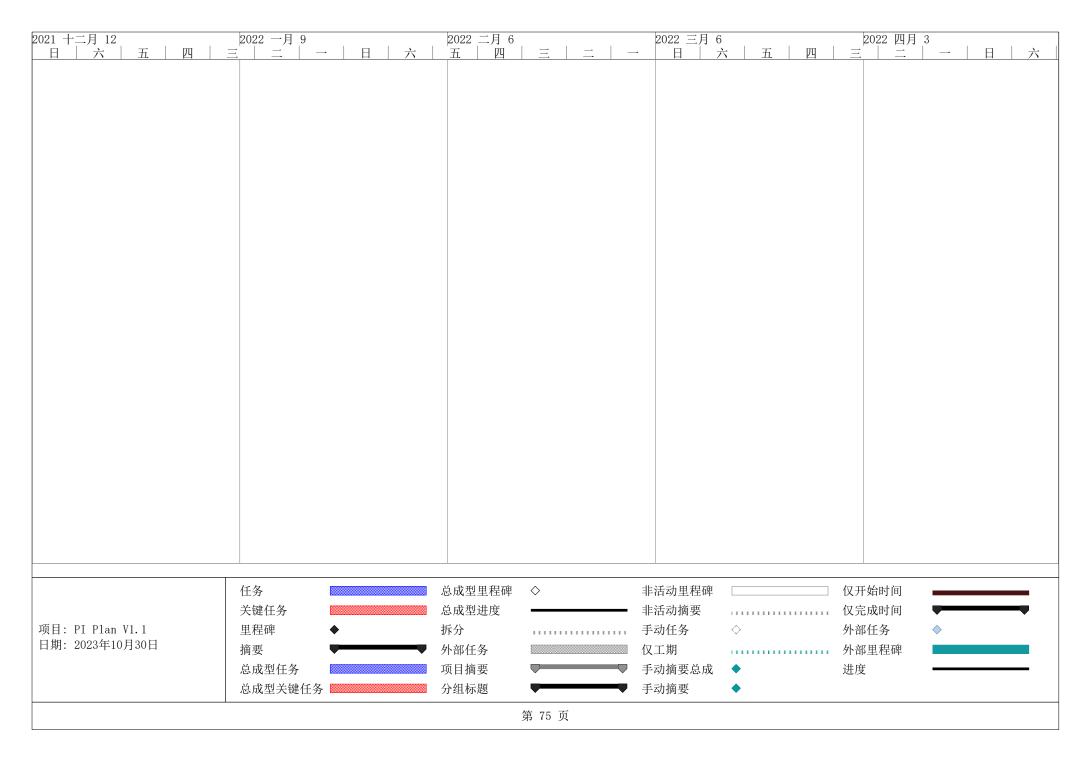


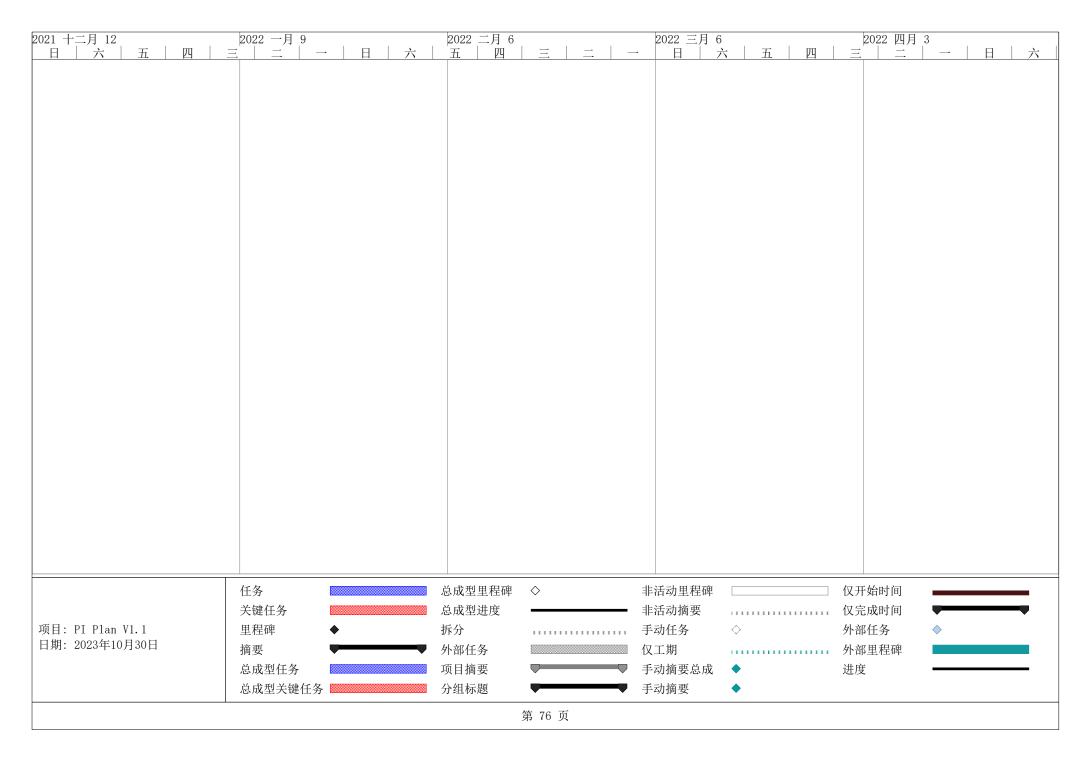


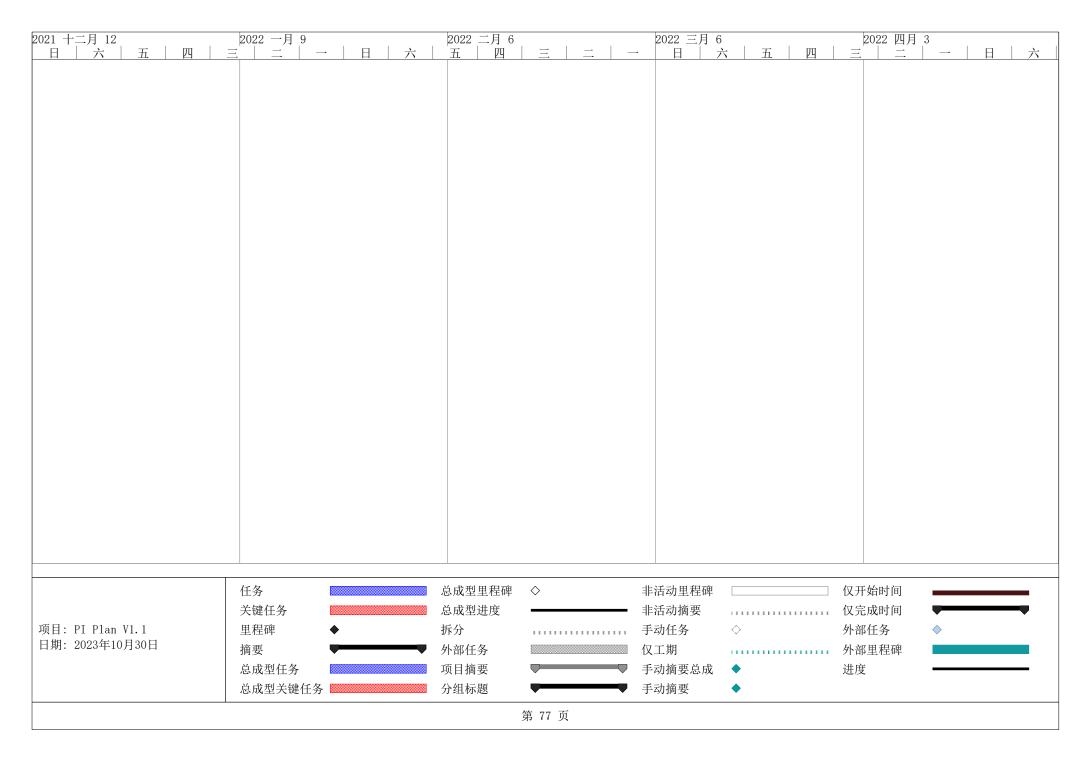


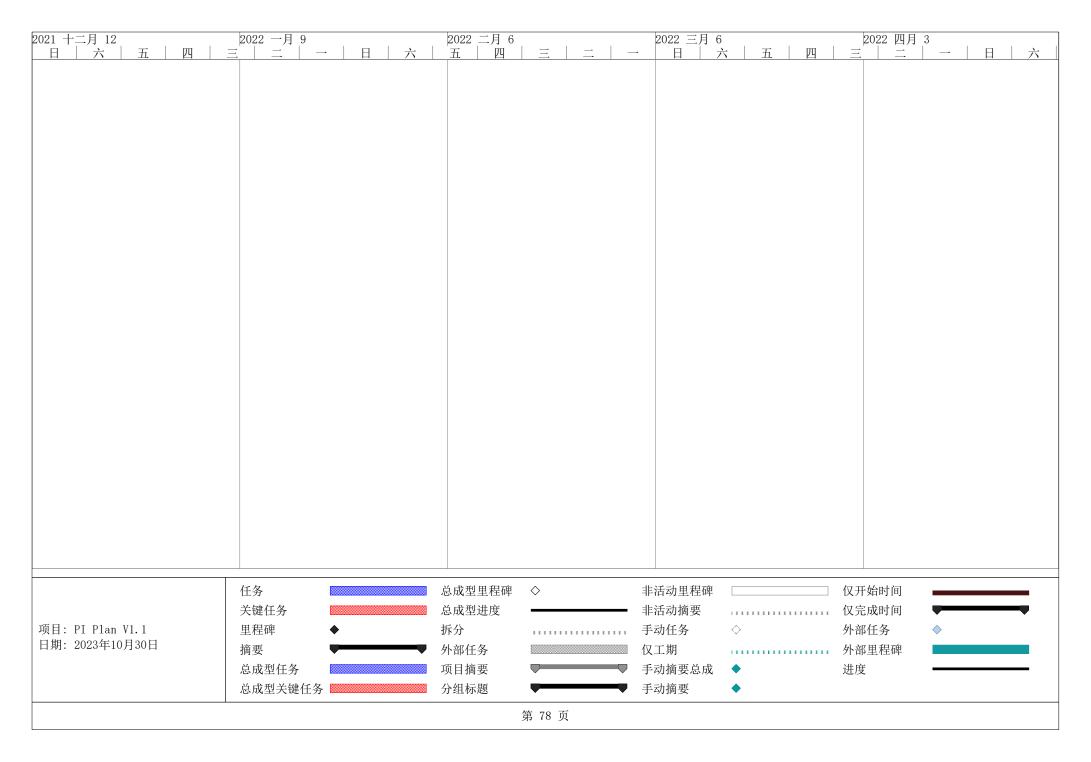


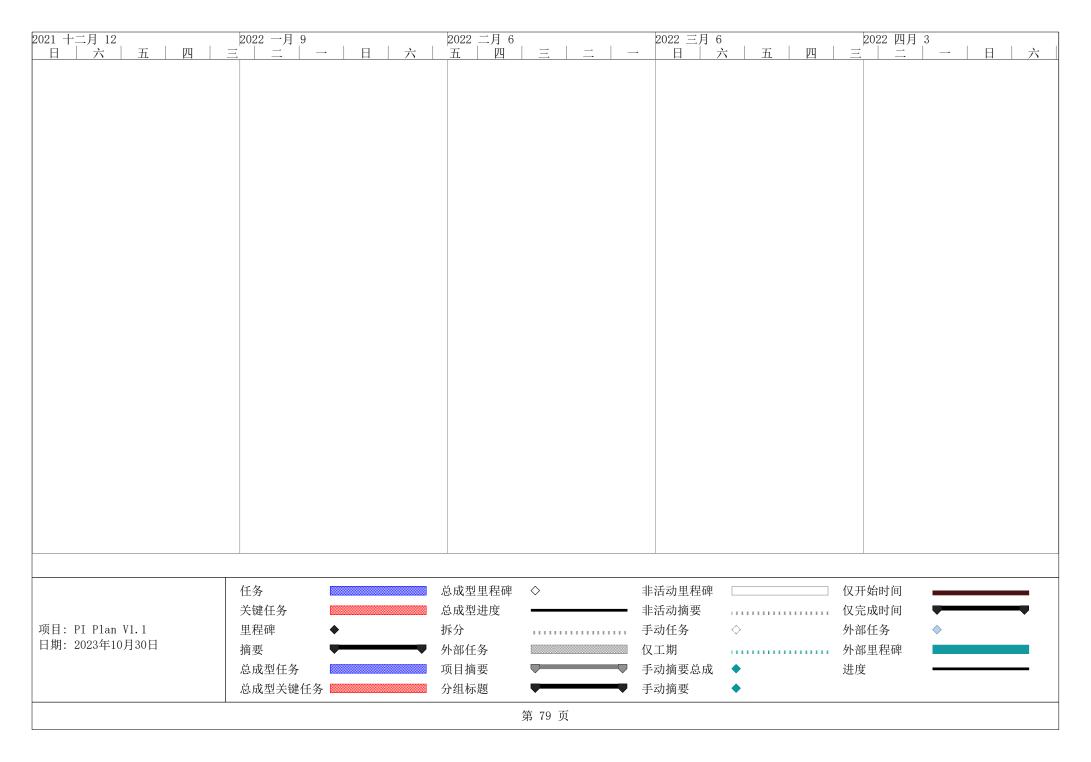


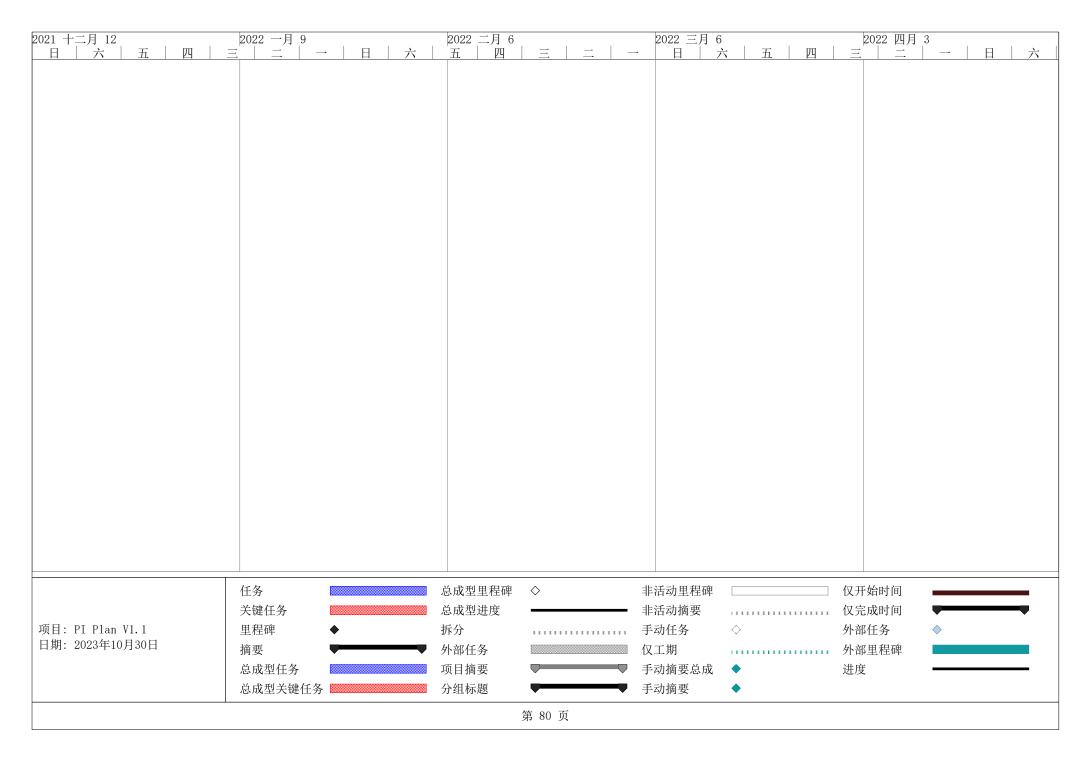


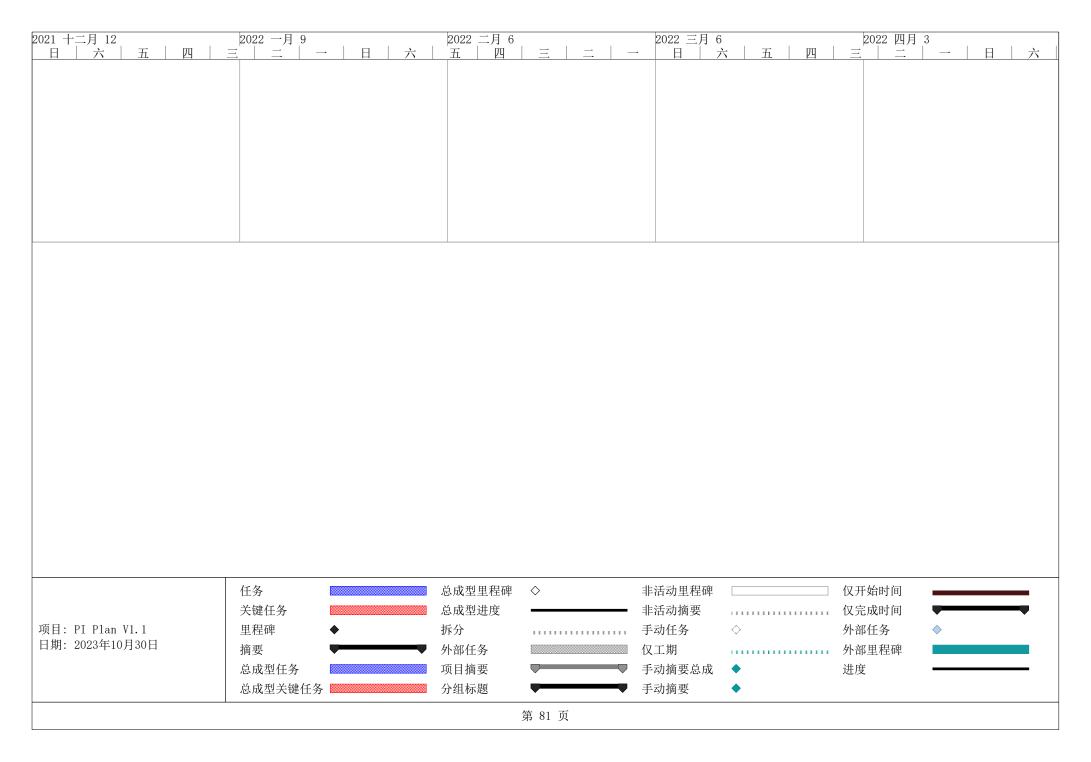


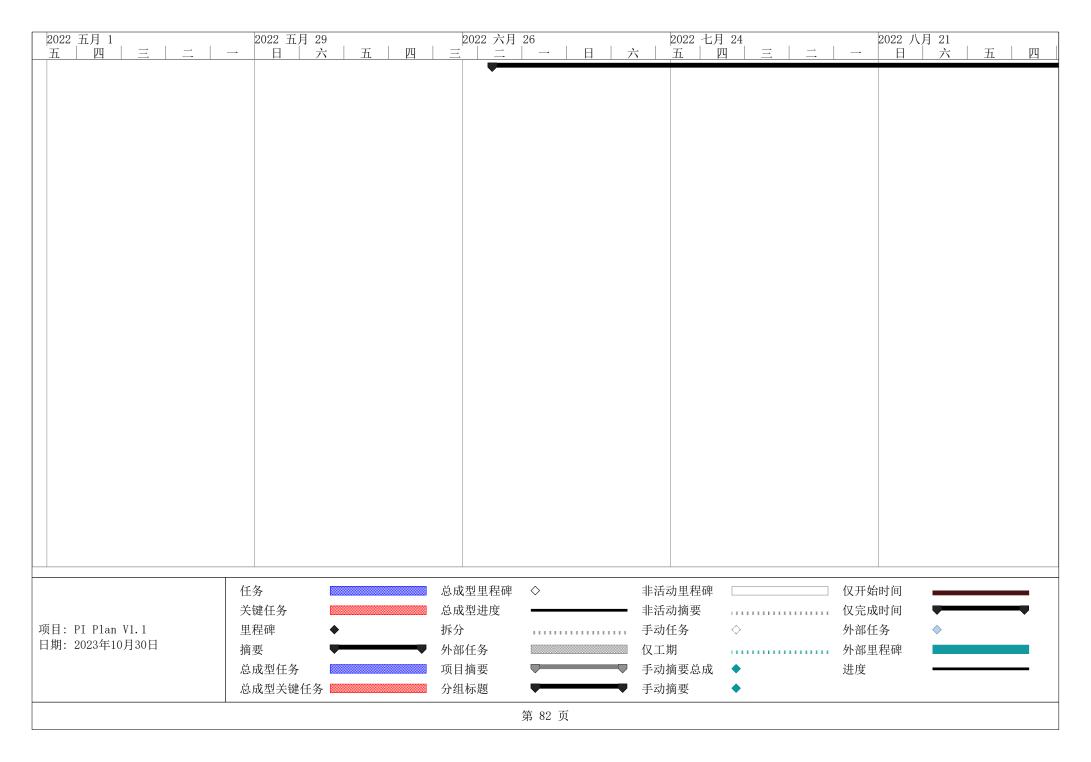


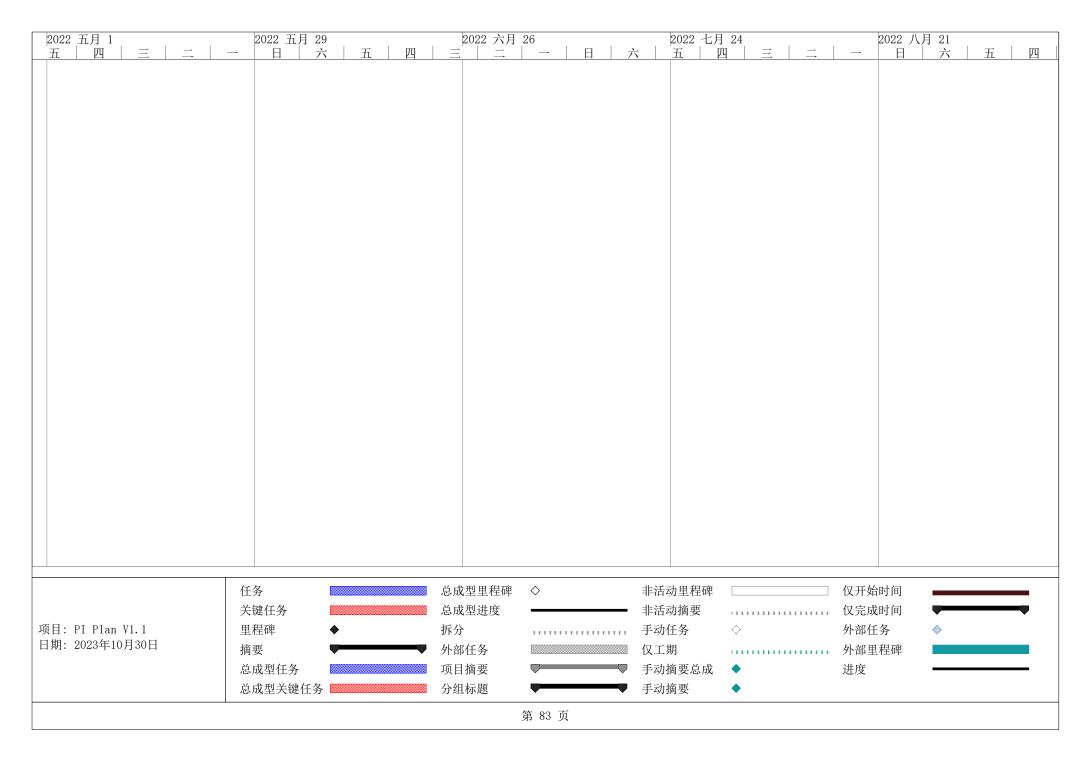


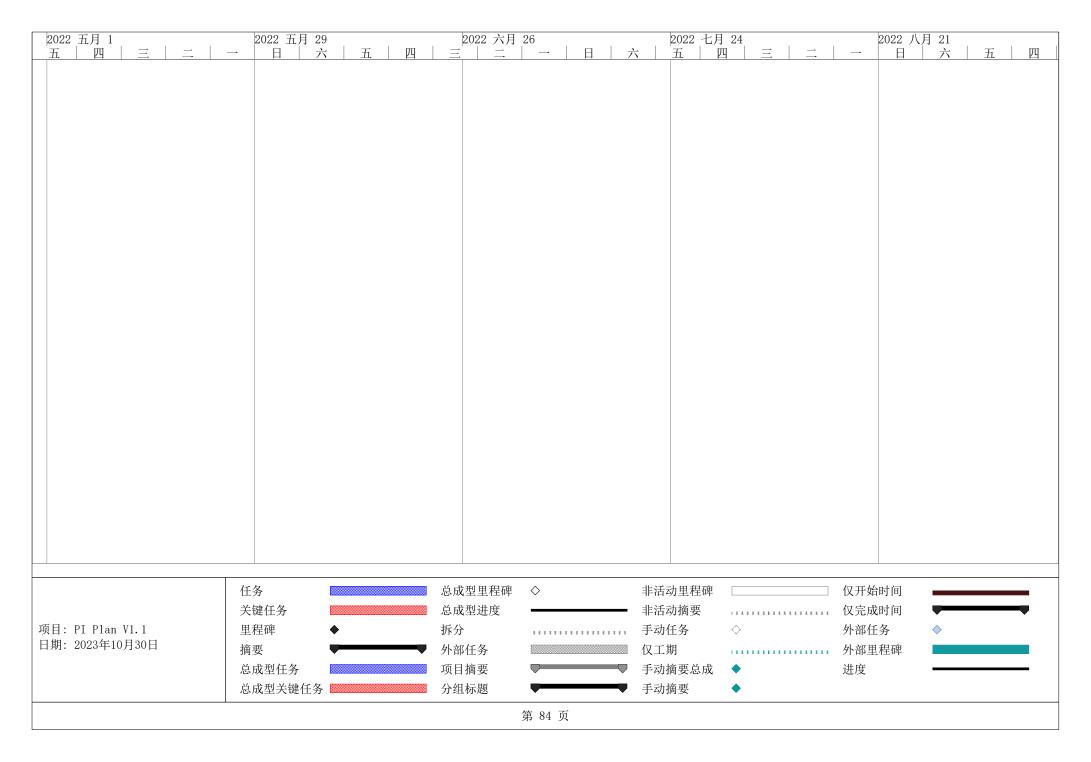


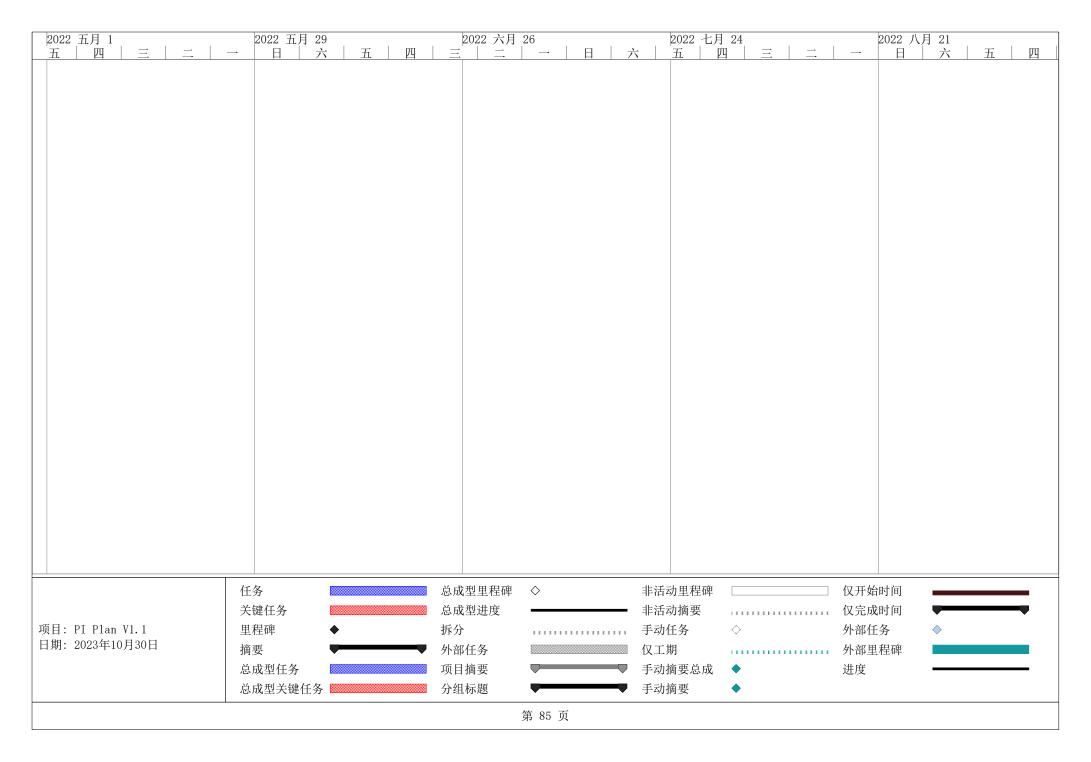


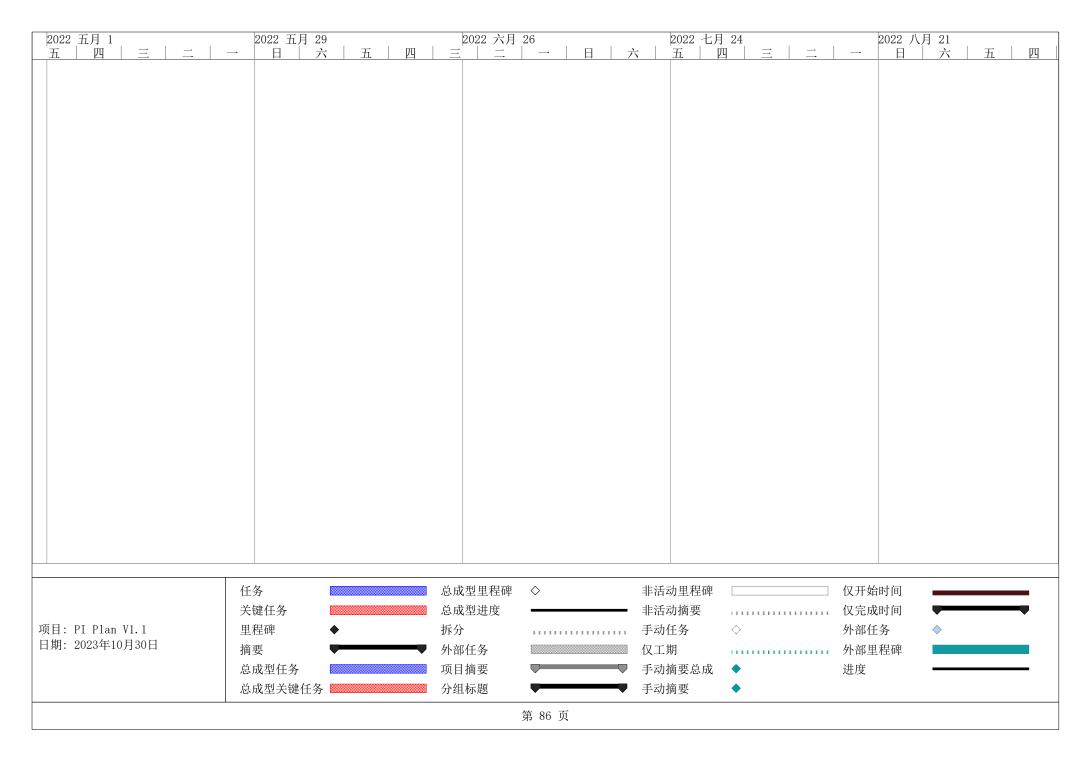


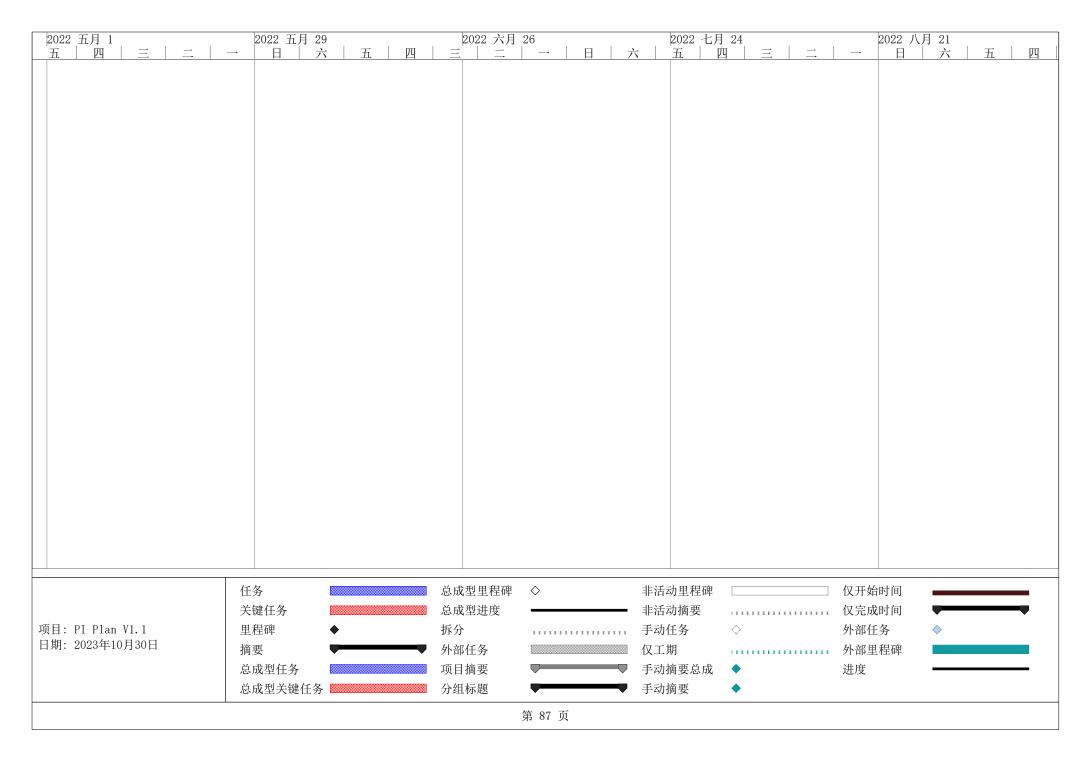


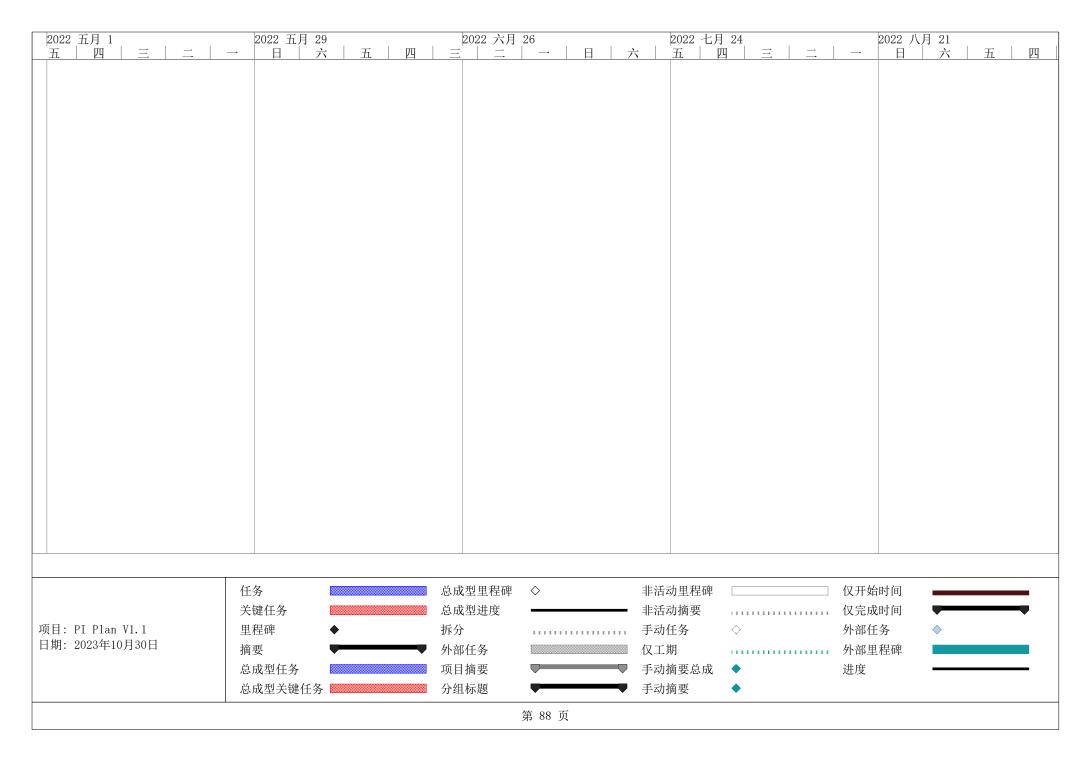


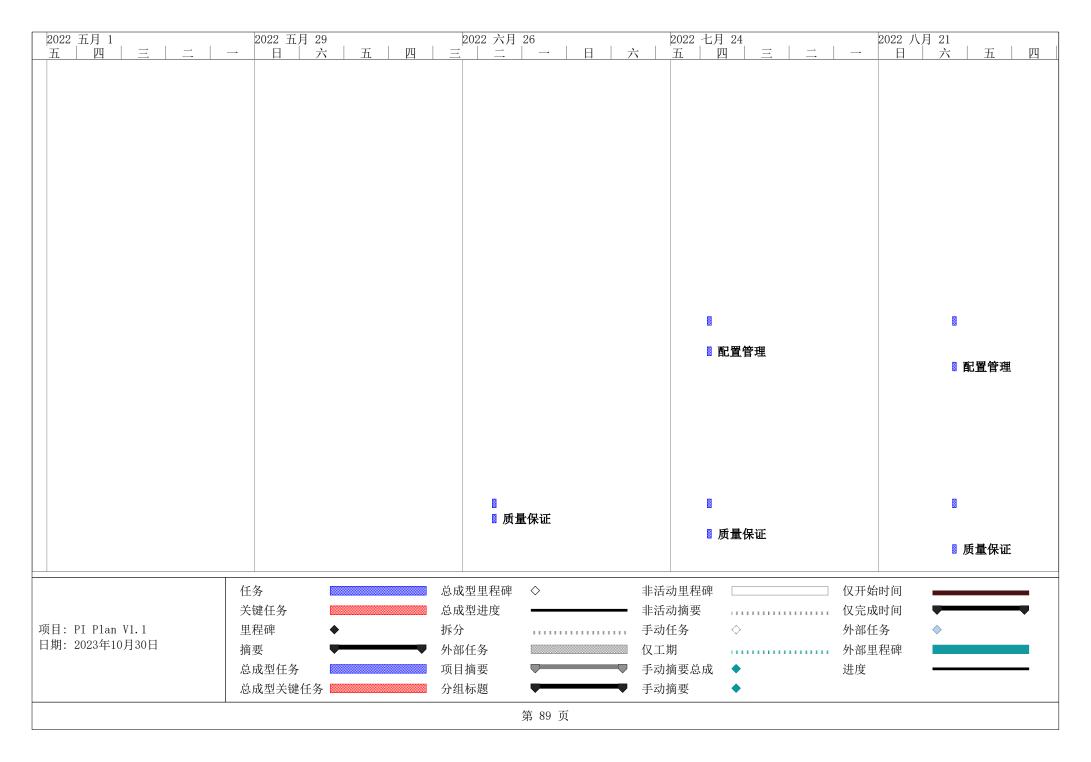


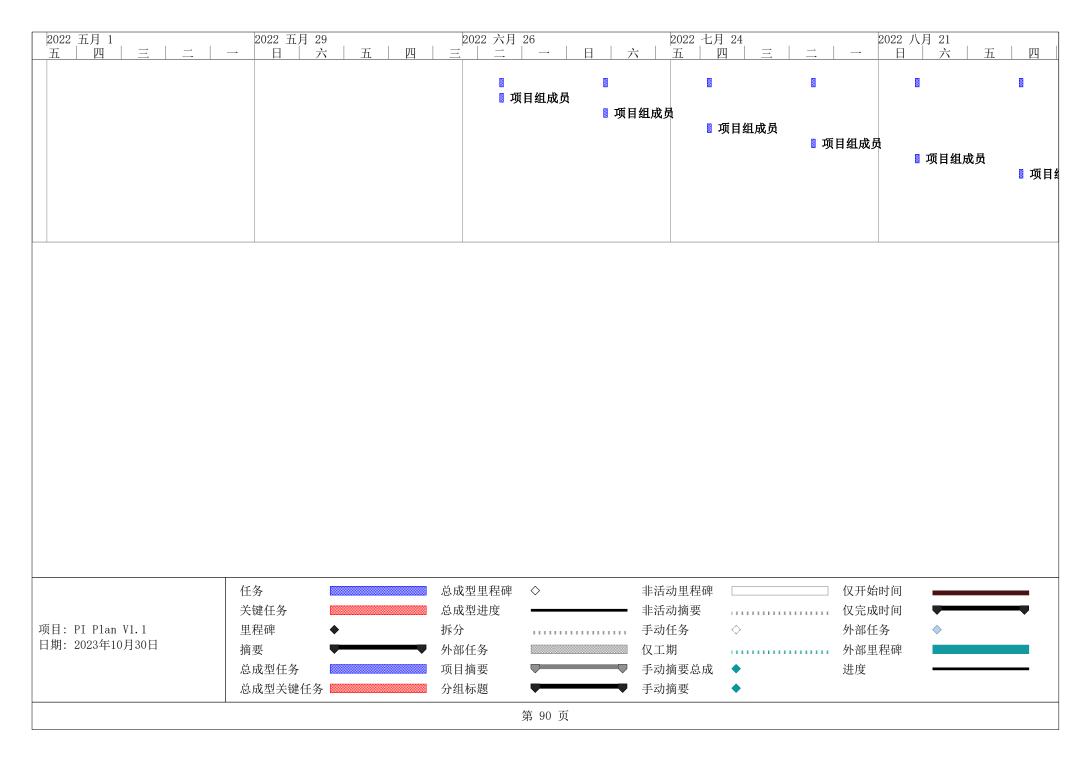


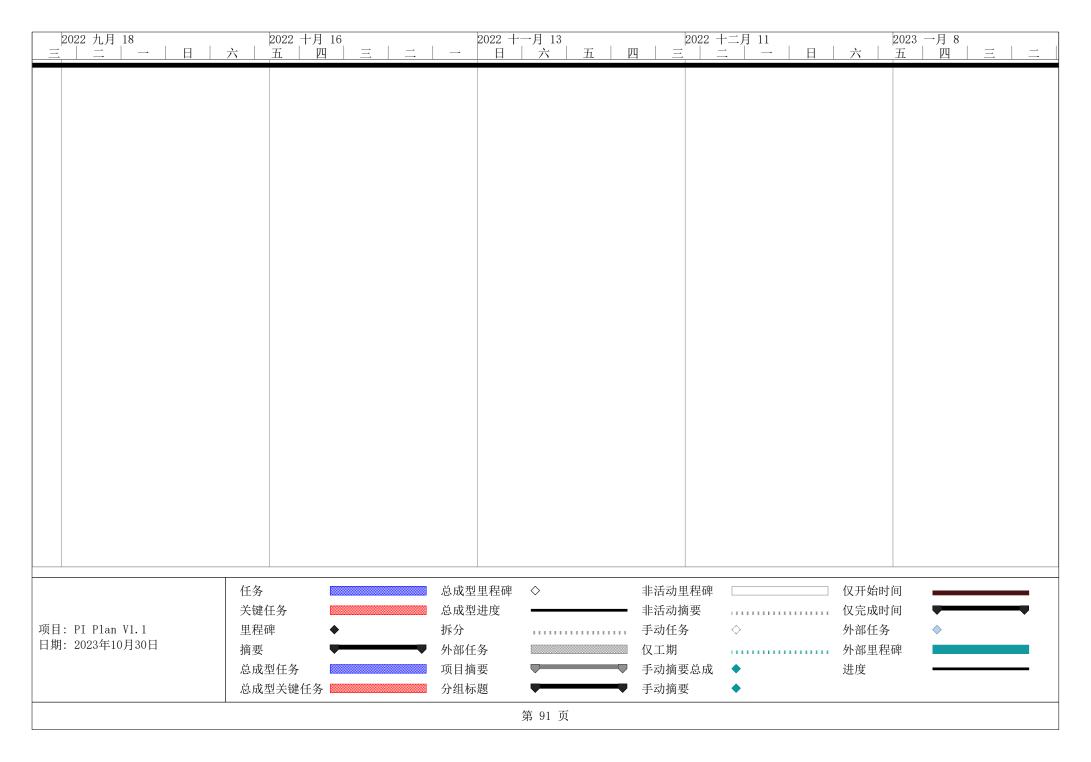


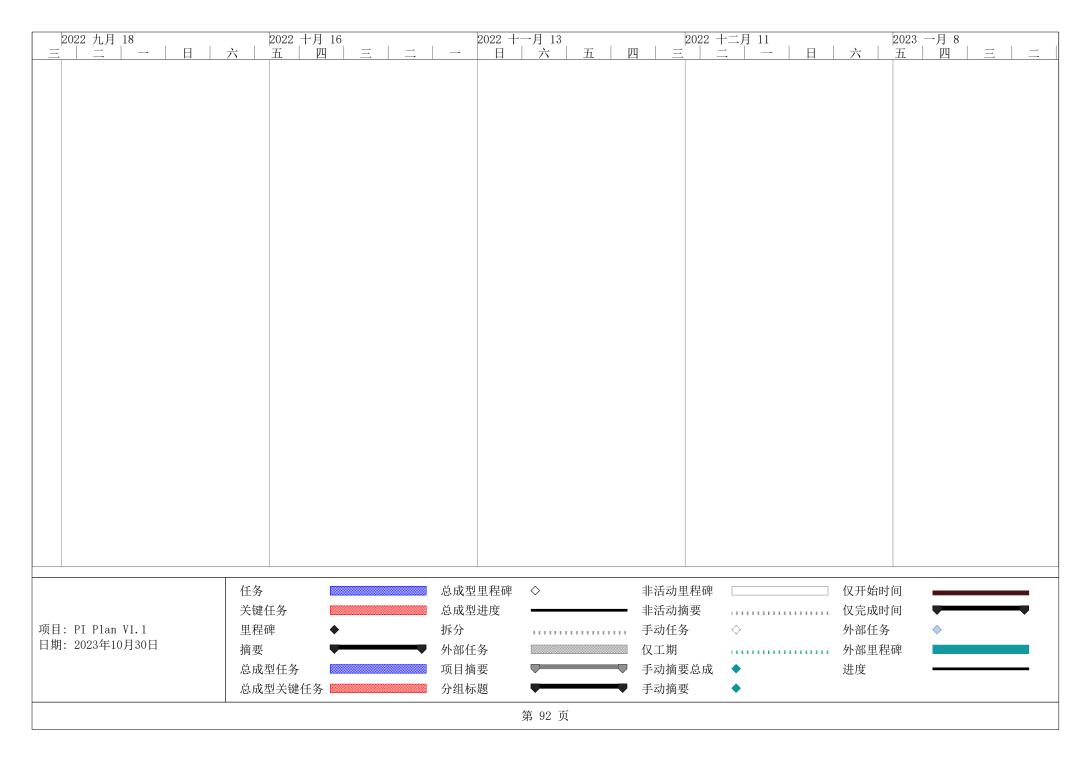


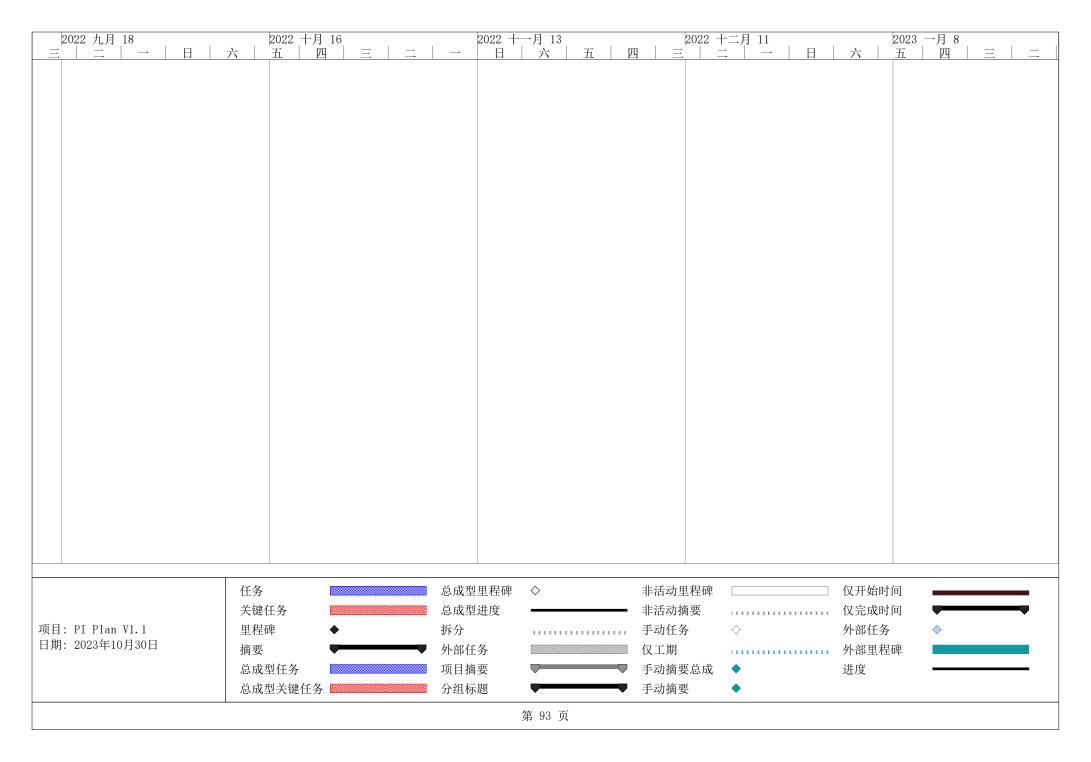


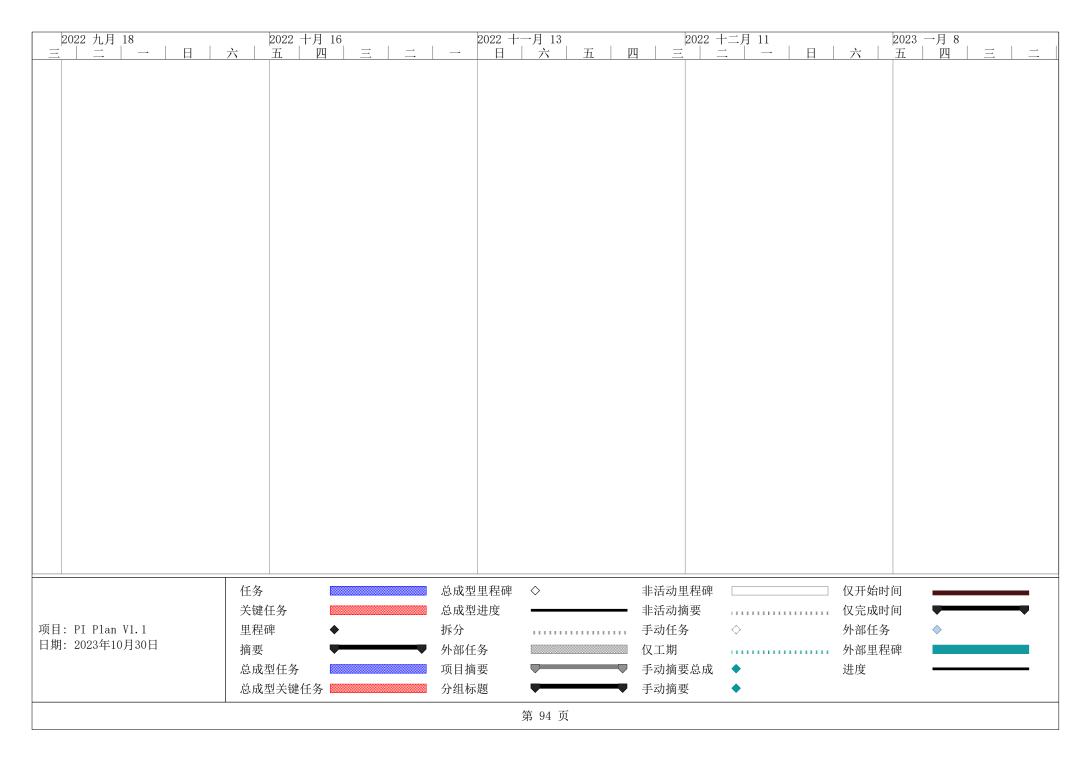


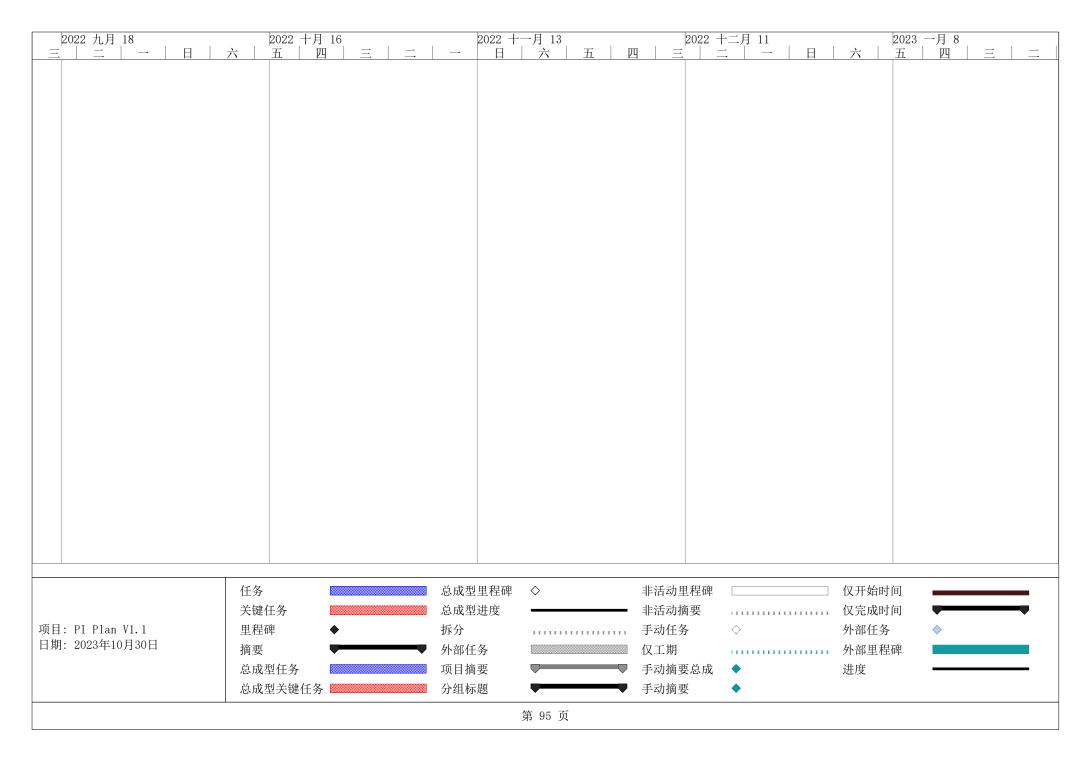


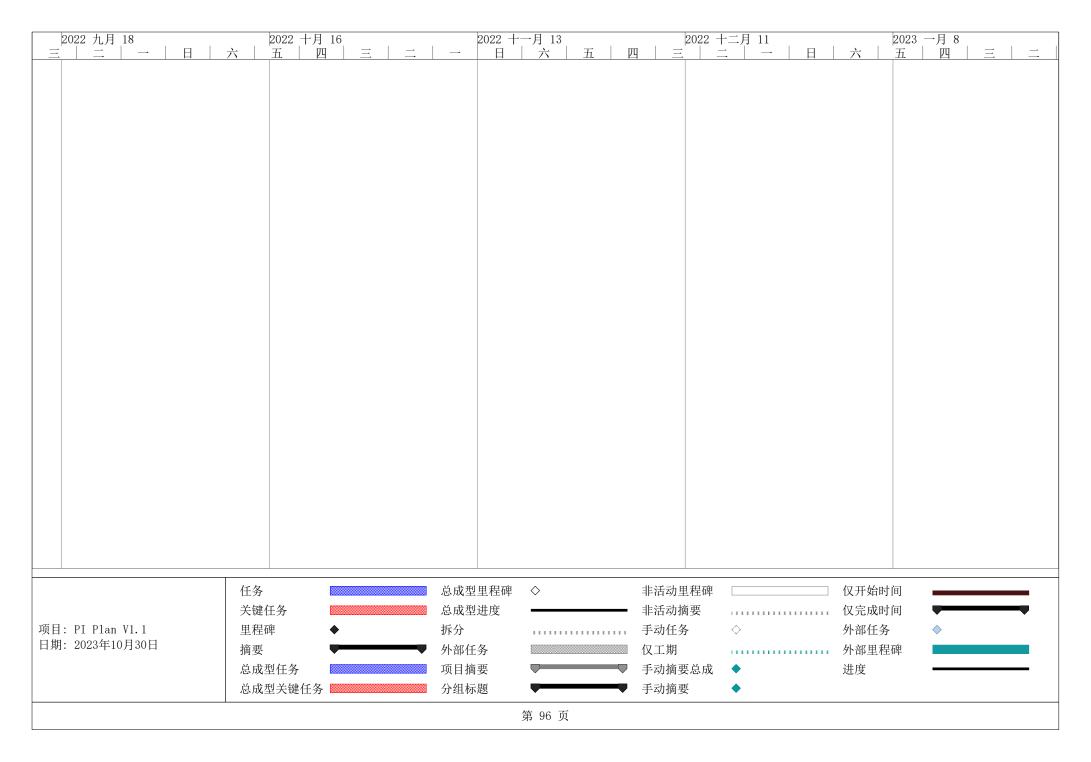


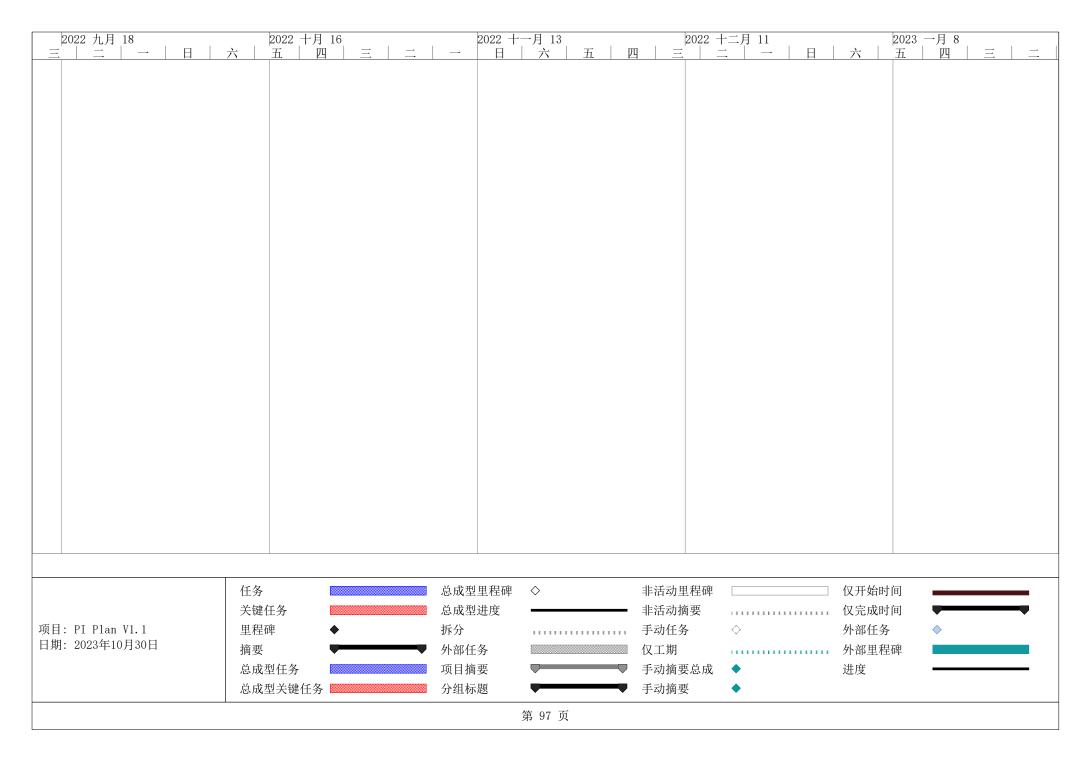


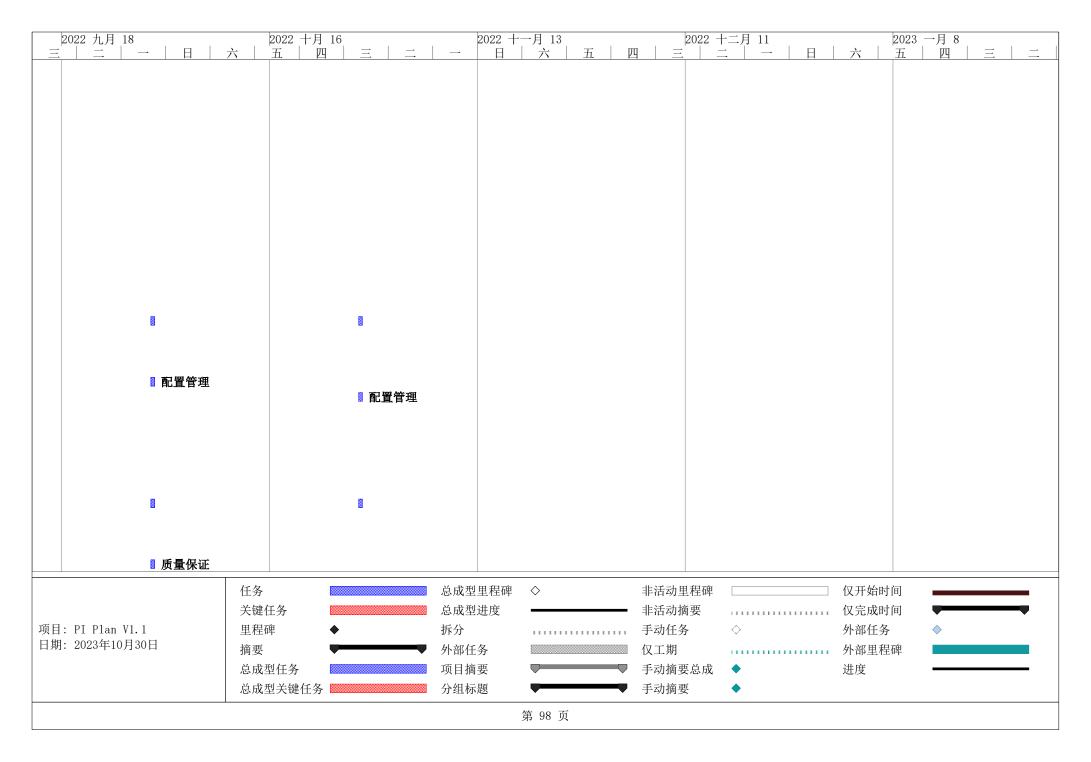


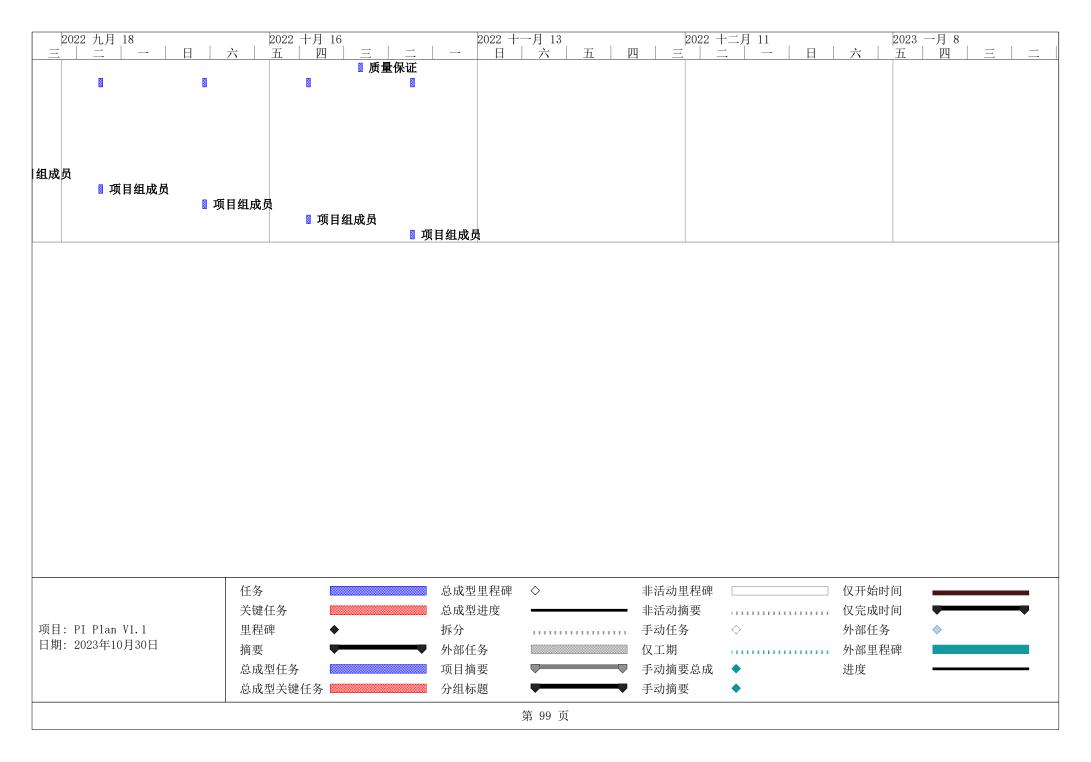


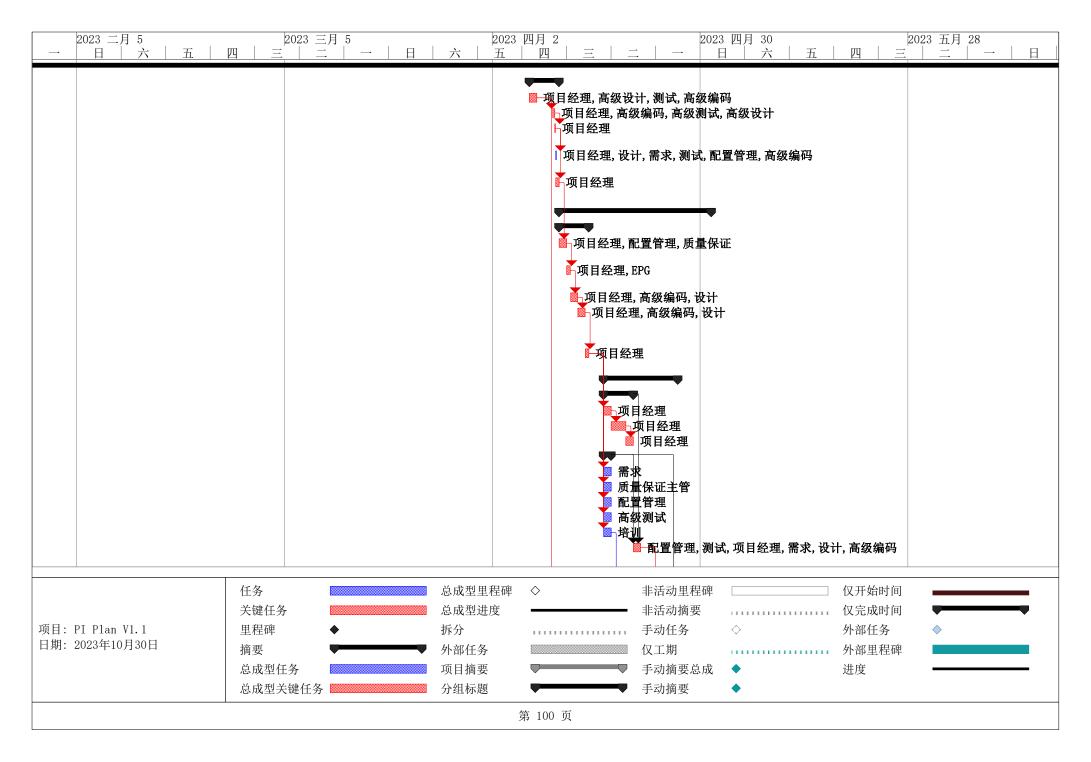


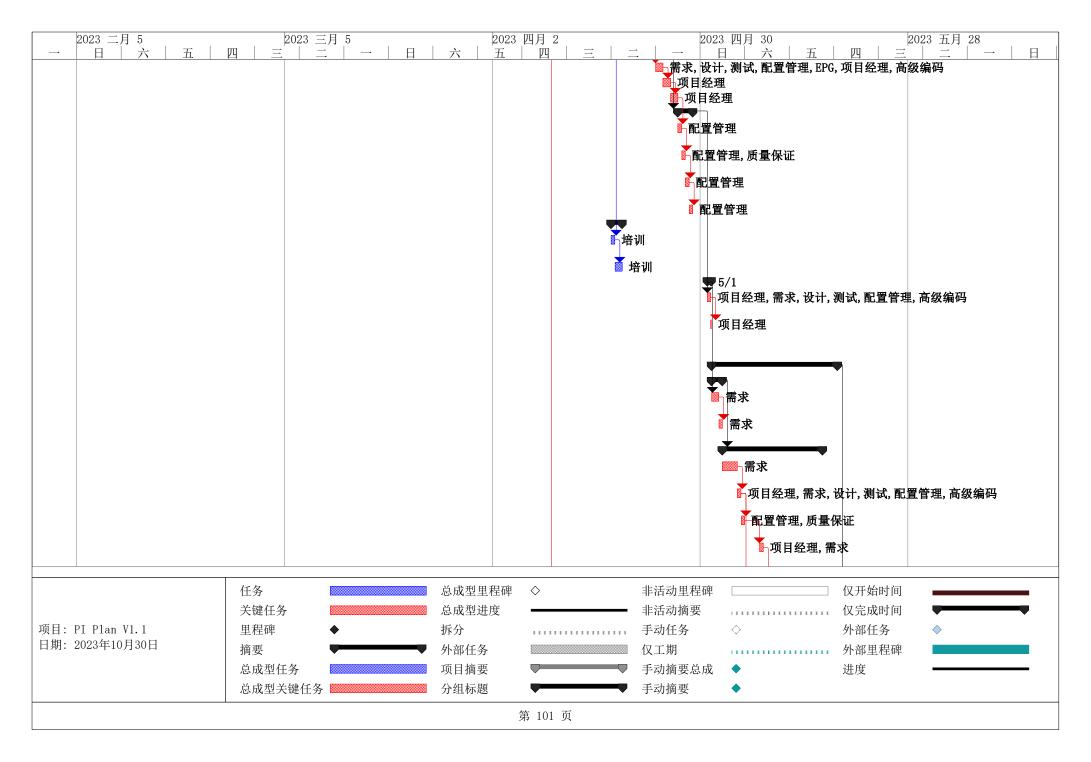


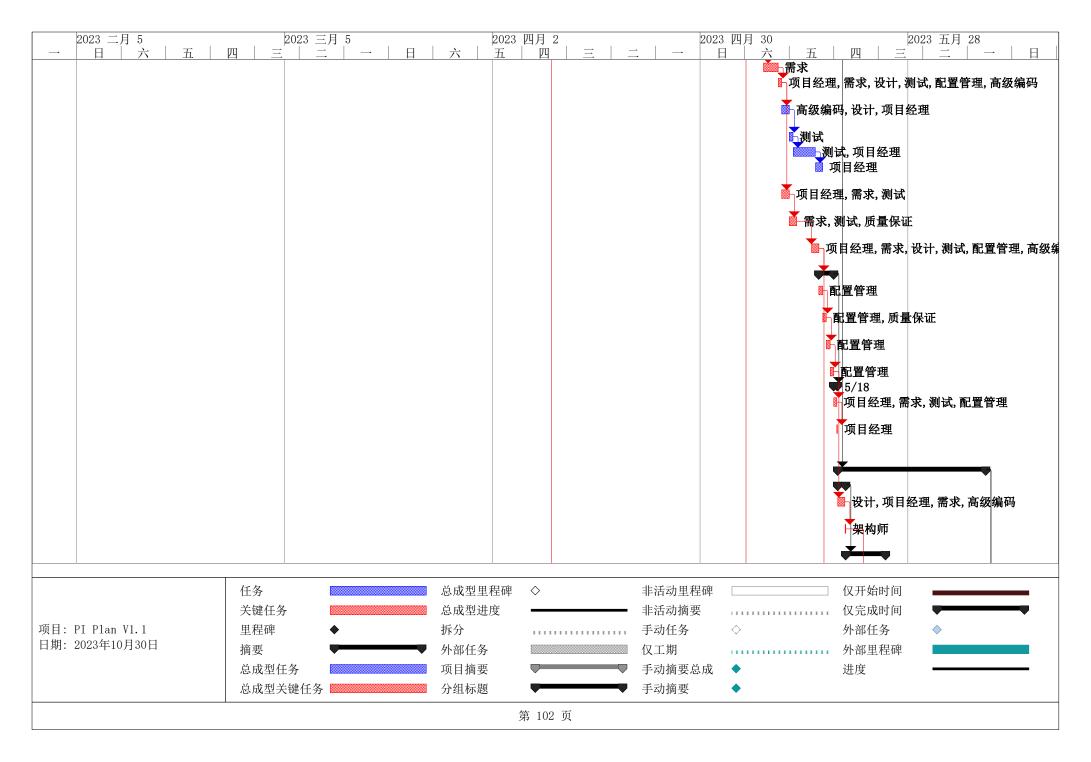


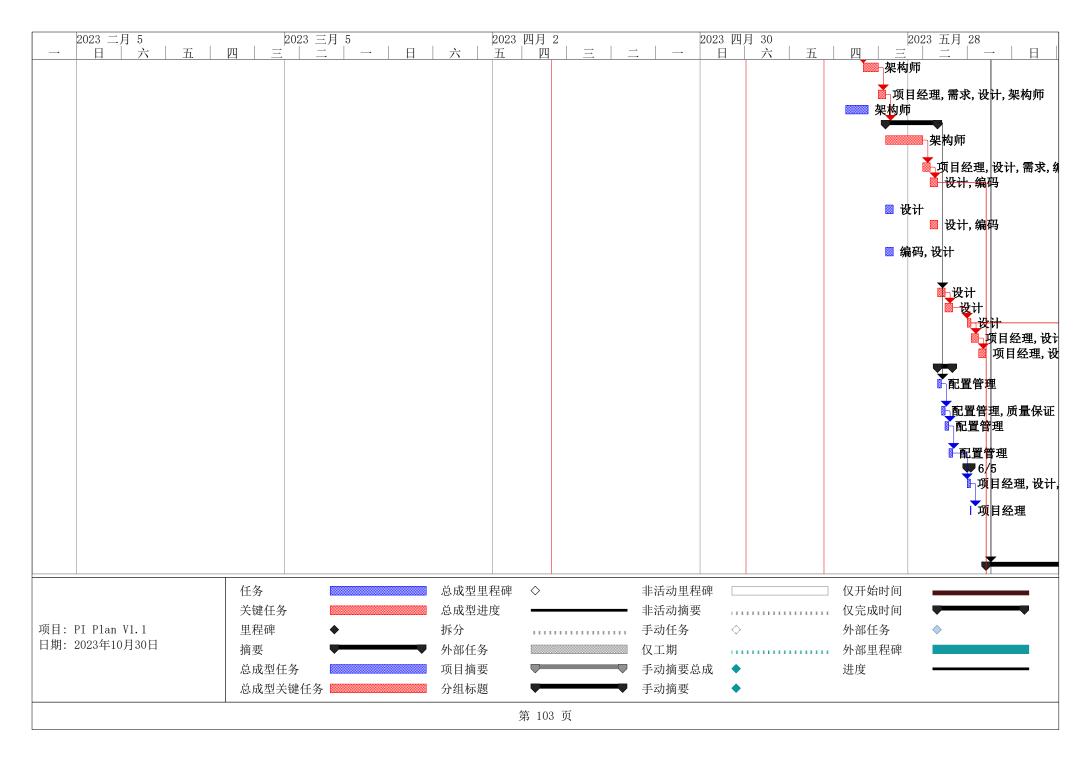


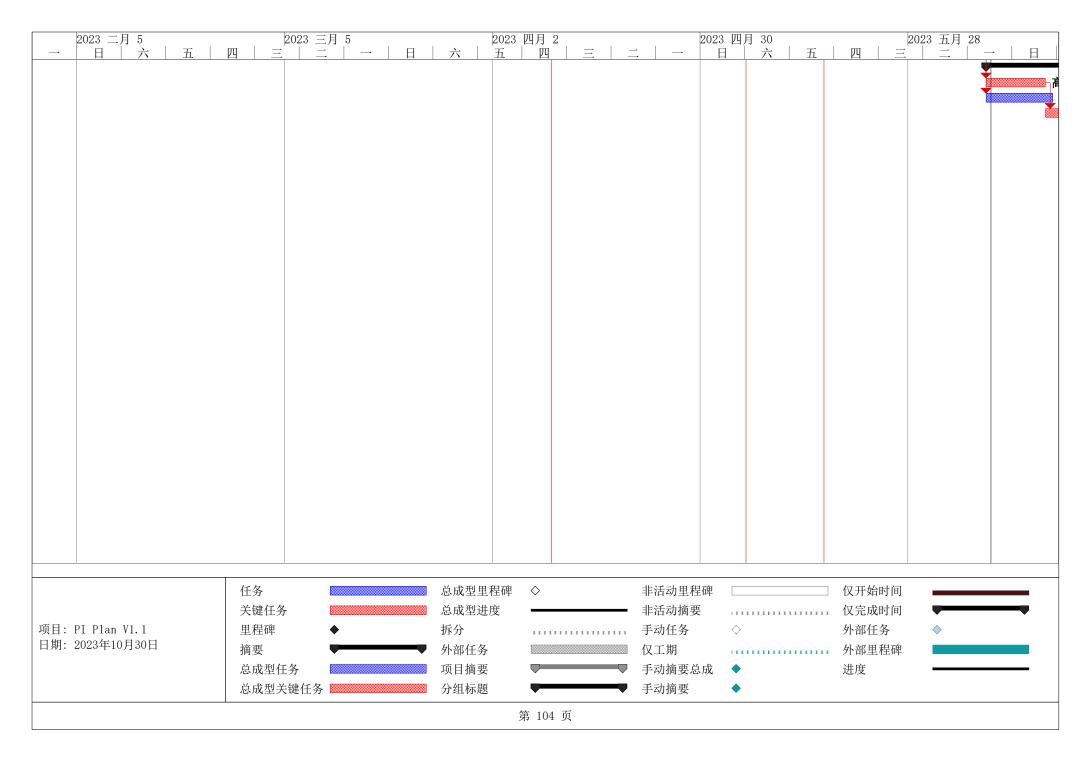


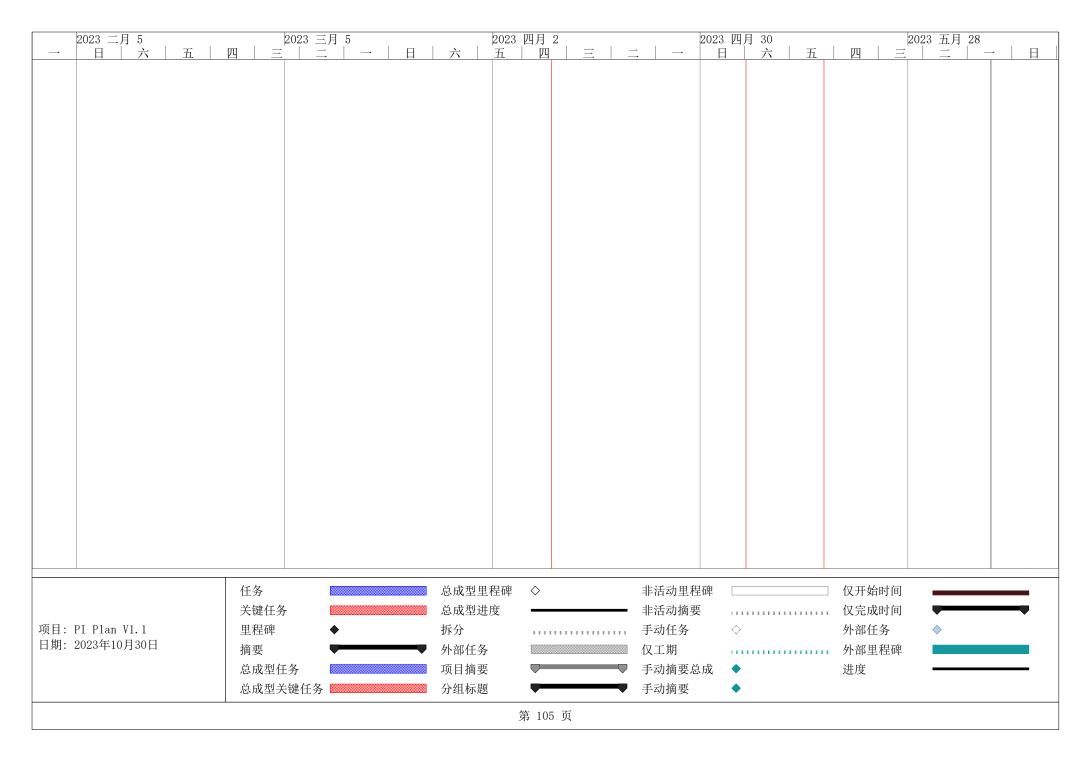


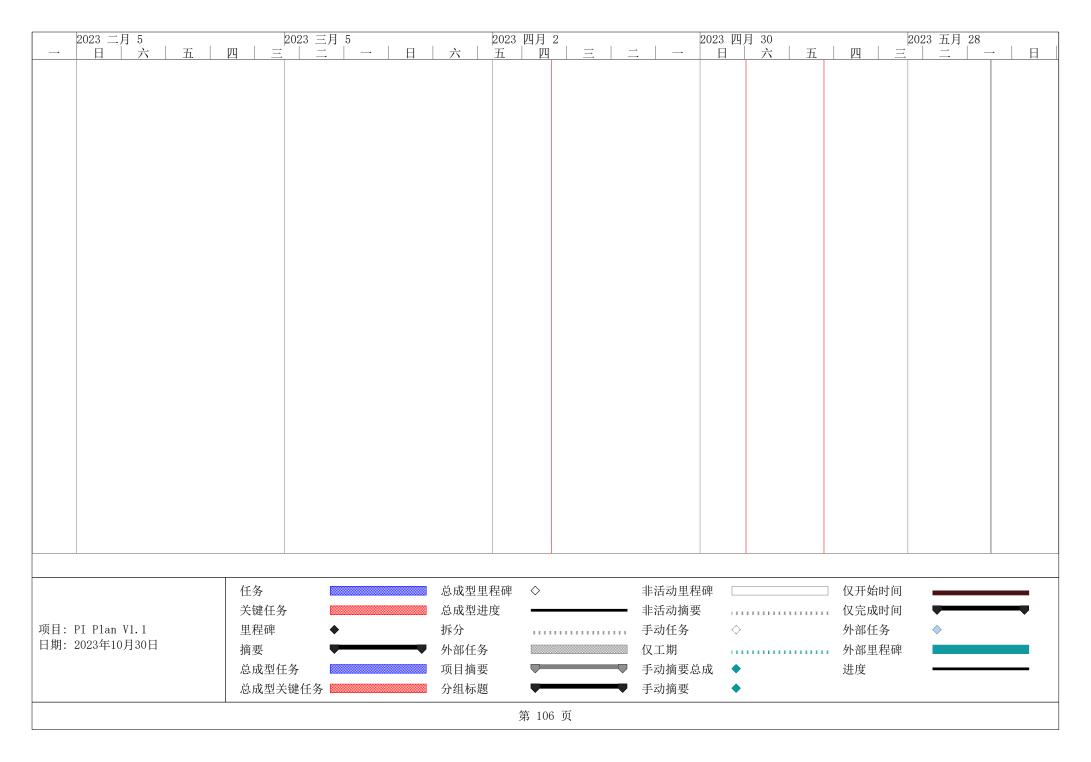

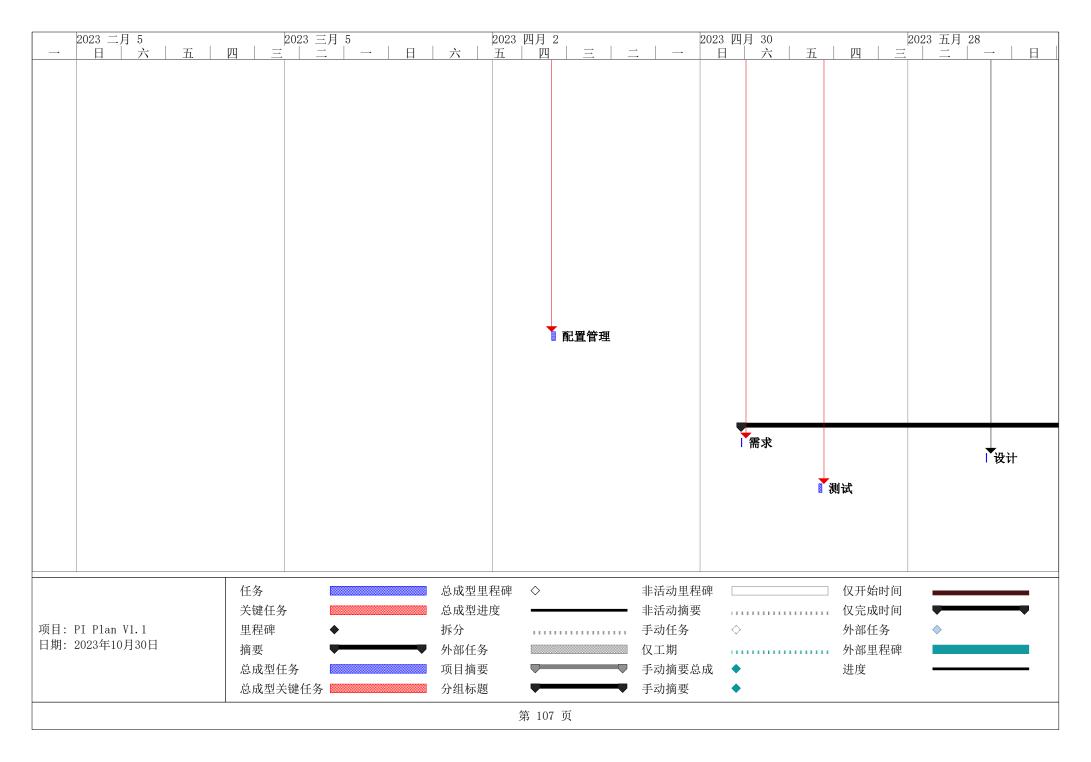


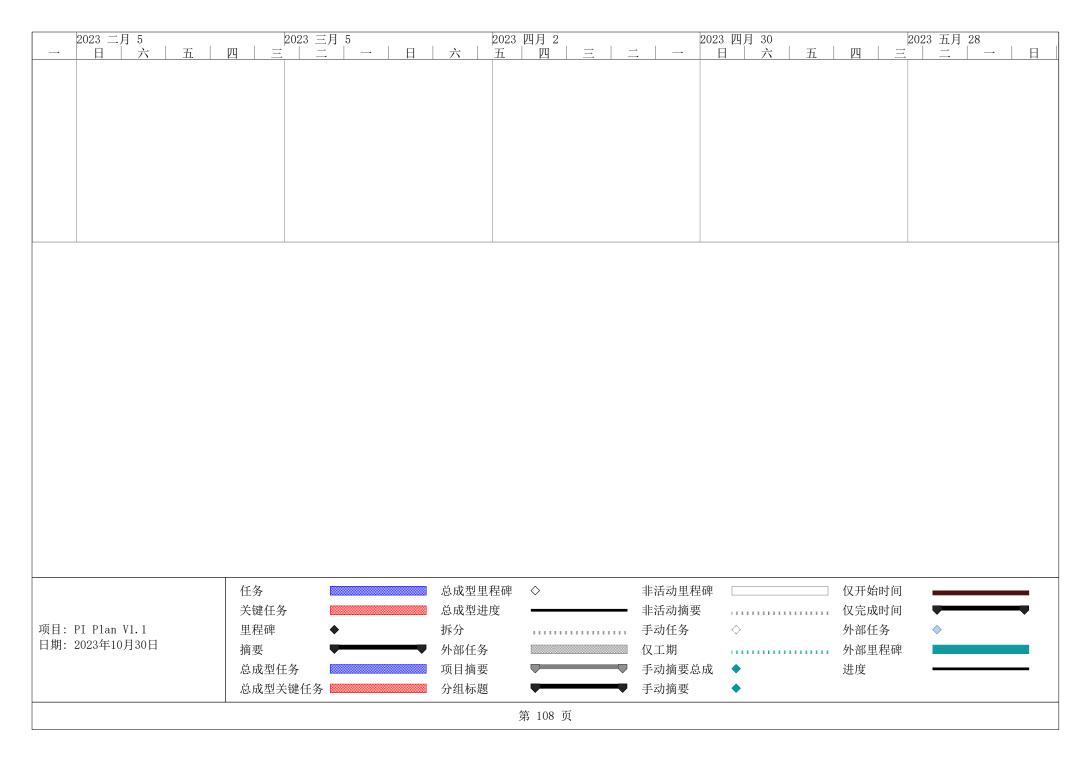


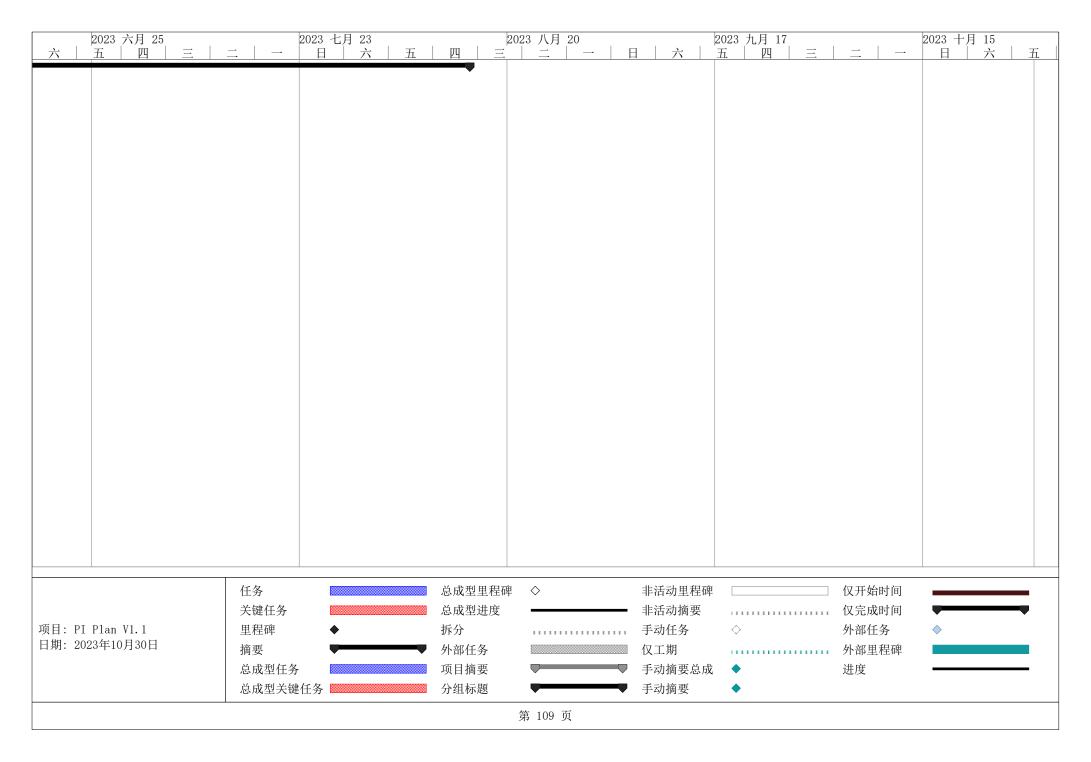


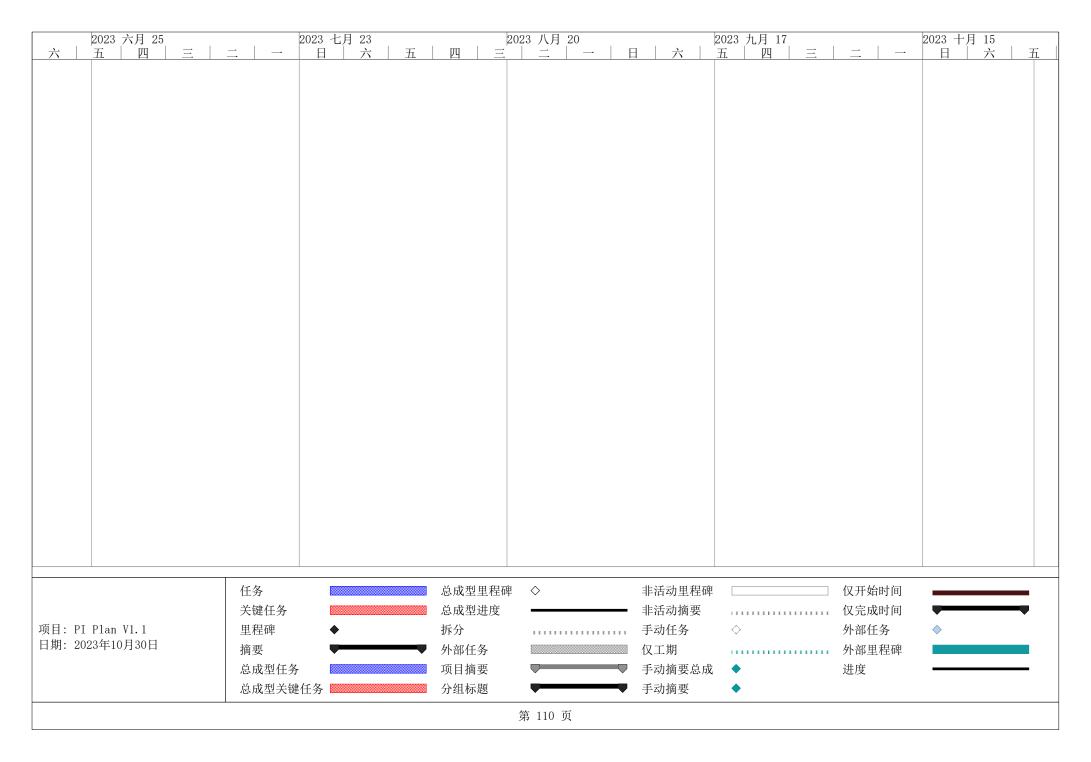



之 之 之 之 之 五	六月 25 	: -	_		七月 23	T i	рд	= 202	3 八月 20 二 一	日一六一	2023 九月 17 五 四 =	- _	2023 十月 15	5 5 #i
六 五	ハA 25 四			日	L	五				日一六	五 四 三			
页目: PI Plan 日期: 2023年10			任务 关键任务 里程碑 摘要 总成型任务		>		总成型里总成型进 拆分外部任务项目摘要分组标题	度	\rightarrow	図 仅工期	 ↓ ↓ 	外部任务	\rightarrow	

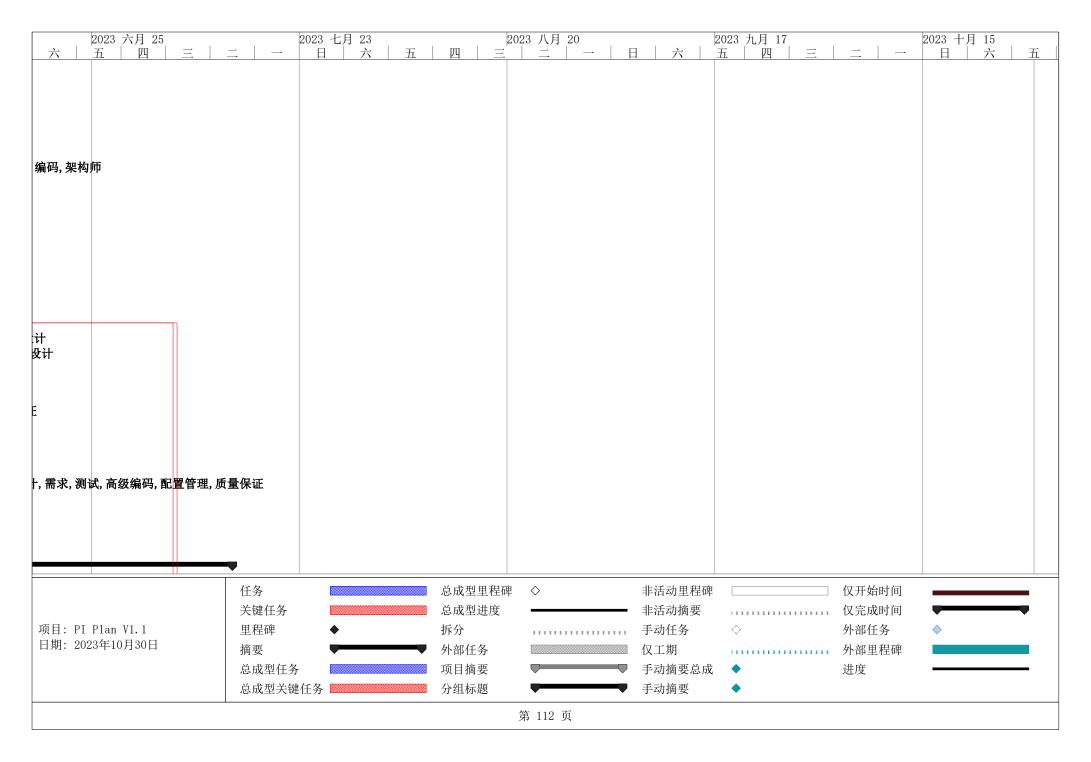

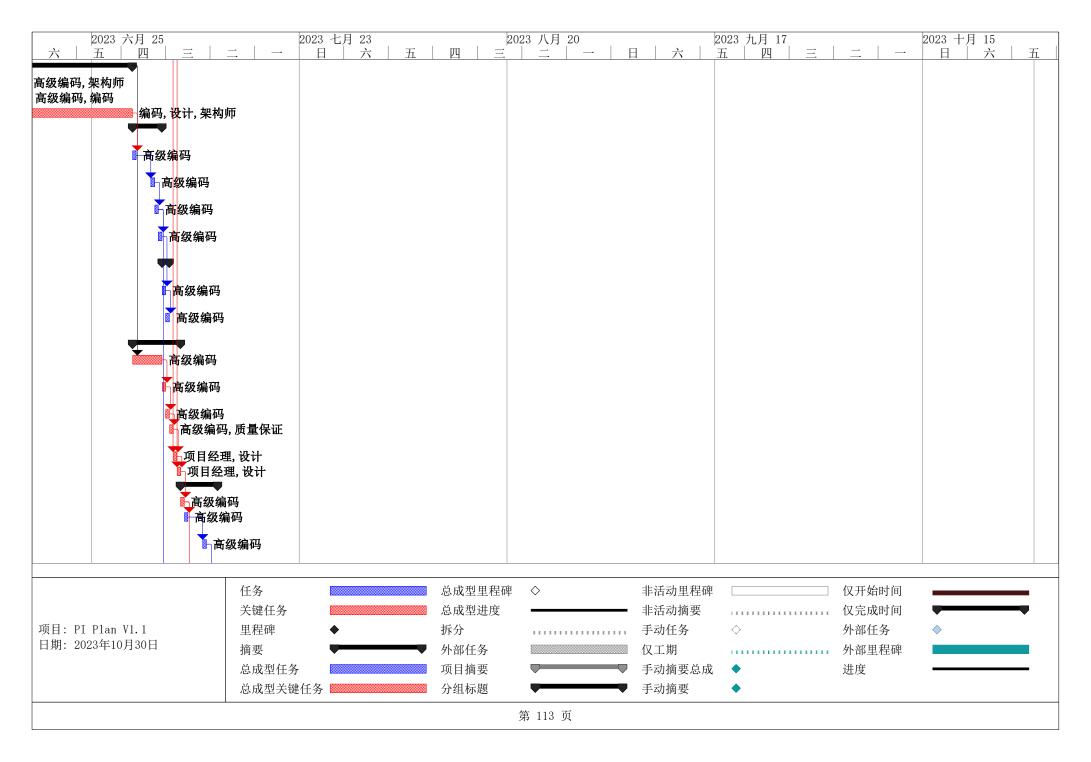

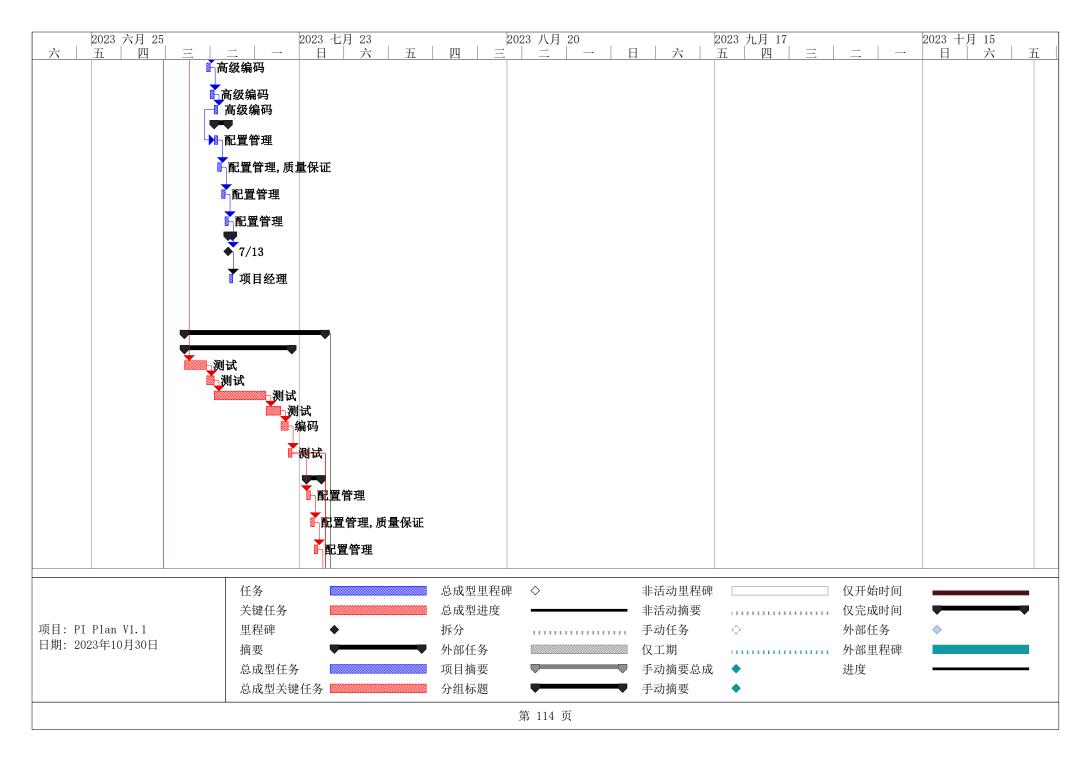

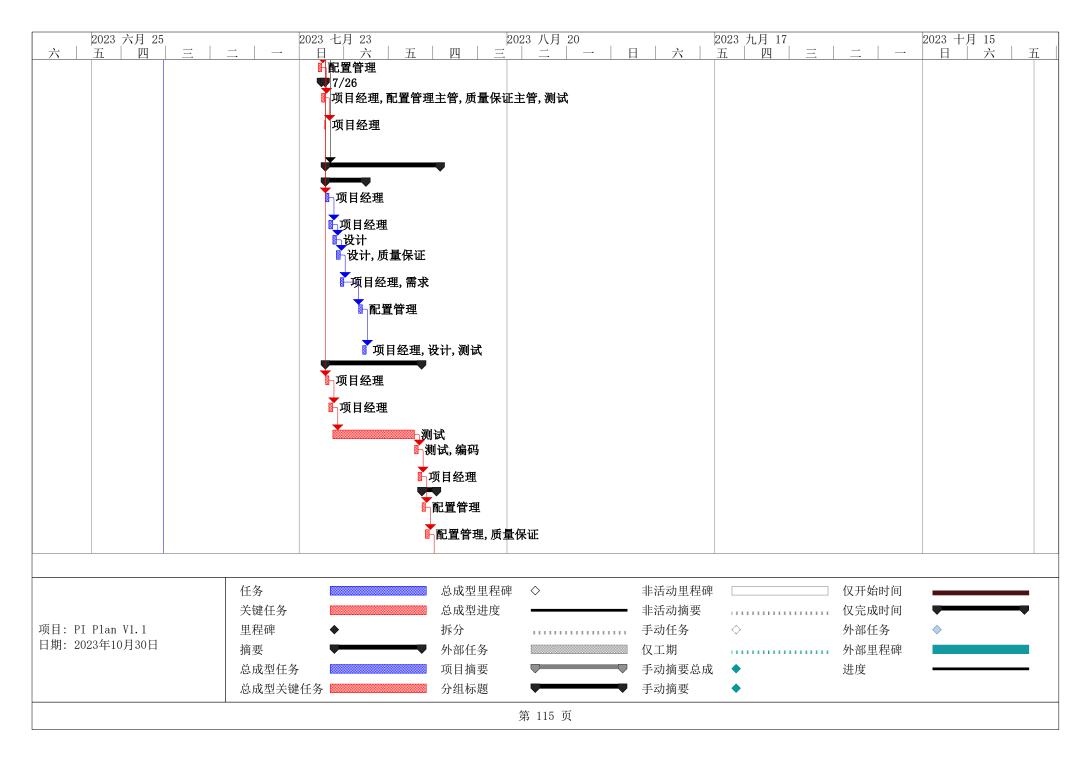

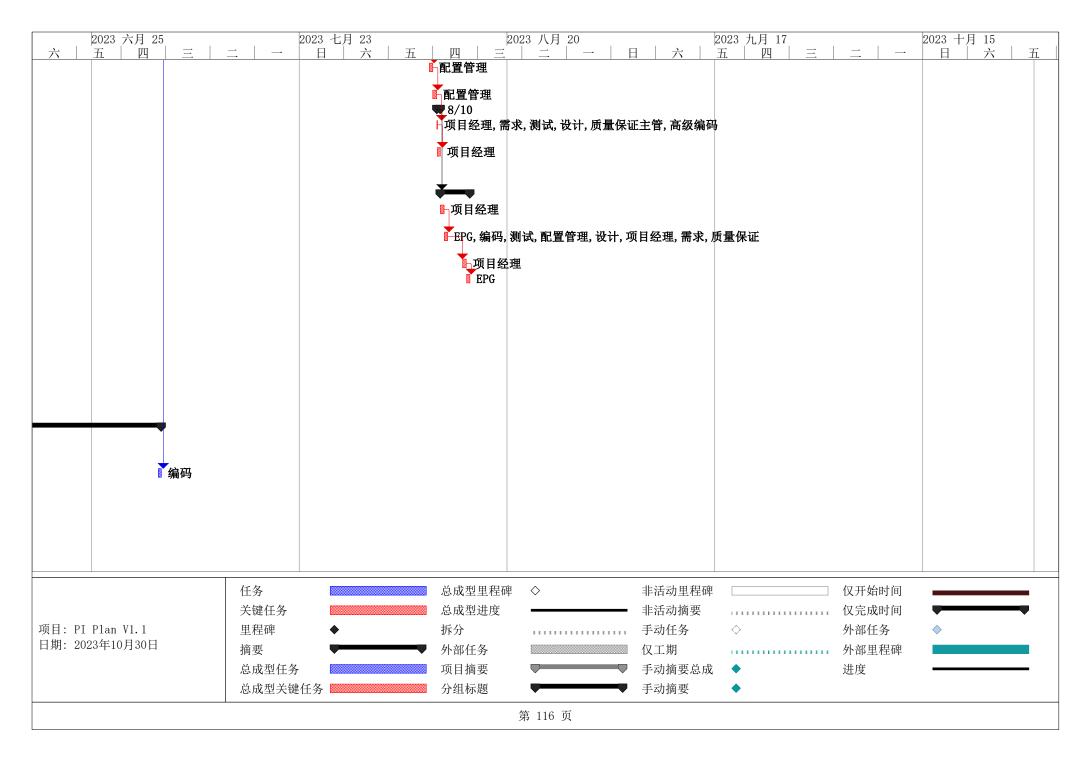

六	023 六月 25 ī 四	三	_ _	日	Ĺ月 23 │ 六	五.	四 3	$\equiv $	八月 20 二 一	日		023 九月 17 ī 四	二		023 十月 日	15 六 <u></u>	Ŧi
			任务				总成型里科				动里程碑		仅开始时门				
			关键任务				总成型进度	ŧ –		— 非活	动摘要		仅完成时间	间			
目: PI Pi 期: 20232	lan V1.1 年10月30日		关键任务 里程碑		•		总成型进度 拆分	Ē -			动摘要 任务	\Diamond	仅完成时 外部任务	间	◆		-
目: PI P: 期: 20234	lan V1.1 年10月30日		关键任务 里程碑 摘要		•		总成型进度 拆分 外部任务	Ē -		非活手动仅工	动摘要 任务 期	\(\)	仅完成时间 外部任务 外部里程程	间	•		-
目: PI PI 朝: 2023	lan V1.1 年10月30日		关键任务 里程碑		•		总成型进度 拆分	Ē -		非活手动仅工▼ 手动	动摘要 任务	\Diamond	仅完成时 外部任务	间	*		
